ROYAL CDV G2

DENUMIRE PROIECT
SERVICII DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU DN 24C KM 43+850 – 106+650 Obiect: Pod pe DN 24C km 58+393
BENEFICIAR
C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IASI



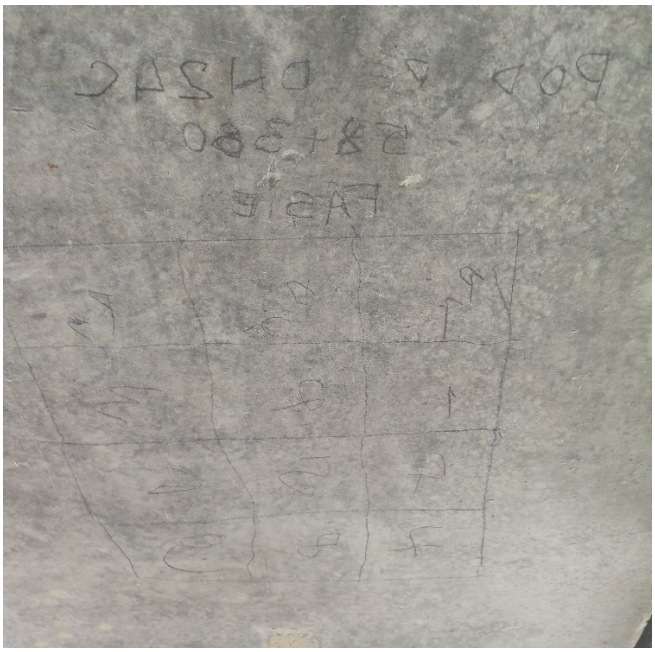
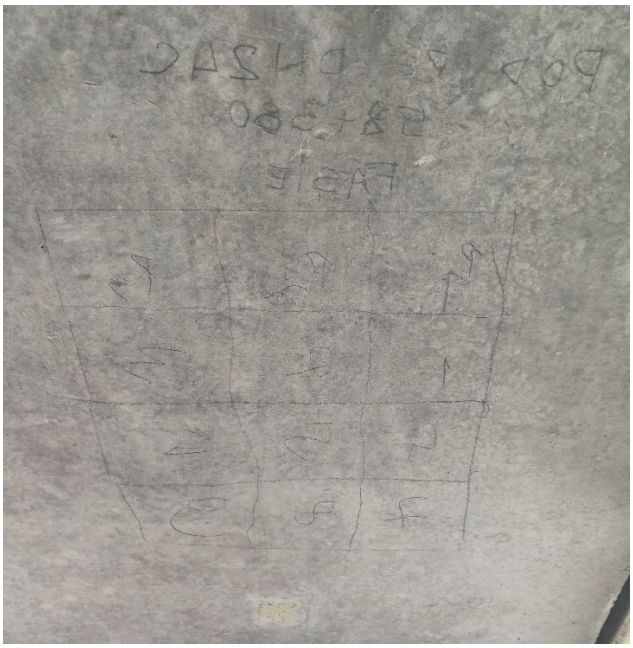
FAZA DE PROIECTARE
Incercari nedistructive pe betoane – Incercarea cu sclerometrul digital pentru beton
August 2022

Denumire proiect	SERVICII DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU DN 24C KM 43+850 – 106+650
Obiect	Pod pe DN 24C la km 58+393
Beneficiar	C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IASI
Amplasament	Extravilan comuna Santa Mare, judetul Botosani
Proiectant	SC ROYAL CDV G2 SRL, Suceava
Numar proiect	17/2022
Faza de proiectare	Incercari nedistructive pe betoane – incercarea cu sclerometrul digital pentru beton
An	2022

Incercari nedistructive pe betoane – Incercarea cu sclerometru digital pentru beton

Nr. incercare	IRb	Unghi	IRbm	Suprafata incercata	RcK	RcKm
1	57	90	57	Fasie	74	74
2	59	90	58	Fasie	81	77
3	55	90	57	Fasie	66	74
4	63	90	59	Fasie	99	81
5	62	90	59	Fasie	94	81
6	67	90	61	Fasie	119	90
7	64	90	61	Fasie	104	90
8	61	90	61	Fasie	90	90
9	63	90	61	Fasie	99	90
10	64	90	62	Fasie	104	94
11	58	90	61	Fasie	77	90
12	63	90	61	Fasie	99	90

3. ANEXA – FOTOGRAFII

	
Foto 1: Fasie	Foto 2: Fasie
