ROYAL CDV G2

DENUMIRE PROIECT
SERVICII DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU DN 24C KM 43+850 – 106+650 Obiect: Pod pe DN 24C km 61+448
BENEFICIAR
C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IASI



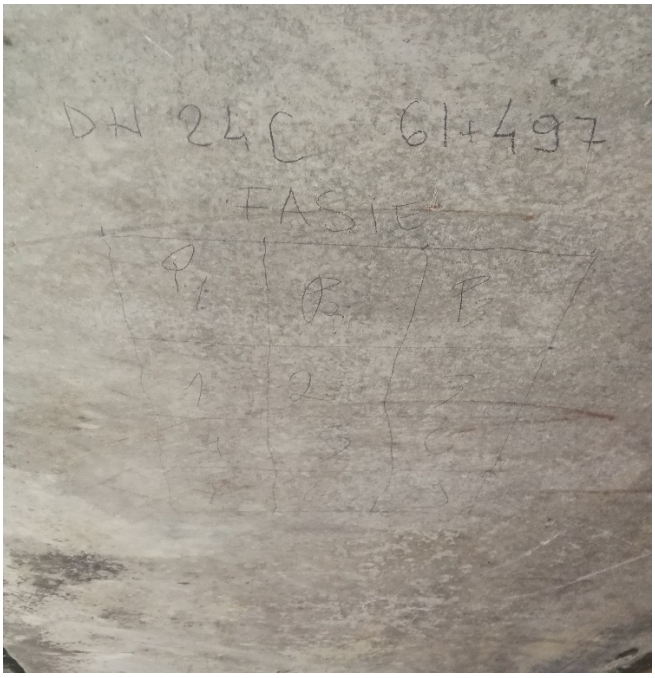
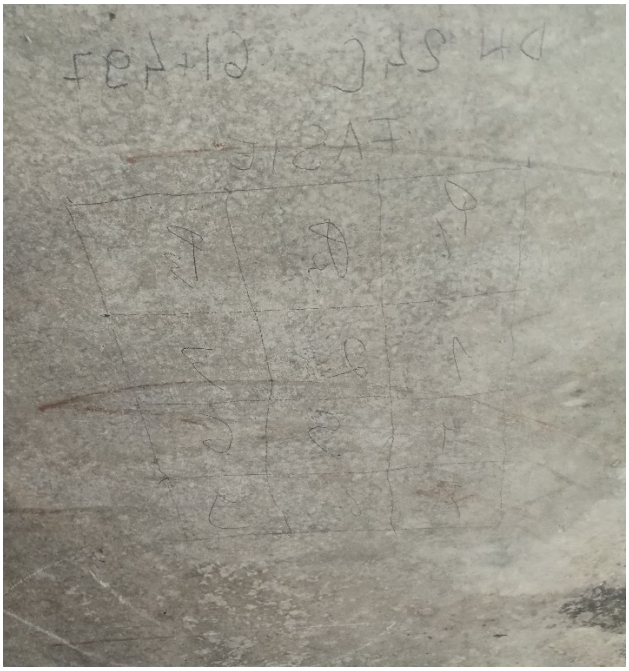
FAZA DE PROIECTARE
Incercari nedistructive pe betoane – Incercarea cu sclerometrul digital pentru beton
August 2022

Denumire proiect	SERVICII DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU DN 24C KM 43+850 – 106+650
Obiect	Pod pe DN 24C la km 61+448
Beneficiar	C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IASI
Amplasament	Intravilan sat Durnesti, judetul Botosani
Proiectant	SC ROYAL CDV G2 SRL, Suceava
Numar proiect	17/2022
Faza de proiectare	Incercari nedistructive pe betoane – incercarea cu sclerometrul digital pentru beton
An	2022

Incercari nedistructive pe betoane – Incercarea cu sclerometru digital pentru beton

Nr. incercare	IRb	Unghi	IRbm	Suprafata incercata	RcK	RcKm
1	68	90	68	Fasie	124	124
2	64	90	66	Fasie	104	114
3	64	90	65	Fasie	104	109
4	58	90	64	Fasie	77	104
5	64	90	64	Fasie	104	104
6	63	90	64	Fasie	99	104
7	58	90	63	Fasie	77	99
8	67	90	63	Fasie	119	99
9	61	90	63	Fasie	90	99
10	65	90	63	Fasie	109	99
11	67	90	64	Fasie	119	104
12	64	90	64	Fasie	104	104

3. ANEXA – FOTOGRAFII

	
Foto 1: Fasie	Foto 2: Fasie
