ROYAL CDV G2

DENUMIRE PROIECT
SERVICII DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU DN 24C KM 43+850 – 106+650 Obiect: Pod pe DN 24C km 98+744
BENEFICIAR
C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IASI



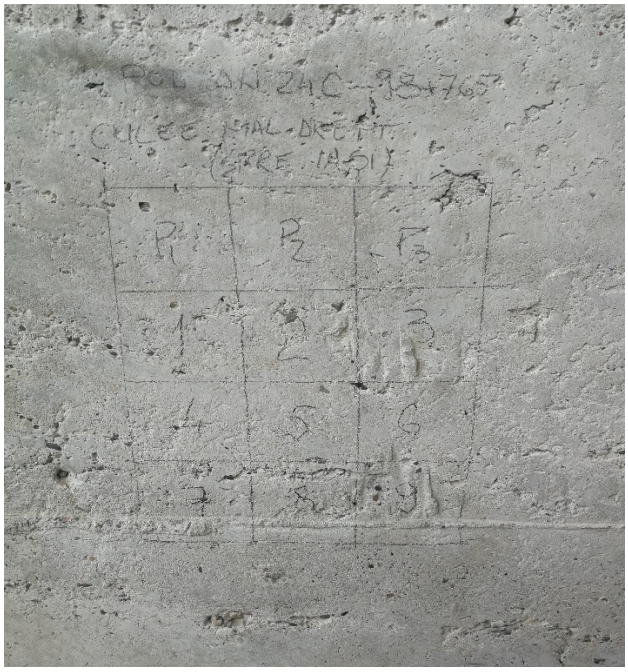
FAZA DE PROIECTARE
Incercari nedistructive pe betoane – Incercarea cu sclerometrul digital pentru beton
August 2022

Denumire proiect	SERVICII DE EXPERTIZA TEHNICA PENTRU DN 24C KM 43+850 – 106+650
Obiect	Pod pe DN 24C la km 98+744
Beneficiar	C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IASI
Amplasament	Extravilan comuna Manoleasa, judetul Botosani
Proiectant	SC ROYAL CDV G2 SRL, Suceava
Numar proiect	17/2022
Faza de proiectare	Incercari nedistructive pe betoane – incercarea cu sclerometrul digital pentru beton
An	2022

Incercari nedistructive pe betoane – Incercarea cu sclerometru digital pentru beton

Nr. incercare	IRb	Unghi	IRbm	Suprafata incercata	RcK	RcKm
1	48	0	48	Culee mal drept	59	59
2	47	0	48	Culee mal drept	56	59
3	45	0	47	Culee mal drept	50	56
4	54	0	49	Culee mal drept	80	62
5	53	0	49	Culee mal drept	76	62
6	55	0	50	Culee mal drept	84	66
7	55	0	51	Culee mal drept	84	69
8	45	0	50	Culee mal drept	50	66
9	49	0	50	Culee mal drept	62	66
10	50	0	50	Culee mal drept	66	66
11	50	0	50	Culee mal drept	66	66
12	47	0	50	Culee mal drept	56	66
1	43	0	43	Culee mal stang	45	45
2	45	0	44	Culee mal stang	50	47
3	45	0	44	Culee mal stang	50	47
4	52	0	46	Culee mal stang	73	53
5	47	0	46	Culee mal stang	56	53
6	53	0	48	Culee mal stang	76	59
7	55	0	49	Culee mal stang	84	62
8	49	0	49	Culee mal stang	62	62
9	47	0	48	Culee mal stang	56	59
10	36	0	47	Culee mal stang	28	56
11	33	0	46	Culee mal stang	23	53
12	35	0	45	Culee mal stang	26	50

3. ANEXA – FOTOGRAFII

	
Foto 1: Culee mal drept	Foto 2: Culee mal stang
