COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucureşti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro, registratura.cnair@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562
www.erovinieta.ro

CLARIFICAREA NR. 2 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

"Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud intre Al (km 55+520) si DN 5 (km 40+000)": LOT 1 Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud intre Al (km 55+520) si km 54+700 inclusiv parcarea de lunga durata de la km 54+765*; LOT II Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud intre km 54+700 si DN 5 (km 40+000)"*

Cod Unic de Identificare Contract: 16054368/2020/1983/S/10

LOT 1 Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud intre Al (km 55+520) si km 54+700 inclusiv parcarea de lunga durata de la km 54+765	
Intrebare 1	***Solicităm să eliminați prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referință 17.6) relativ la aplicarea Antreprenorului a unor penalizări de 20.000 lei pe zi de întârziere în transmiterea programului de execuție sau a programului de execuție actualizat/revizuit/completat, în sensul diminuării acestor penalizări sau înlocuirii lor cu obligația antreprenorului la plata de daune interese în limita prejudiciului efectiv suferit de către Beneficiar din culpa antreprenorului și dovedit.*** ***Penalitățile menționate la punctul 5 din acordul contractual (referință 17.6) sunt excesive și nerezonabile în raport de practica în domeniu, respectiv în raport de art. 12 din Legea nr. 72/2013 și ale Capitolul IV, punctul 5 din Ordinul 543/2013 mai sus enunțate.*** ***Facem trimitere în acest sens la prevederile art. 1533 din Codul Civil, potrivit cărora: Debitorul răspunde numai pentru prejudiciile pe care le-a prevăzut sau pe care putea să le prevadă ca urmare a neexecutării la momentul încheierii contractului, afară de cazul în care neexecutarea este intenţionată ori se datorează culpei grave a acestuia. Chiar şi în acest din urmă caz, daunele-interese nu cuprind decât ceea ce este consecinţa directă şi necesară a neexecutării obligaţiei.*** ***Facem trimitere totodată, și la:*** ***- art. 12 din Legea nr. 72/2013 – practica sau clauza contractuală prin care se stabileşte în mod vădit inechitabil, în raport cu creditorul, termenul de plată, nivelul dobânzii pentru plata întârziată sau al daunelor-interese suplimentare este considerată abuzivă.*** ***- Capitolul IV, punctul 5 din Ordinul 543/2013 de adoptare a ghidului privind***

	principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene (...) potrivit căruia: ***Se personalizează clauzele contractuale incluse în documentaţia de atribuire publicată în funcţie de complexitatea obiectului contractului de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit. Dacă sunt clauze nerezonabile, care nu sunt în acord cu practicile de piaţă, există riscul de a exclude operatorii economici serioşi. (...)*** ***Pentru evitarea acestor consecinţe, este recomandabil ca documentaţia de atribuire şi clauzele de execuţie să fie conforme cu standardele de piaţă în domeniu.***
Raspuns 1	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca potrivit doctrinei in materie, libertatea contractuala a persoanelor publice prezinta particularitati in raport cu libertatea contractuala a persoanelor private. In acest sens, precizam ca principala caracteristica a contractelor administrative (contractul de achizitie publica fiind asimilat, potrivit legii, actului administrativ) este tocmai inegalitatea de pozitie in care se gasesc partile contractante: administratia, in calitate de purtatoare a prerogativelor de putere publica si, in consecinta superioara particularului, poate stabili unele clauze contractuale si impune sanctiuni. Acest aspect rezulta din faptul ca aceste contracte incheiate de administratia publica au anumite caracteristici speciale impuse de interesul public care sta la fundamentul incheierii si executarii acestora, fiind considerate contracte publice. Prevederea penalitatii in discutie este motivata de garantiile necesare Autoritatii Contractante pentru realizarea cu celeritate a obiectivului de interes national, iar acestea sunt aplicate numai in situatia in care Contractantul nu isi indeplineste obligatiile in termenele si conditiile contractuale, cuantumul acestora nu ar trebui sa reprezinte o ingrijorare pentru orice operator economic care urmareste indeplinirea contractului conform principiului bunei-credinte. Cu toate acestea, Autoritatea Contractanta modificata valoarea penalitatilor prevazuta la Art. 5.1. - Sub-clauza 17.6. astfel: *„**4.000 Lei pentru fiecare zi de întârziere** a transmiterii Programului de Execuție sau a Programului de Executie actualizat/ revizuit/ completat/ corectat, până la acceptarea Programului de Execuție de către Supervizor (devenind astfel Programul de Referință sau noul Program de Referință).”*
Intrebare 2	***Solicităm să modificați prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referință 36.3) în sensul de a preciza că valoarea reținută din fiecare certificat de plată (dacă Antreprenorul nu reușește să atingă la termenul stabilit un punct de referință (1-5) specificat în Cerințele Beneficiarului sau un punct de referință (6-8) dintre cei stabiliți ulterior de către Beneficiar împreună cu Supervizorul) este de 10% din totalul sumelor reținute aferente punctelor (a) și (b) din Sub clauza 50.1 în loc de 20% cum se menționează în prezent.*** ***Prevederile în discuție contravin mențiunilor din condițiile generale aprobate prin HG 1/2018, prevederi contractuale care sunt obligatorii și se pot modifica în cazuri anume prevăzute. Or, prevederile sub clauzelor mai sus enumerate nu fac parte din clauzele ce pot fi modificate prin condiții speciale.*** ***Mai mult procentul de 20% din totalul sumelor reținute aferente punctelor (a) și (b) din Sub clauza 50.1 este excesiv și nejustificat, ce creează un dezechilibru pentru executant din punct de vedere al cash – flow -lui.***
Raspuns 2	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca desi in modelul de Acord Contractual din H.G. nr. 1/2018 este inscris un procent de *10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din subclauza 50.1. [Situatia de Lucrari]*, legiuitorul a prevazut in cadrul Sub-clauzei 36.3. din Conditiile Generale de Contract, urmatoarele: *“[…] Daca Antreprenorul nu reuseste, in mod nejustificat, sa atinga vreun punct de referinta la termenul stabilit (luand in considerare reviziile efectuate), Supervizorul va fi indreptatit sa retina din fiecare Certificat de Plata ulterior o valoare procentuala de 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din subclauza 50.1. [Situatia de Lucrari],* ***cu exceptia cazului in care este prevazuta o alta valoare (absoluta sau***

	***procentuala) in Acordul Contractual**. […]”.* Autoritatea Contractanta a optat astfel, in baza acestei prevederi legale, pentru un procent de **20%** din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din sub-clauza 50.1. [Situatia de Lucrari], pentru a descuraja Antreprenorul sa adopte un comportament contractual superficial care sa conduca la intarzieri in Programul de Executie sau la neindeplinirea Punctelor de Referinta si Obiectului contractului. De asemenea, consideram necesar ca operatorii economici interesati sa depuna oferta in cadrul acestei proceduri de achizitie publica sa aiba in vedere faptul ca acesti bani rezultati din aplicarea acestei penalitati nu constituie bani pierduti pentru Antreprenor, ci se returneaza acestuia dupa indeplinirea Punctelor de Referinta. Cu toate acestea, Autoritatea Contractanta modifica prevederile art. 5.1 Sub-clauza 36.3 din Acordul contractual, dupa cum urmeaza: *„**10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b)** din Sub-clauza 50.1 [Situația de Lucrări].”*
Intrebare 3	***Pentru motivele detaliate în cuprinsul clarificării nr. 1 de mai sus solicităm diminuarea penalităților de 50.000 lei/zi menționate la punctul 5 din acordul contractual (referință 36.4) la maxim 10.000 lei/zi. Valoarea penalităților stabilite este excesivă și disproporționată.***
Raspuns 3	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca penalitatile mentionate la Art. 5.1. - Sub-clauza 17.6. in Acordul Contractual, sunt in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 17.6. din *Conditiile Generale pentru contractele de executie de proiectare si executie lucrari* si respecta prevederile Clauzei 36.4 din *Conditiile Generale.* Autoritatea Contractanta se afla in imposibilitatea de a percepe penalitati mai mici decat cele prevazute in Acordul Contractual intrucat, raportat la valoarea contractului, sub aceasta valoare de 50.000 de lei, aceasta penalizare ar deveni derizorie, nemaiavand finalitatea avuta in vedere de catre legiuitor. Totodata, invederam faptul ca, potrivit doctrinei in materie, libertatea contractuala a persoanelor publice prezinta particularitati in raport cu libertatea contractuala a persoanelor private. In acest sens, precizam ca principala caracteristica a contractelor administrative (contractul de achizitie publica fiind asimilat, potrivit legii, actului administrativ) este tocmai inegalitatea de pozitie in care se gasesc partile contractante: administratia, in calitate de purtatoare a prerogativelor de putere publica si, in consecinta superioara particularului, poate stabili unele clauze contractuale si impune sanctiuni. Acest aspect rezulta din faptul ca aceste contracte incheiate de administratia publica au anumite caracteristici speciale impuse de interesul public care sta la fundamentul incheierii si executarii acestora, fiind considerate contracte publice. Astfel, autoritatea contractanta nu considera ca modificarea propusa de operatorul economic este in interesul public. Mai mult, prevederea penalitatii in discutie este motivata de garantiile necesare Autoritatii Contractante pentru realizarea cu celeritate a obiectivului de interes national, acestea fiind aplicate numai in situatia in care Contractantul nu isi indeplineste obligatiile in termenele si conditiile contractuale. Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.1. - Sub-clauza 36.4.
Intrebare 4	***Pentru motivele dezvoltate în cuprinsul clarificării nr. 2 de mai sus solicităm modificarea prevederilor de la punctul 5 din acordul contractual (referință 47.1) în sensul de a preciza că valoarea procentuală a Sumelor reținute din fiecare Cerificat de plată până la atingerea limitei Sumelor Reținute este de 10%, în loc de 15% (cum se menționează în prezent), iar limita sumelor reținute este de 5% din Prețul Contractului, în loc de 10% (cum se menționează în prezent).*** ***Prevederile în discuție contravin mențiunilor din condițiile generale aprobate prin HG 1/2018, prevederi contractuale care sunt obligatorii și se pot modifica în cazuri anume prevăzute. Or, prevederile sub clauzelor mai sus enumerate nu fac parte din clauzele***

	ce pot fi modificate prin condiții speciale. ***Mai mult procentele de 15% a Sumelor reținute din fiecare Cerificat de plată până la atingerea limitei Sumelor Reținute, respectiv procentul de 10% din prețul contractului stabilit ca limită a sumelor reținute sunt excesive și nejustificate, ce creează un dezechilibru pentru executant din punct de vedere al cash – flow -lui.***
Raspuns 4	Autoritatea Contractanta modifica prevederile art. 5.1 Sub-clauza 47.1 din Acordul contractual dupa cum urmeaza: *„**10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) și (b)** din Sub-clauza 50.1 [Situația de Lucrări]”.*
Intrebare 5	***Solicităm să eliminați prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referință clauza 49.3) relativ la impunerea unui procent pentru indirecte și profit de 5 % din sumele reale plătite.*** ***Potrivit art. 3.3.3. din ORDINUL Nr. 1568/15.10.2002 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări și obiecte de construcții pentru investiții realizate din fonduri publice”, indicativ P 91/1 – 02, cota de cheltuieli indirecte se stabilește de către fiecare unitate de execuție pe baza propriilor analize. Așadar, stabilirea nivelului cheltuielilor indirecte se determină pe baza propriilor analize ale operatorului economic, fiind deci atributul exclusiv al ofertantului, fără ca o terță parte să poată impune ofertarea unui anumit cuantum.*** ***În aceeași idee și stabilirea cotei de profit este proprie operatorului economic.*** ***Aceasta întrucât, prețul ofertat înglobează costuri care sunt determinate de către ofertant în funcție de resursele care vor fi alocate pentru execuția lucrărilor (materiale, resursele umane, echipamente etc.) și altor elemente specifice locației în care se execută lucrarea, iar autoritatea contractantă nu este în măsură să cunoască toate costurile pe care își fundamentează operatorul economic oferta financiară, sens în care nu este în măsură să impună vreo cotă pentru indirecte și profit.*** ***Pe cale de consecință, solicităm eliminarea oricărui prag procentual impus ofertanților pentru cheltuielile indirecte și profit și permiterea operatorilor economici să-și stabilească propriile procente.*** ***În acordul contractual urmează a fi indicată cotă de indirecte și profit ofertată de către operatorul economic declarat câștigător.***
Raspuns 5	Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca **mentine prevederile Clauzei 49.3, prevazuta la Art. 5 in Acordul Contractual**, intrucat aceste prevederi sunt in conformitate cu Condițiile Generale pentru proiectare si executie lucrari aprobate prin H.G. nr. 1/2018 *privind aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.*
Intrebare 6	***Pentru motivele dezvoltate în cuprinsul clarificării nr. 1 de mai sus solicităm să eliminați prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referință 50.3, punctul 1) relativ la aplicarea Antreprenorului a unor penalizări de 5.000 lei/zi pentru nemobilizarea utilajelor/echipamentelor, în sensul dimunării acestor penalizări sau înlocuirii lor cu obligația antreprenorului la plata de daune interese în limita prejudiciului efectiv suferit de către Beneficiar din culpa antreprenorului și dovedit.***
Raspuns 6	Autoritatea Contractanta se afla in imposibilitatea de a percepe penalitati mai mici decat cele prevazute in Acordul Contractual intrucat, raportat la valoarea contractului, aceasta penalizare ar deveni derizorie, nemaiavand finalitatea avuta in vedere de catre legiuitor. Totodata, invederam faptul ca, potrivit doctrinei in materie, libertatea contractuala a persoanelor publice prezinta particularitati in raport cu libertatea contractuala a persoanelor private. In acest sens, precizam ca principala caracteristica a contractelor administrative (contractul de achizitie publica fiind asimilat, potrivit legii, actului administrativ) este tocmai inegalitatea de pozitie in care se gasesc partile contractante: administratia, in calitate de purtatoare a prerogativelor de putere publica si, in consecinta superioara particularului, poate stabili unele clauze contractuale si impune sanctiuni. Acest aspect rezulta din faptul ca aceste contracte incheiate de administratia publica au

	anumite caracteristici speciale impuse de interesul public care sta la fundamentul incheierii si executarii acestora, fiind considerate contracte publice. Astfel, autoritatea contractanta nu considera ca modificarea propusa de operatorul economic este in interesul public. Mai mult, prevederea penalitatii in discutie este motivata de garantiile necesare Autoritatii Contractante pentru realizarea cu celeritate a obiectivului de interes national, acestea fiind aplicate numai in situatia in care Contractantul nu isi indeplineste obligatiile in termenele si conditiile contractuale. Mai mult decat atat, aceasta penalitate se va aplica pentru o inactiune a Antreprenorul si anume nemobilizarea utilajelor/ personalului (in cazul Sub-clauzei 50.3 punctul 2) cu care Antreprenorul a castigat licitatia de achizitie publica. Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.1. - Sub-clauza 50.3 punctul 1.
Intrebare 7	***Pentru motivele dezvoltate în cuprinsul clarificării nr. 1 de mai sus solicităm să eliminați prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referință 50.3, punctul 2) relativ la aplicarea Antreprenorului a unor penalizări de 3.000 lei/zi pentru nemobilizarea personalului, în sensul dimunării acestor penalizări sau înlocuirii lor cu obligația antreprenorului la plata de daune interese în limita prejudiciului efectiv suferit de către Beneficiar din culpa antreprenorului și dovedit.***
Raspuns 7	A se vedea **Raspunsul nr. 6** din prezenta Clarificare. Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.1. - Sub-clauza 50.3 punctul 2.
Intrebare 8	***Pentru motivele dezvoltate în cuprinsul clarificării nr. 1 de mai sus solicităm să eliminați prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referință 50.3, punctul 3) relativ la aplicarea Antreprenorului a unor penalizări de 30.000 lei/zi pentru nerespectarea prevederilor subclauzei 27.2, în sensul dimunării acestor penalizări sau înlocuirii lor cu obligația antreprenorului la plata de daune interese în limita prejudiciului efectiv suferit de către Beneficiar din culpa antreprenorului şi dovedit.***
Raspuns 8	Autoritatea Contractanta se afla in imposibilitatea de a percepe penalitati mai mici decat cele prevazute in Acordul Contractual intrucat, raportat la valoarea contractului, aceasta penalizare ar deveni derizorie, nemaiavand finalitatea avuta in vedere de catre legiuitor. Totodata, invederam faptul ca, potrivit doctrinei in materie, libertatea contractuala a persoanelor publice prezinta particularitati in raport cu libertatea contractuala a persoanelor private. In acest sens, precizam ca principala caracteristica a contractelor administrative (contractul de achizitie publica fiind asimilat, potrivit legii, actului administrativ) este tocmai inegalitatea de pozitie in care se gasesc partile contractante: administratia, in calitate de purtatoare a prerogativelor de putere publica si, in consecinta superioara particularului, poate stabili unele clauze contractuale si impune sanctiuni. Acest aspect rezulta din faptul ca aceste contracte incheiate de administratia publica au anumite caracteristici speciale impuse de interesul public care sta la fundamentul incheierii si executarii acestora, fiind considerate contracte publice. Astfel, autoritatea contractanta nu considera ca modificarea propusa de operatorul economic este in interesul public. Mai mult, prevederea penalitatii in discutie este motivata de garantiile necesare Autoritatii Contractante pentru realizarea cu celeritate a obiectivului de interes national, acestea fiind aplicate numai in situatia in care Contractantul nu isi indeplineste obligatiile in termenele si conditiile contractuale. Mai mult decat atat, aceasta penalitate se va aplica pentru o inactiune a Antreprenorul si anume nepunerea in aplicare a masurilor privind asigurarea curateniei pe Santier, conform Notificarii Supervizorului, **<u>aceasta inactiunie reprezentand culpa a Antreprenorului si fiind sanctionata in consecinta.</u>** Astfel, desi Autoritatea Contractanta nu este de acord cu propunerea de inlocuire a

	penalitatii cu plata unor daune interese in limita prejudiciului suferit, punctul 3 din cadrul Sub-clauzei 50.3, se modifica dupa cum urmeaza: *3. Nerespectarea prevederilor Sub-clauzei 27.2* *Penalitate - **10.000 Lei/zi** începând cu a 3-a zi de la data la care Supervizorul a transmis notificarea solicitând luarea de măsuri de asigurare a curăţeniei pe Şantier şi până la data la care respectivele obligaţii sunt îndeplinite de către Antreprenor*
Intrebare 9	***Pentru motivele dezvoltate în cuprinsul clarificării nr. 1 de mai sus solicităm să eliminați prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referință 50.3, punctul 4) relativ la aplicarea Antreprenorului a unor penalizări de 50.000 lei/zi pentru nerespectarea prevederilor subclauzei 27.3, în sensul dimunării acestor penalizări sau înlocuirii lor cu obligația antreprenorului la plata de daune interese în limita prejudiciului efectiv suferit de către Beneficiar din culpa antreprenorului și dovedit.***
Raspuns 9	A se vedea **Raspunsul nr. 6** din prezenta Clarificare. Sub-clauza 50.3. pct. 4, se modifica dupa cum urmeaza: *4. Nerespectarea prevederilor Sub-clauzei 27.3* *Penalitate - **10.000 Lei/zi** începând cu a 3-a zi de la data la care Supervizorul a transmis notificarea solicitând luarea de măsuri de asigurare a curăţeniei pe Şantier şi până la data la care respectivele obligaţii sunt îndeplinite de către Antreprenor.*
Intrebare 10	***Pentru motivele dezvoltate în cuprinsul clarificării nr. 1 de mai sus solicităm să eliminați prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referință 50.3, punctul 5) relativ la aplicarea Antreprenorului a unor penalizări de 50.000 lei/eveniment pentru înlocuirea personalului cheie cu nerespectarea prevederilor sub clauzelor 14.3 din conditiile generale și a penalităților suplimentare de 1000/zi de întârziere începând cu a 31 – a zi de la data la care este necesară înlocuirea oricăruia dintre membrii personalului cheie, în sensul dimunării acestor penalizări sau înlocuirii lor cu obligația antreprenorului la plata de daune interese în limita prejudiciului efectiv suferit de către Beneficiar din culpa antreprenorului și dovedit.***
Raspuns 10	A se vedea **Raspunsul nr. 6** din prezenta Clarificare. Sub-clauza 50.3. pct. 5, **se modifica dupa cum urmeaza**: *5. Inlocuirea Personalului cheie al Antreprenorului, exceptand situatiile prevazute la Sub-clauza 14.3 din Conditiile Generale de Contract* *Penalitate pentru fiecare persoană înlocuită - **10.000 Lei/eveniment** și, suplimentar, dacă este cazul, 1.000 Lei/zi de întârziere începând cu a 31- a zi de la data la care este necesară înlocuirea oricăruia dintre membrii personalului cheie și până la data transmiterii către Beneficiar a unui nou personal cheie propus de Antreprenor care să îndeplinească criteriile de calificare prevăzute în cadrul Documentației de atribuire (dacă este cazul) sau care să obțină cel putin același punctaj ca personalul propus în ofertă (dacă este cazul).*
Intrebare 11	***Pentru motivele detaliate în cuprinsul clarificării nr. 1 de mai sus solicităm să eliminați prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referință 50.3, subpunctul 6) și să stabiliți penalități pentru situațiile reglementate de sub clauza 50.3 la un procent uzual. Propunem o penalitate de 0,01% pe zi de întârziere din valoarea garantiei de bună executie.***
Raspuns 11	Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.1. - Sub-clauza 50.3. pct. 6.
Intrebare 12	***Pentru motivele detaliate în cuprinsul clarificării nr. 1 de mai sus solicităm să eliminați prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referință 50.3, punctul 7) și să stabiliți penalități pentru situațiile reglementate de sub clauza 50.3 la un procent uzual. Propunem o penalitate de 0,01% pe zi de întârziere din valoarea***

	garanției de bună execuție.
Raspuns 12	Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.1. - Sub-clauza 50.3. pct. 7.
Intrebare 13	***Pentru motivele dezvoltate în cuprinsul clarificării nr. 1 de mai sus solicităm să eliminați prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referință 50.3, subpunctul 8) relativ la aplicarea Antreprenorului a unor penalizări de 10.000 lei/zi pentru netransmiterea propunerii de prețuri unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic de execuție, precum și nedefalcarea acestor prețuri unitare conform sub clauzei 18.1, în sensul dimunării acestor penalizări sau înlocuirii lor cu obligația antreprenorului la plata de daune interese în limita prejudiciului efectiv suferit de către Beneficiar din culpa antreprenorului și dovedit.***
Raspuns 13	Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.1. - Sub-clauza 50.3. pct. 8.
Intrebare 14	***La sub clauza 33.1 din condițiile generale solicităm să indicați intervalul de timp maxim dintre data ordinului administrativ de începere a lucrărilor și data de începere a lucrărilor.***
Raspuns 14	Autoritatea Contractanta nu este in masura sa modifice Clauza 33 - *Inceperea* din Conditiile Generale de Contract, avand in vedere faptul ca singurele clauze ce pot fi amendate prin Conditiile Specifice sunt cele expres mentionate in tabelul din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 1/2018, respectiv clauzele 5.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 19.2, 24.1, 44.1, 45.4. Se vor avea in vedere prevederile sectiunii dedicate Conditiilor Specifice din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 1/2018, si anume: *"Beneficiarii sunt îndreptăţiţi să elaboreze Condiţii Speciale numai cu privire la subclauzele şi numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos.* ***Orice altă Condiţie Specială este nulă.****"*
Intrebare 15	***Solicităm eliminarea mențiunilor "care va fi apreciat de către acesta", mențiune care se găsește în cuprinsul prevederilor de la art. 5.2 din Acordul contractual în legătură cu executarea garanției în limita prejudiciului creat. Mențiunea mai sus citată excede prevederilor art. 41 din HG 395/2016, pe care îl citâm mai jos:*** ***Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.*** ***În considerarea prevederilor legale mai sus citate, se impune eliminarea mențiunii "care va fi apreciat de către acesta".***
Raspuns 15	Autoritatea Contractanta precizeaza ca, in contextul obligativitatii urmaririi interesului national, prin indeplinirea obiectului contractului, introducerea in clauzele contractuale a prevederilor invocate de operatorul economic, are ca scop necesitatea asigurarii Autoritatii Contractante de realizarea cu celeritate a obiectivului de interes national. Autoritatea Contractanta reitereaza faptul ca penalitatile se afla in stransa legatura de culpa partilor si sunt aplicate numai in situatia in care Contractantul nu isi indeplineste obligatiile in termenele si conditiile contractuale, astfel incat cuantumul acestora nu ar trebui sa reprezinte o ingrijorare pentru orice operator economic care urmareste indeplinirea contractului conform principiului bunei-credinte. Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.2.
Intrebare 16	***Solicităm completarea art. 5.2 lit. b) din Acordul contractual după cum urmează:***

	Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligatia de a emite pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat Beneficiarului/Autoritatii Contractante, şi care va fi apreciat de către acesta, în oricare dintre cazurile de mai jos: ***b) Antreprenorul nu plăteşte integral Beneficiarului/Autoritatii Contractante, în termen de 30 de zile, o sumă datorată, convenită de către Antreprenor sau Decisă de către Supervizor potrivit prevederilor Subclauzei 69c [Decizia Supervizorului], exclusiv în cazul în care Decizia Supervizorului este finală și obligatorie pentru părți.*** ***Completarea este justificată în condițiile în care Decizia Supervizorului poate fi contestată de oricare din părți și ulterior modificată, sens în care este abuzivă executarea garanției înainte ca Decizia Supervizorului să fie finală și obligatorie pentru părți. În caz contrar am fi în situația încălcării prevederilor condițiilor generale de contract și a prevederilor legale (constituționale) care permit accesul la justiție și dublul grad de jurisdicție.***
Raspuns 16	Autoritatea Contractanta precizeaza ca, in contextul obligativitatii urmaririi interesului national, prin indeplinirea obiectului contractului, introducerea in clauzele contractuale a acestor paragrafe, are ca scop necesitatea asigurarii Autoritatii Contractante de realizarea **cu celeritate** a obiectivului de interes national, Contractantul avand posibilitatea de a pune in aplicare prevederile Clauzei 70. *Dispute si arbitraj*, in situatia in care se considera vatamat intr-un drept al sau.
Intrebare 17	***Solicităm modificarea art. 5.2 lit. d) din Acordul contractual după cum urmează:*** ***Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligatia de a emite pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat Beneficiarului/Autoritatii Contractante, şi care va fi apreciat de către acesta, în oricare dintre cazurile de mai jos:*** ***(d) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta reziliază Contractul potrivit prevederilor Clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar], situatie in care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate revendica intreaga valoare a Garantia de Buna Executie, în limita prejudiciului creat Beneficiarului de către Antreprenor.*** ***Modificarea este justificată în considerarea prevederilor art. 41 din HG 395/2016 care prevăd posibilitatea executării garanției în limita prejudiciului creat autorității contractante. Or, articolul din acordul contractual în discuție încalcă prevederile legale, sens în care se impune modificarea acesuia.***
Raspuns 17	Autoritatea Contractanta precizeaza ca, in contextul obligativitatii urmaririi interesului national, prin indeplinirea obiectului contractului, clauza contractuala la care face referire operatorul economic are ca scop necesitatea asigurarii Autoritatii Contractante de realizarea cu celeritate a obiectivului de interes national. Prevederile art. 5.2 din Acordul contractual referitoare la garantia de buna executie, asa cum sunt acestea prezentate, armonizeaza prevederile legislatiei in materia achizitiilor publice cu prevederile H.G. nr. 1/2018 cu privre la garantia de buna executie. Dorim sa facem precizarea ca Autoritatea Contractanta respecta intrutotul prevederile art. 41 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, astfel: *„Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.”*

	Prin urmare, afirmatia potrivit careia „***articolul din acordul contractual în discuție încalcă prevederile legale, sens în care se impune modificarea acesuia***" nu este justificata si corecta. Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.2. lit. d) din Acordul Contractual.
Intrebare 18	***Pentru aceleași motive cu cele indicate în cuprinsul clarificării nr. 17 de mai sus solicităm eliminarea mențiunilor de la art. 5.2 din Acordul contractual, cu privire la executarea în intregime a Garanției de bună execuție.***
Raspuns 18	A se vedea **Raspunsul nr. 17** din prezenta Clarificare. Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.2. penultimul paragraf, din Acordul Contractual.
Intrebare 19	***Solicităm modificarea art. 5.4 alin. 1, punctul 13 din acordul contractual după cum urmează:*** ***5. Prelungirea Duratei de Execuţie în baza mecanismului contractual prevăzut la Clauza 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie] din Condiţiile Generale ale Contractului. fără a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalităţile şi/sau sancţiunile prevăzute în Contract.*** ***Clauza în forma din prezent este abuzivă în condițiile în care din cuprinsul prevederilor rezultă că prelungirea duratei contractului este justificată, iar necesitatea prelungirii este rezultatul unor elemente independente de voința Antreprenorul. Prin urmare, este excesivă penalizarea Antreprenorului pentru prelungirea duratei contractului din motive neimputabile acestuia.***
Raspuns 19	In conformitate cu prevederile Clauzei 35 *Prelungirea Duratei de Executie*, Sub-clauza 35.1. *„Antreprenorul va actiona in mod diligent pentru a preveni aparitia oricaror intarzieri si pentru a limita efectele intarzierilor aparute pe Santier. [...]"*. Autoritatea Contractanta precizeaza ca, prin inserarea acestei clauze contractuale de la 5.4. alin. (1) pct. 13, doreste sa se asigure ca obiectul contractului este indeplinit in durata contractului, de catre Contractant, precum si de faptul ca acesta intelege importanta obiectivului.
Intrebare 20	***Solicităm modificarea art. 5.5 alin. 2 din Acordul Contractual, astfel încât acesta să prevadă posibilitatea de modificare a contractului în toate ipotezele permise de art. 221 din Legea 98/2016. Aceasta întrucât, la art. 221 din legea 98/2016 sunt prevăzute mai multe situații de modificare, nu doar situația de la alin. 1 , lit. f) menționată în acordul contractual, sens în care clauza este limitativă și reduce în mod nejustificat posibilitatea de modificare a contractului, cu încălcarea prevederilor legale.***
Raspuns 20	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca in cuprinsul Acordului Contractual sunt invocate diferite situatii prevazute la Art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Cu titlu de exemplu, invocam clauza 5.1. - subclauza 48.8; clauza 5.4. alin. (1), in care se regasesc toate tipurile de modificari pe care Autoritatea Contractanta considera ca ar putea aparea pe parcursul derularii contractului In cuprinsul Acordului contractului sunt prevazute diferite categorii de modificari ale contractului, care pot interveni in perioada de derulare a acestuia. Totodata, aceste prevederi contractuale respecta intrutotul prevederile legislatiei in materia achizitiilor publice si au corespondent in toate literele de la art. 221 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, astfel, afirmatia operatorului economic este nefondata. Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.5. alin. (2) din Acordul Contractual.
Intrebare 21	***Solicităm modificarea prevederilor art. 5.6, alin. 2 din acordul contractual în sensul precizării că termenul de plată curge de la data primirii certificatului de***

	plată/certificatului final de plată. Termenul de plată stabilit în acordul contractual încalcă prevederile sub clauzelor 50.4 și 51.3 din Condițiile generale, sens în care se impune modificarea lor. ***Vă reamintim că potrivit HG 1/2018 pot fi modificate din condiții speciale doar o parte din clauzele HG 1/2018, restul fiind obligatorii. Or, sub clauzele 50.4 și 51.3 nu se află printre clauzele ce pot fi amendate. Prin urmare, modificările din acordul contractual cu privire la momentul de la care curge termenul de plată sunt nelegale și încalcă prevederile HG 1/2018.***
Raspuns 21	Asa cum este mentionat in cuprinsul art. 5.6 alin. (1) din Acordul contractual: „*1) Sub-clauza 50.4 [Plata], Sub-clauza 51.3 [Plata finala], Clauza 52 [Plati directe catre Subcontractanti], Clauza 53 [Plati intarziate], Clauza 54 [Plati catre terti] din Condiţiile Generale se vor aplica potrivit prevederilor contractuale în măsura în care acestea sunt conforme cu prevederile Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contractele încheiate între profesionişti şi între aceştia şi Beneficiar cu modificări şi completări ulterioare.* ***În situaţia în care există vreo contradicţie între prevederile Condiţiilor Contractuale şi Legea nr. 72/2013 cu modificări şi completări ulterioare, vor prevala dispoziţiile legale incidente****.”* In cuprinsul art. 5.6 alin. 2 din Acordul contractual, Autoritatea contractanta a justificat termenul contractual de plata, asa cum este mentionat in Legea nr. 72/2013, astfel: *„In conformitate cu Legea nr. 72/2013, pentru prezentul contract de proiectare si execuţie lucrări, termenul contractual de plată este prevăzut la* ***60 de zile****, având în vedere complexitatea şi volumul mare al documentelor de verificat şi aprobat înainte de realizarea plăţilor, precum şi accesul la fondurile necesare efectuării plăţilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructură rutieră de interes major.”* Prin urmare, Autoritatea Contractanta considera ca respecta reglementarile legale in vigoare in materie de plati si metine nemodificate prevederile art. 5.6 alin. 2 din Acordul contractual.
Intrebare 22	***Solicităm eliminarea prevederilor art. 5.6, alin. 6) din acordul contractual cu privire la obligația de plată a sumelor stabilite de către organele abilitate de lege și includerea acestoa în certificatul final de plată.*** ***Clauzele sunt abuzive și încalcă dreptul antreprenorului de a contesta legalitatea solicitărilor de bani. Măsurile stabilite de către organele de control sunt obligatorii pentru autoritatea contractantă, nu și pentru antreprenor. Antreprenorul are dreptul de a se opune solicitării autorității de a cere restituirea unor sume de bani în măsura în care consideră că plățile au fost făcute în mod legal.*** ***Clauzele din prezent încalcă dreptul la apărare reglementat de art. 24 din Constituția României și de art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Pe cale de consecință, se impune eliminarea clauzelor în discuție.*** ***De asemenea, clauzele sunt abuzive fiind afectate de o condiție pur potestativă. Antreprenorul nu poate cunoaște la momentul semnării contractului natura, temeinicia și nici întinderea eventualelor prejudicii/sume ce ar putea fi stabilite de organele de control/organele abilitate. Pe cale de consecință, nu-și poate asuma fără drept de opoziție plata unor sume de bani nedeterminate sau determinabile.*** ***Nu în ultimul rând, inclusiv autoritatea contractantă are dreptul de a se opune măsurilor dispuse de către organele abilitate și abia apoi poate să se îndrepte împotriva antreprenorului, acesta din urma având dreptul de a se apăra vizavi de sumele pretinse la plată de către achizitor.*** ***Pe cale de consecință, se impune eliminarea articolului în discuție sau modificarea acestuia în sensul că antreprenorul va datora sumele stabilite de către organele abilitate în măsura în care obligația de plată a acestora va fi stabilită printr-o hotărâre***

	judecătorească definitivă.
Raspuns 22	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca are obligatia recuperarii sumelor declarate necuvenite si/sau nelegale achitate Antreprenorului, in cazul in care, pe parcursul derularii contractului survine aceasta situatie. Autoritatea Contractanta reitereaza faptul ca sumele invocate in cadrul acestei clauze contractuale sunt eventuale *sume declarate necuvenite si/sau nelegale* si nu sumele la care Antreprenorul este indreptatit. Avand in vedere cele anterior mentionate, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.6. alin. (6) din Acordul Contractual.
Intrebare 23	***Solicităm clarificarea prevederilor din condițiile speciale de la subclauza 5.1 – Sarcinile supervizorului, alin. (2), lit. i), în sensul indicării în concret a criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii de bunuri/materiale, prestatorii de servicii, suncontractantii, persoanele care închiriază utilaje pentru a fi aprobată contractarea cu aceștia.*** ***De asemenea, solicităm să clarificați cine obține acordul prealabil al Beneficiarului și ce se întâmplă în situația în care Supervizorul și Beneficiarul nu se pun de acord cu privire la aprobarea terților în execuție (unul aprobă introducerea, iar celalalt refuză).***
Raspuns 23	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca trebuie respectate prevederile Conditiilor Generale de Contract, din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1/2018 ***(spre exemplu Sub-clauza 7.4)***, precum si prevederile Documentatiei de atribuire in ceea ce priveste furnizorii de bunuri/materiale, prestatorii de servicii, subcontractantii, persoanele care închiriază utilaje, cu urmarirea respectarii indeplinirii obiectului contractului. Autoritatea Contractanta considera suficient de explicita prevederea Sub-clauzei 5.1 din Conditiile Speciale pentru Contract prin care Supervizorul are responsabilitati cu privire la **aprobarea** furnizorilor de bunuri/materiale, prestatorilor de servicii, subcontractantilor activitatilor care sunt in legatura directa cu executia lucrarilor. Acordul prealabil al Beneficiarului va fi obtinut de catre Supervizor, cu conditia respectarii prevederilor mai sus mentionate.
Intrebare 24	***Solicităm clarificarea prevederilor din condițiile speciale de la subclauza 5.1 – Sarcinile supervizorului, alin. (2), lit. j), în sensul de a preciza cuantumul rezervelor de implementare și tipul de cheltuieli care pot fi acoperite din aceste rezerve.***
Raspuns 24	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca in Acordul Contractual, la clauza 5.10., pct. IV se regaseste *Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare*, iar la Nota 1, in cadrul aceleeasi clauze se regaseste valoarea totala a rezervelor de implementare. Mai mult decat atat, in cuprinsul **Anexei nr. 2 la Formularul nr. 7 A *„Sume provizionate reprezentand rezerve de implementare”*** din Formulare, parte din Documentatia de atribuire, se regasesc atat categoriile de cheltuieli care intra in categoria rezervelor de implementare, cat si cuantumul acestora.
Intrebare 25	***Solicităm clarificarea prevederilor din condițiile speciale de la subclauza 9.1 în sensul de a identifica Biroului de Regional al Beneficiarului și de a preciza obligațiile și sfera de acțiune/competentă a acestui Birou în condițiile în care este o terță persoană în contract.*** ***De asemenea, vă rugăm că clarificați datele de contact (adresă, tel, fax) ale Biroului de Siguranță a Traficului, Poliției, Urgențelor, Autorității de intervenție și Autorității de Servicii***
Raspuns 25	Biroul Regional al Beneficiarului va fi notificat ulterior semnarii contractului de lucrari. Astfel, la momentul transmiterii Ordinului de Incepere, Beneficiarul va comunica viitorului Antreprenor si datele de identificare ale Biroului de Siguranță a Traficului, Poliției, Urgențelor, Autorității de intervenție și Autorității de Servicii, astfel incat viitorul Antreprenor sa poata instiinta aceste institutii, in conformitate cu managementul

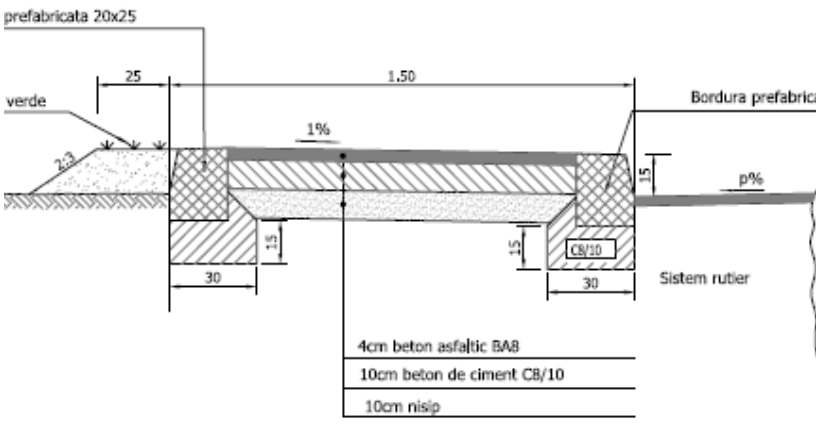
	traficului.
Intrebare 26	***Solicităm clarificarea subclauzei 9.1 din condițiile speciale în sensul de a justifica perioada de 12 luni pentru predarea accesului pe șantier. De ce 12 luni?*** ***De asemenea, solicităm să precizați dacă perioada de 12 luni include perioada de proiectare, iar în caz afirmativ solicităm să confirmați că se va permite accesul pe șantier pentru efectuarea măsurătorilor/activităților necesare pentru realizarea proiectului.***
Raspuns 26	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca termenul pentru asigurarea accesului pe Santier si punerea Santierului la dispozitia Antreprenorului este **maxim** 12 luni de la Data de Incepere, nu de 12 luni ca perioada fixa. Autoritatea Contractanta confirma faptul ca perioada de maxim 12 luni pentru asigurarea accesului pe Santier si punerea Santierului la dispozitia Antreprenorului include perioada de proiectare, care, in confomitate cu prevederile art. 5.1 Clauza 1 lit. s) Perioada de proiectare este de 9 luni. Totodata, prevederile Sub-clauzei 9.1 din Conditii Speciale trebuie coroborate cu prevederile Sub-clauzei 19.2 Modalitati si Calendarul de aprobare a proiectarii elaborate de catre Antreprenor din Conditii Speciale (spre ex.: aprobarea PAC de catre Supervizor si Beneficiar, aprobarea PTE si/sau Detalii de Executie de catre Supervizor si Beneficiar, etc.). Astfel, termenul de 12 luni pentru accesul pe santier este unul maximal. Sub-clauza 9.1 din Conditii Speciale reglementeaza accesul in santier al Antreprenorului pentru **executia** de lucrari.
Intrebare 27	***Relativ la termenul de predare a accesului pe șantier, de 12 luni de la data de începere (conform subclauzei 9.1 din condițiile speciale), solicităm să confirmați asumarea de către Beneficiar a consecințelor pe care le implică nepredarea șantierului în acest termen, inclusiv din punct de vedere al modificării prețurilor unitare prevăzute în ofertă.***
Raspuns 27	Autoritatea Contractanta precizeaza ca termenul pentru asigurarea accesului pe Santier si punerea Santierului la dispozitia Antreprenorului este de maxim 12 luni de la Data de Incepere. Totodata, va rugam sa luati act de prevederile documentatiei de atribuire si in special de prevederile Notelor 1 - 7 din cadrul *Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii*, referitor la preturi ce vor fi mentionate in oferta, respectiv: *„[...]* *Nota 2: Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru activitatile/categoriile de lucrari sau servicii complet finalizate din toate punctele de vedere. La preturile introduse va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii din prezentul tabel in mod corespunzator.* ***Preturile trebuie sa includa toate cheltuielile si riscurile de orice fel, necesare pentru proiectarea, executia, constructia, finalizarea si intretinerea Lucrarilor*** *in conformitate cu prevederile Contractului. Daca in tabelul de mai sus nu se mentioneaza separat anumite categorii de cheltuieli aferente activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, trebuie facuta o alocare completa in sumele specificate pentru toate costurile implicate.* *Nota 3: Se considera ca inainte de depunerea ofertei, orice ofertant s-a informat cu privire la corectitudinea si suficienta ofertei, precum si a pretului contractului si a sumelor care compun pretul si care acopera toate obligatiile prevazute in contract. De asemenea, se considera ca preturile ofertate in tabelul de mai sus au fost stabilite in baza conditiilor de preturi si piata in vigoare la Data de Referinta, si ca acestea includ si cota de profit, astfel cum a fost aceasta declarata in cuprinsul Formularului de*

	Propunere Financiara. *Nota 4: Se considera ca ofertantii si-au stabilit oferta financiara, inclusiv preturile de mai sus,* ***in baza propriilor calcule, operatiuni si estimari,*** *iar pe parcursul implementarii contractului, chiar daca pentru anumite obligatii sau lucrari sumele alocate mai sus sunt insuficiente, aceste obligatii vor fi respectate,* ***iar lucrarile prevazute in contract vor fi proiectate si executate fara plata unor costuri suplimentare.*** *[...]".* In ceea ce priveste preturile unitare, prevederile Sub-clauzei 18.1 reglementeaza preturile unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, care **nu vor afecta Pretul Contractului** (cu exceptia Sumelor Provizionate).
Intrebare 28	***Solicităm clarificarea prevederilor din condițiile speciale de la sub clauza 9.2 în sensul eliminării acestora, având în vedere că potrivit art. 5.1 – Sarcinile supervizorului, alin. (2), lit. i) din conditiile speciale, terțele persoane enumerate sunt deja aprobate în prealabil, iar o reaprobare a acestora privind accesul lor pe șantier este o măsură administrativă excesivă ce poate perturba fluxul tehnologic și programul de execuție.***
Raspuns 28	Potrivit prevederilor Sub-clauzei 5.1. din Conditiile Speciale de Contract Supervizorul aproba furnizorii de bunuri/materiale, subcontractantii si prestatorii de servicii ai activitatilor care sunt in legatura directa cu executia lucrarilor, insa nu se refera si la accesul in santier. Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Sub-clauzei 9.2. din Conditiile Speciale de Contract, intrucat, pe parcursul derularii contractului de lucrari, pot aparea situatii in care este necesara aplicarea acestor prevederi, respectiv la schimbarea unui furnizor de bunuri/materiale sau a unui subcontractant sau introducerea unui nou subcontractant, etc.
Intrebare 29	***Solicităm completarea prevederilor de la subclauza 10.1, paragraful al doilea din Condițiile speciale după cum urmează:*** ***Daca este necesar, Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza si/sau completa in numele Beneficiarului toate avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism emis pentru "autorizatie de construire" si va fi responsabil pentru obtinerea si mentinerea in valabilitate a avizelor/acordurilor/certificatelor necesare pe parcursul derularii lucrarilor. În situația în care prelungirea acestor avize nu este imputabilă Antreprenorului, costurile aferente prelungirii valabilității vor fi suportate de către Beneficiar.*** ***Aceasta întrucât, pot exista întârzieri în procesul de aprobare și emitere a autorizației de construire care nu se datorează Antreprenorului, sens în care avizele ar putea expira și implicit ar trebui reînoite. Or, costurile aferente nu pot fi imputate antreprenorului, atâta timp cât necesitatea prelungirii avizelor nu este o consecință a acțiunilor antreprenorului.***
Raspuns 29	Intrucat elaboarea Proiectului pentru Autorizarea Executiei Lucrarilor si a Proiectului Tehnic de Executie sunt in sarcina Antreprenorului, acesta **fiind responsabil cu stabilirea solutiilor tehnice finale**, este normal ca acesta sa fie responsabil si de obtinerea/ reactualizarea/ completarea avizelor/ acordurilor/ certificatelor necesare pe parcursul derularii lucrarilor, in conformitate cu Proiectul Tehnic de Executie elaborat de catre Antreprenor.
Intrebare 30	***Solicităm eliminarea subclauza 10.1, paragraful al treilea din Condițiile speciale având următorul conținut:*** ***Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul pentru orice intarziere in obtinerea si/sau reactualizarea si/sau completarea acordurilor si avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism sau prin actul de reglementare in domeniul mediului (…)*** ***Aceasta întrucât, Beneficiarul este cel care are obligația de a obține acordurile și avizele din Certificatul de urbanism cu valabilitate cel putin până la data semnării contractului. Or, se tranferă această obligație executantului. Ba mai mult, este***

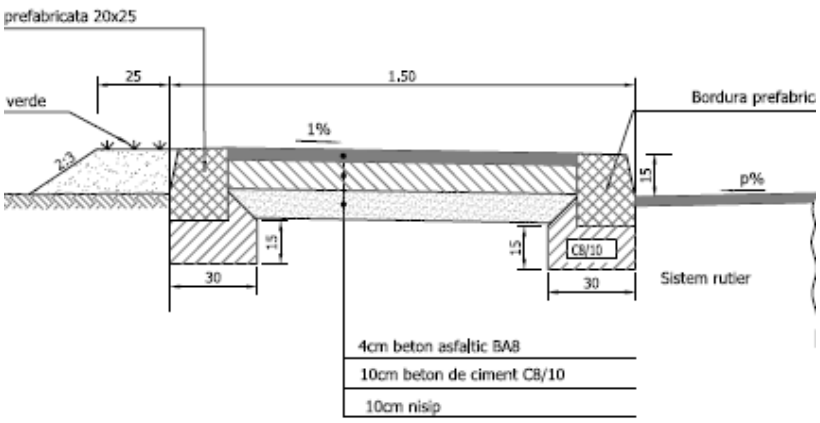
	inserată în mod excesiv și disproporționat și obligația Antreprenorului de a-l despăgubi pe Beneficiar pentru orice întârzieri în in obtinerea si/sau reactualizarea si/sau completarea acordurilor si avizelor. ***Clauza în discuție încalcă principiile art. 2 alin. 2 din Legea 98/2016 (asumarea răspunderii și proporționalitatea).***
Raspuns 30	Avand in vedere ca relatia contractuala intre Autoritatea Contractanta/Beneficiar si Antreprenor este guvernata de principiul bunei credinte, se prezuma ca Antreprenorul nu va avea intarzieri in obtinerea si/sau reactualizarea si/sau completarea acordurilor si avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism sau prin actul de reglementare in domeniul mediului. Astfel, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul va aplica penalitati **numai in situatia in care aceste intarzieri apar din cauza Antreprenorului.** Pentru motivele mai sus mentionate, **Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile** Sub-clauzei 10.1. paragraful 3 din cadrul Clauzei 10 din Conditiile Speciale de Contract.
Intrebare 31	***Solicităm completarea prevederilor de la subclauza 10.1, paragraful al patrulea din Condițiile speciale după cum urmează:*** ***Antreprenorul va fi responsabil cu realizarea/obtinerea tuturor studiilor de specialitate si intocmirea oricarei documentatii tehnice in vederea obtinerii de catre Beneficiar a Autorizatiei/Autorizatiilor de Construire sau a refacerii/revizuirii/ completarii/ reavizarii actului de reglementare in domeniul mediului, conform prevederilor legale in vigoare precum si ca urmare a solicitarilor venite din partea autoritatilor emitente. În cazul în care aceste refaceri/revizuiri/ completari/ reavizari se datorează unor cerințe suplimentare venite din partea Beneficiarului sau autorităților emitente costurile aferente vor fi suportate de Beneficiar.*** ***Aceasta întrucât, reprezintă o modificare ce nu a fost prinsă în oferta operatorului economic și nu se datorează culpei Antreprenorului.***
Raspuns 31	Autoritatea Contractanta mentine prevederile Sub-clauzei 10.1 din Conditiile speciale, intrucat Antreprenorul este cel responsabil cu realizarea studiilor care stau la baza obtinerii Autorizatiei de Construire, iar in conditiile in care aceste institutii modifica, completeaza sau solicita rectificari ale documentatiilor realizate de catre Antreprenor, tot acesta are obligatia de a le rectifica/revizui.
Intrebare 32	***Solicităm eliminarea prevederilor de la subclauza 10.1, paragraful al 5 - lea , al 6 – lea și al – 7 lea din Condițiile speciale, având în vedere că potrivit legii 50/1991 obligația obținerii autorizației de construire este în sarcina Achizitorului. De asemenea, tot achizitorul este responsabil de acceptarea/asumarea modificarilor/ completarilor/ sustinerea documentatiei direct cu Emitentul Autorizatiei*** ***Clauza este excesivă și dispoporționată și încalcă prevederile legale incidente.***
Raspuns 32	Autoritatea Contractanta precizeaza ca este necesar sa se aiba in vedere faptul ca, in Conditiile Speciale de Contract - Sub-clauza 10.1, s-a precizat ca atat Certificatul de Urbanism, cat si Acordul de Mediu au fost obtinute: *„Beneficiarul a obtinut actul de reglementare in domeniul mediului si a obtinut Certificatul de Urbanism. Acestea vor fi predate ulterior Antreprenorului”.* Mai mult decat atat, la aceeasi Sub-clauza, se face si precizarea ca: *„**Daca este necesar**, Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza si/sau completa **in numele Beneficiarului** toate avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism emis pentru “autorizatie de construire” si va fi responsabil pentru obtinerea si mentinerea in valabilitate a avizelor/acordurilor/certificatelor necesare pe parcursul derularii lucrarilor”.* Tinand cont ca acest **contract este de tip proiectare si executie**, Autorizatia de Construire se obtine pe baza documentatiei tehnice (PAC) elaborata de Antreprenor, care are si calitatea de Proiectant. Astfel, intra in responsabilitatea Antreprenorului sa

	elaboreze o documentatie de proiectare corecta si completa, sa realizeze toate studiile de specialitate si sa intocmeasca toate documentatiile tehnice, astfel incat Beneficiarul sa obtina Autorizatia de Construire, orice intarziere in indeplinirea acestor obligatii sau incalcare a acestor obligatii fiind normal a fi penalizata de catre Beneficiar, sens in care se va si citi prevederea contractuala *"Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii sarcinilor/ obligaţiilor stabilite in prezenta sub-clauza"*. Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Sub-clauzei 10.1. paragrafele 5, 6 si 7 din cadrul Clauzei 10 din Conditiile Speciale de Contract.
Intrebare 33	***Solicităm eliminarea prevederilor de la subclauza 10.1, paragraful al 8 - lea din Condițiile speciale cu privire la mentinerea valabilității autorizației de construire, având în vedere că această obligație este de asemenea în responsabilitatea achizitorului conform Legii 50/1991.***
Raspuns 33	A se vedea **Raspunsul nr. 31 si Raspunsul nr. 32** din prezenta Clarificare. Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Sub-clauzei 10.1. paragraful 8 din cadrul Clauzei 10 din Conditiile Speciale de Contract.
Intrebare 34	***Solicităm clarificarea subclauza 19.2, alin. 2 din Condițiile speciale în sensul definirii noțiunii de devieri sau diferente față de Cerințele Beneficiarului, inclusiv prin prezentarea unor exemple.***
Raspuns 34	Aceste aspecte sunt reglementate in prevederile Sub-clauzei 37.11 din Conditiile Generale referitoare la propunerile de modificare initiate de catre Antreprenor.
Intrebare 35	***La subclauza 19.2, alin. 3 și 4 din condițiile speciale solicităm să fie eliminată posibilitatea ca Supervizorul să respingă un proiect care deja a fost verificat de verificatorii de proiect ai beneficiarului. Nu se justifică o reaprobare a proiectului, fiind vorba de o prelungire nejustificată a etapei de proiectare, ce excede prevederilor legii 10/1995.***
Raspuns 35	Autoritatea Contractanta precizeaza ca, in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 19.2. alin. (2) din cadrul Clauzei 19 din Conditiile Speciale de Contract: *„**Intră în sarcina Antreprenorului angajarea/contractarea tuturor verificatorilor autorizați**, iar pentru transmiterea la Supervizor a acestor documentații Antreprenorul va respecta termenele stabilite în Cerințele Beneficiarului privind predarea Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) și/ sau a Proiectului Tehnic de Execuție și/sau a Detaliilor de Execuție.”*. Astfel, in sarcina Supervizorului este aprobarea sau respingerea motivata a Documentatiei Tehnice (Proiectul) pentru **autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC)**, conform prevederilor Sub-clauzei 19.2. alin. (3) din cadrul Clauzei 19 din Conditiile Speciale de Contract si aprobarea sau respingerea motivata a **Proiectul Tehnic de Execuție și/sau Detaliile de Execuție**, conform prevederilor Sub-clauzei 19.2. alin. (4) din cadrul Clauzei 19 din Conditiile Speciale de Contract. Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Sub-clauzei 19.2 alin. (3) si (4) din cadrul Clauzei 19 din Conditiile Speciale de Contract.
Intrebare 36	***Solicităm eliminarea subclauzei 19.2 alin. 5 din condițiile speciale având în vedere că este vorba de niște acțiuni care dublează demersurile de la alin. 2 și 4 din Subclauza 19.2, inclusiv perioada de aprobare a proiectului. Mai mult, supervizorul este reprezentantul Beneficiarului.***
Raspuns 36	In conformitate cu prevederile Sub-clauzei 11.1 din Conditiile Generale *„**Personalul Beneficiarului include Supervizorul**, reprezentanții acestuia, precum și orice altă persoană angajată de către Beneficiar și numită de către acesta ca făcând parte din Personalul Beneficiarului. Personalul Beneficiarului va avea competențele delegate de către Beneficiar, comunicate în scris Antreprenorului. [...]”*. Insa, relatia patrimoniala din cadrul contractului este intre Beneficiar si Antreprenor. Astfel, finalizarea etapelor importante din cadrul contractului de **proiectare** si **executie**

	se realizeaza cu aprobarea sau respingerea motivata a Beneficiarului. Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Sub-clauzei 19.2 alin. (5) din cadrul Clauzei 19 din Conditiile Speciale de Contract.
Intrebare 37	***Solicităm clarificarea subclauzei 24.1 alin. 2 din Condițiile speciale în sensul eliminării acestuia întrucât, în condițiile deschiderii șantierului și a tipurilor de lucrări prevăzute este aproape imposibil de asigurat condițiile de circulație la parametrii calitativi "cel putin la nivelul celor initiali", în condițiile în care lucrările se vor executa sub circulație restricțiile care vor fi impuse vor respecta planul de management al traficului care va fi elaborate de executant si aprobat de administratorul drumului si poliție.*** ***În cazul în care nu veți dori eliminarea clauzei solicităm acceptarea ca acești parametri calitativi ce trebuie asigurați să fie în conformitate cu planul de management al traficului privind restricțiile de circulație care sunt obligatorii.***
Raspuns 37	Autoritatea Contractanta apreciaza necesara respectarea de catre Antreprenor a acestei clauze contractuale, aceasta constituindu-se intr-o obligatie contractuala a Contractantului, astfel incat pastreaza nemodificate prevederile Sub-clauzei 24.1. alin. (2), intrucat nu se poate distruge calitatea drumurilor din incidenta de influenta a santierului in detrimentul construirii acestui lot de drum.
Intrebare 38	***Cerintele Beneficiarului*** ***La pagina 7 se mentioneaza ca studiul de fezabilitate din anul 2008 a fost reactualizat in anul 2016.*** ***Va rugam sa ne transmiteti partea desenata in format dwg a variantei actualizata a studiului de fezabilitate cat si partea scrisa in format pdf. Totodata in varianta 2008 nu exista plan de semnalizare si marcaje rutiere, astfel ca va rugam sa ni-l transmiteti odata cu varianta actualizata a studiului de fezabilitate si planul de semnalizare si marcaje rutiere actualizat in format dwg.***
Raspuns 38	Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor toate datele si documentele pe care le detine, inclusiv documentatia intocmita anterior. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. Deasemenea, Autoritatea Contractanta a pus la dispozitie in cadrul Documentelor Beneficiarului din Documentatia de atribuire publicata in SEAP toate documentele pe care acesta le detine, in formatul in care acestea exista la dispozitia sa. In sprijinul dumneavoastra atasam Anexa nr.1 la prezenta Clarificare, care include si Arhiva „***1. Compl SF Luca Way.rar***" disponibila (din motive de natura tehnica, avand in vedere dimensiunea mare a fisierelor atasate) prin accesarea urmatorului link: http://storage.cnadnr.ro/achizitii/ID1395/Anexe_la_Clarificarea_nr.2_Lot_1.zip
Intrebare 39	***Va rugam sa ne transmiteti certificatul de urbanism si avizele obtinute care au stat la baza studiului de fezabilitate reactualizat.***
Raspuns 39	In sprijinul dumneavoastra atasam Anexa nr.1 la prezenta Clarificare, care include si Folderul „***AVIZE Obtinute 2015-2016 (actualizat 2018)***" disponibila (din motive de natura tehnica, avand in vedere dimensiunea mare a fisierelor atasate) prin accesarea urmatorului link: http://storage.cnadnr.ro/achizitii/ID1395/Anexe_la_Clarificarea_nr.2_Lot_1.zip
Intrebare 40	***Va rugam sa ne transmiteti studiile de teren actualizate expertiza de drum, studiu geotehnic, etc.***
Raspuns 40	In sprijinul dumneavoastra atasam Anexa nr.1 la prezenta Clarificare, care include

	Folderul „***Expertiza***”, in cadrul caruia se regasesc si documentele „**Vol III Studiu Geotehnic.pdf**” si „**Vol I.2 Expertiza drum Piese desenate.pdf**”, disponibila (din motive de natura tehnica, avand in vedere dimensiunea mare a fisierelor atasate) prin accesarea urmatorului link: http://storage.cnadnr.ro/achizitii/ID1395/Anexe_la_Clarificarea_nr.2_Lot_1.zip
Intrebare 41	***Va rugam sa ne transmiteti studiul hidrogeologic preliminar pentru putul forat propus a se executa in parcarea de lunga durata, km 54+765.***
Raspuns 41	Date hidrogeologice privind centura Bucuresti sunt cuprinse in cadrul Studiului geotehnic realizat pentru Expertiza tehnica. A se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare, care include si Folderul „***Expertiza***”, disponibila (din motive de natura tehnica, avand in vedere dimensiunea mare a fisierelor atasate) prin accesarea urmatorului link: http://storage.cnadnr.ro/achizitii/ID1395/Anexe_la_Clarificarea_nr.2_Lot_1.zip
Intrebare 42	***Cerintele Beneficiarului*** ***La pagina 6 si 7 nu sunt descrise materialele care se folosesc la structura rutiera ale benzilor de largire, sunt descrise doar tipul de strat si grosimea lor.*** ***Va rugam sa ne precizati care sunt materialele care se folosesc pentru fiecare strat.***
Raspuns 42	In cadrul capitolului *1.3. Descrierea lucrarilor* din Cerintele Beneficiarului este realizata o descriere succinta a lucrarilor cuprinse in documentatia tehnica pusa la dispozitie. Materialele care se vor folosi la realizarea structurii rutiere vor respecta prevederile Normativului AND 605-2016 „*Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Conditii tehnice de proiectare, preparare si punere in opera a mixturilor asfaltice*”. n vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, se vor respecta cerintele prevazute pentru structura rutiera la capitolului *6.2.3.Caracteristici imperative privind lucrari de drum si intersecții* din Cerintele Beneficiarului
Intrebare 43	***Cerintele Beneficiarului*** ***La pagina 7 este mentionat realizarea unui trotuar cu latimea de 1.50m dar nu se mentioneaza si ce structura (straturi) are.*** ***Va rugam sa ne precizati structura (straturile) acestuia.***
Raspuns 43	In cadrul fisierului *SF Search 2008* , *Vol 2 Lucrari de drum si expertiza drum – Detalii – plansa 7230-1-DRU-1-DE-002* , este indicata structura trotuarelor 
Intrebare 44	***Pentru retelele de utilitati apa-canal ce necesita mutari/protejari, va rugam sa ne puneti la dispozitie expertize tehnice intocmite conform cu Legea 50/1991 si Legea***

	10/1995 (cu modificarile si completarile in vigoare)
Raspuns 44	In sprijinul dumneavoastra atasam Anexa nr.1 la prezenta Clarificare, care include si Folderul „***PT utilitati intersectii***”, disponibila (din motive de natura tehnica, avand in vedere dimensiunea mare a fisierelor atasate) prin accesarea urmatorului link: http://storage.cnadnr.ro/achizitii/ID1395/Anexe_la_Clarificarea_nr.2_Lot_1.zip
Intrebare 45	***Cerintele Beneficiarului*** ***La pagina 7 se mentioneaza ca studiul de fezabilitate din anul 2008 a fost reactualizat in anul 2016.*** ***Va rugam sa ne transmiteti partea desenata in format dwg a variantei actualizata a studiului de fezabilitate cat si partea scrisa in format pdf. Totodata in varianta 2008 nu exista plan de semnalizare si marcaje rutiere, astfel ca va rugam sa ni-l transmiteti odata cu varianta actualizata a studiului de fezabilitate si planul de semnalizare si marcaje rutiere actualizat in format dwg.***
Raspuns 45	A se vedea Raspunsul nr.38 din prezenta Clarificare.
Intrebare 46	***Va rugam sa ne transmiteti certificatul de urbanism si avizele otinute care au stat la baza studiului de fezabilitate reactualizat.***
Raspuns 46	A se vedea Raspunsul nr. 39 din prezenta Clarificare.
Intrebare 47	***Va rugam sa ne transmiteti studiile de teren actualizate expertiza de drum, studiu geotehnic, etc.***
Raspuns 47	A se vedea Raspunsul nr. 40 din prezenta Clarificare.
Intrebare 48	***Va rugam sa ne transmiteti studiul hidrogeologic preliminar pentru putul forat propus a se executa in parcarea de lunga durata, km 54+765***
Raspuns 48	.A se vedea Raspunsul nr. 41 din prezenta Clarificare.
Intrebare 49	***Cerintele Beneficiarului*** ***La pagina 6 si 7 nu sunt descrise materialele care se folosesc la structura rutiera ale benzilor de largire, sunt descrise doar tipul de strat si grosimea lor.*** ***Va rugam sa ne precizati care sunt materialele care se folosesc pentru fiecare strat.***
Raspuns 49	In cadrul capitolului 1.3. este realizata o descriere succinta a lucrarilor cuprinse in documentatia tehnica pusa la dispozitie. In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, se vor respecta cerintele prevazute pentru structura rutiera la capitolului *6.2.3.Caracteristici imperative privind lucrari de drum si intersecţii* din Cerintele Beneficiarului. Materialele care se vor folosi la realizarea structurii rutiere vor respecta prevederile Normativului AND 605-2016 „*Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Conditii tehnice de proiectare, preparare si punere in opera a mixturilor asfaltice*”.
Intrebare 50	***Cerintele Beneficiarului*** ***La pagina 7 este mentionat realizarea unui trotuar cu latimea de 1.50m dar nu se mentioneaza si ce structura (straturi) are.*** ***Va rugam sa ne precizati structura (straturile) acestuia.***
Raspuns 50	In cadrul fisierului *SF Search 2008 , Vol 2 Lucrari de drum si expertiza drum – Detalii – plansa 7230-1-DRU-1-DE-002* , este indicata structura trotuarelor

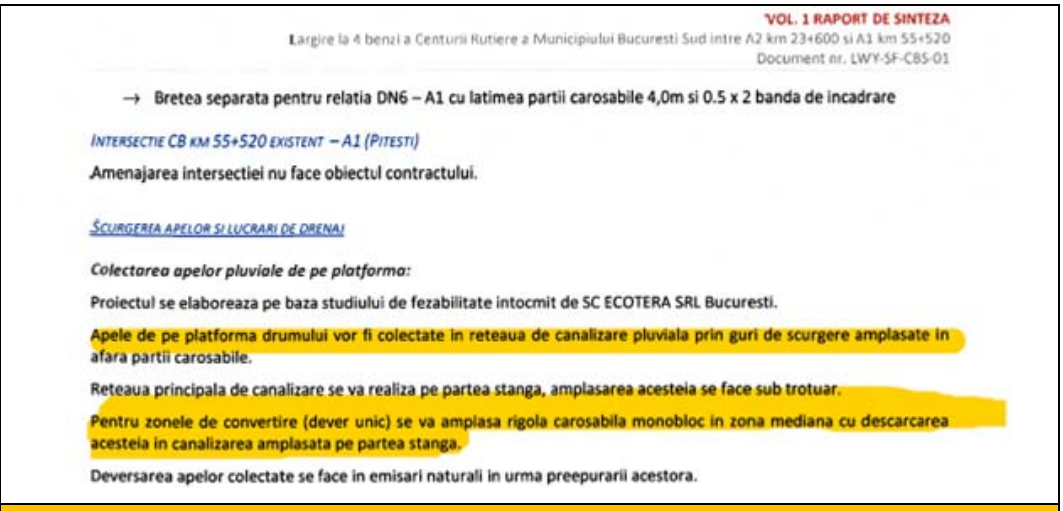
<table>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>Intrebare 51</td><td>Pentru retelele de utilitati apa-canal ce necesita mutari/protejari, va rugam sa ne puneti la dispozitie expertize tehnice intocmite conform cu Legea 50/1991 si Legea 10/1995 (cu modificarile si completarile in vigoare)</td></tr>
<tr><td>Raspuns 51</td><td>A se vedea Raspunsul nr. 44 din prezenta Clarificare.</td></tr>
<tr><td>Intrebare 52</td><td>Programul de proiectare din Cerintele Beneficiarului
<table>
<tr><th>Nr.crt.</th><th>Denumire Pachet de Proiectare</th><th>Termen [zile/luni]</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Predarea la Supervizor a Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructii (DTAC)</td><td>3 luni de la Data de Incepere</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Verificarea de catre Verificatori autorizati contractati de Beneficiar conform Clauzei 19.2 din Conditii Speciale</td><td>15 zile de la Predare DTAC la Supervizor</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Aprobare DTAC de catre Supervizor conform Clauzei 19.2 din Conditii speciale</td><td>15 zile de la finalizarea verificarii de catre verificatori autorizati a DTAC-ului</td></tr>
<tr><td>....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Predarea la Supervizor a Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie</td><td>2 luni de la data aprobarii DTAC de catre Beneficiar</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Verificarea de catre Verificatori autorizati contractati de Beneficiar conform Clauzei 19.2 din Conditii Speciale</td><td>15 zile de la Predare PTE si DDE la Supervizor</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Aprobare Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie de catre Supervizor conform Clauzei 19.2 din Conditii speciale</td><td>15 zile de la finalizarea verificarii de catre verificatori autorizati a PTE si DDE</td></tr>
<tr><td>...</td><td></td><td></td></tr>
</table>
Conform Clauzei 19, sub-clauza 19.2(2) – „Intră în sarcina Antreprenorului angajarea/ contractarea tuturor verificatorilor autorizați, iar pentru transmiterea la Supervizor a acestor documentații Antreprenorul va respecta termenele stabilite în</td></tr>
</table>

	Cerințele Beneficiarului privind predarea Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) și/ sau a Proiectului Tehnic de Execuție și/sau a Detaliilor de Execuție". ***Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rugam sa indicati clar, complet si fara echivoc, care sunt cerintele Autoritatii Contractante pentru realizarea Programului de Proiectare.***
Raspuns 52	In Cerintele Beneficiarului, cap. 6.1.2.5.4., **punctul 2 si 6** din cadrul tabelului privind Programul de proiectare, paragrafele: *"Verificarea de către Verificatori autorizați contractați de Beneficiar conform Clauzei 19.2 din Condițiile Speciale"* **se modifica dupa cum urmeaza:** *"Verificarea de către Verificatori autorizați contractați de Antreprenor conform Clauzei 19.2 din Condițiile Speciale"*
Intrebare 53	***Va rugam sa confirmati ca in cazul unei Asocieri fiecare dintre asociati poate aduce separat o garantie de participare emisa de o entitate bancara si una emisa de o compania de asigurari ambele in numele Asocierii conform procentajelor asociatilor cumulat cele doua garantii sa indeplineasca cerinta Autoritatii Contractante.***
Raspuns 53	A se vedea prevederile din Instructiunile catre ofertanti Sectiunea IV.4.3 *Modul de prezentare al ofertei*, punctul 2 Cerinte obligatorii privind Garantia de Participare in care se mentioneaza urmatoarele: "*Garantia de Participare TREBUIE ELIBERATA IN NUMELE OFERTANTULUI si poate fi emisa la solicitarea unuia dintre asociati, mai multor asociati sau a tuturor asociatilor. In cazul in care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori economici, este obligatorie completarea in continutul garantiei de participare la sectiunea „ofertant – denumire/ numele" a numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii in conformitate cu Acordul de Asociere.*" Prin urmare, se pot depune pentru prezenta procedura de achizitie publica mai multe garantii de participare cu conditia ca acestea sa fie eliberate in numele ofertantului si sa respecte toate prevederile privind modalitatea de constituire a Garantiei de Participare din Instructiunile catre ofertanti si deasemenea sa respecte in integralitate Formularul A din Documentatia de atribuire. Cuantumul total al garantiilor de participare trebuie sa fie de minim cuantumul stabilit prin Instructiunile catre ofertanti.
Intrebare 54	***Va rugam sa ne puneti la dispozitie formulare in format editabil.***
Raspuns 54	In conformitate cu art. 2 alin (2) lit a)-e), coroborat cu art. 150 alin (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta a asigurat prin mijloace electronice, prin intermediul SEAP, accesul direct, complet, nerestrictionat si gratuit al operatorilor economici la documentele achizitiei, prin publicarea acestora in format pdf. De asemenea, au fost respectate si prevederile art. 150 alin (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractantă a prevazut în cuprinsul anunţului de participare adresa de internet la care sunt disponibile documentele achiziţiei, respectiv www.cnadnr.ro.
Intrebare 55	***Va rugam sa ne transmiteti pentru: CCTV , bariera, imprejmuire put , cabina pentru paza, grup social, insulele pentru urcare/coborare calatori din autobuz, mese si bancute – detalii de executie, fise tehnice etc - va rugam sa puneti la dispozitie documentatia necesara realizarii ofertei.***
Raspuns 55	Conform punctului 6.1.2.11.3 din Cerintele Beneficiarului **intra in sarcina viitorului Antreprenor elaborarea Detaliilor de executie**: *6.1.2.11.3 În plus faţă de planşele proiectului tehnic de executie **Antreprenorul va elabora toate planşele pe etape şi detaliile de execuţie necesare pentru asigurarea bunei execuţii a lucrărilor**.*

	Astfel, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.
Intrebare 56	***Partea de iluminare – pentru parcarea permanenta – va rugam sa ne puneti la dispozitie documentatia necesara realizarii ofertei.***
Raspuns 56	Se vor respecta recomandarile privind Semanalizare rutiera, marcaje si iluminat din Raportul de Audit de Siguranta Rutiera , capitolul 7 *Cerinte privind personalului si utilajele*, paragraful 7.2. *Cerinte privind utilajele necesare realizarii contractului.*
Intrebare 57	***Statia de epurare mecano-biologica, bazine de sedimentare, separatoare de hidrocarburi, post trafo, containere ecologice, rezervor apa, detalii privind putul forat – va rugam sa ne puneti la dispozitie documentatia necesara realizarii ofertei.***
Raspuns 57	Autoritatea Contractanta a pus la dispozitie toata Documentatia tehnica disponibila cu privire la cerintele de mediu. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.
Intrebare 58	***Scurgerea apelor la parcarea de lunga durata – nu este tratata in documentatie si lipsesc planurile de executie pt toate utilitatile ce se vor executa si cele existente.***
Raspuns 58	In vederea asigurarii tratamentului egal si a unei fundamentari cat mai bune a ofertelor tehnice si financiare Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor totalitatea datelor si documentelor pe care le detine. In cadrul Formularului de Propunere financiara, sunt cuantificate activitatile privind utilitatile, atat Devieri/mutari/relocari/protejari a celor existente (ref. *3.1. Utilitati*), cat si a celor ce se vor executa (ref *9.3.Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*). Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.
Intrebare 59	***Parcarea de lunga durata nu are trotuare pentru deplasare pietonala – va rugam confirmati ca nu sunt necesare.***
Raspuns 59	A se vedea Raspunsul nr. 43 din prezenta Clarificare. A se vedea si Anexa 1 la prezenta Clarificare, in cadrul careia se regaseste plansa "*Plan situatie- parcare-54.pdf*". Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.
Intrebare 60	***Conform memoriului tehnic pus la dispozitie conducta de apa de la km 54+050 are un diametru de 1400mm, iar in planse diametrul este de 2200 – va rugam clarificati.***
Raspuns 60	Din plansa nr. 2 Mutare si/sau protejare conducte utilitati(apa) SF 2008 Search Corporation, pe traseul Bucuresti Sud reiese ca CONDUCTA NH BICU BRAGADIRU are Dn 2200 mm
Intrebare 61	***Va rugam sa ne puneti la dispozitie profilele longitudinale si transversal pentru canalizarea pluviala cu D1000 necesare realizarii ofertei.***
Raspuns 61	In vederea asigurarii tratamentului egal si a unei fundamentari cat mai bune a ofertelor tehnice si financiare Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor totalitatea datelor si documentelor pe care le detine.

	Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.
Intrebare 62	***Va rugam sa ne puneti la dispozitie detalii despre cele doua canivouri ce se vor realiza la km 53+950 si km 53+950.***
Raspuns 62	In vederea asigurarii tratamentului egal si a unei fundamentari cat mai bune a ofertelor tehnice si financiare Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor totalitatea datelor si documentelor pe care le detine. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.
Intrebare 63	***Marcajele pe zona parcarii pentru dirijarea traficului – nu sunt conforme cu STAS in vigoare – va rugam sa ne transmitei plansele de la realizare SF.***
Raspuns 63	In vederea asigurarii tratamentului egal si a unei fundamentari cat mai bune a ofertelor tehnice si financiare Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor totalitatea datelor si documentelor pe care le detine. Se vor respecta recomandarile privind Semanalizare rutiera, marcaje si iluminat din Raportul de Audit de Siguranta Rutiera , capitolul 7 *Cerinte privind personalului si utilajele*, paragraful 7.1. *Cerinte privind personalul implicat….*
Intrebare 64	***Va rugam sa ne spuneti care este documentul in format editabil (.dwg) in care se poate lucra (exista proiecte de la mai multi proiectanti), cel postat cuprinde situatia actuala si nu ce se doreste a se executa.***
Raspuns 64	A se vedea Anexa nr.1 la prezenta Clarificare, disponibila (din motive de natura tehnica, avand in vedere dimensiunea mare a fisierelor atasate) prin accesarea urmatorului link: http://storage.cnadnr.ro/achizitii/ID1395/Anexe_la_Clarificarea_nr.2_Lot_1.zip Deasemenea, Autoritatea Contractanta a pus la dispozitie in cadrul Documentelor Beneficiarului din Documentatia de atribuire publicata in SEAP toate documentele pe care acesta le detine, **in formatul in care acestea exista la dispozitia sa**.
Intrebare 65	***Va rugam sa le puneti la dispozitie Avizele pentru relocare.***
Raspuns 65	A se vedea Raspunsul nr. 39 si nr. 44 din prezenta Clarificare.
Intrebare 66	***Va rugam sa ne puneti la dispozitie cartile funciare pentru Coridorul de expropriere.***
Raspuns 66	In vederea asigurarii tratamentului egal si a unei fundamentari cat mai bune a ofertelor tehnice si financiare Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor totalitatea datelor si documentelor pe care le detine. A se vedea Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare *Plan coridor expropriere_Centura Bucuresti-DN5-A1.dwg*
Intrebare 67	***Va rugam sa ne puneti la dispozitie sectiuni transversal si longitudinal prin sensul giratoriu, marcajele pentru acesta***
Raspuns 67	In vederea asigurarii tratamentului egal si a unei fundamentari cat mai bune a ofertelor tehnice si financiare Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor totalitatea datelor si documentelor pe care le detine. In sprijinul dumneavoastra atasam Anexa nr.1 la prezenta Clarificare, care include si Arhiva „***1. Compl SF Luca Way.rar***”, in cadrul caruia se regasesc planse referitoare la sensul giratioriu, disponibila (din motive de natura tehnica, avand in vedere dimensiunea mare a fisierelor atasate) prin accesarea urmatorului link: http://storage.cnadnr.ro/achizitii/ID1395/Anexe_la_Clarificarea_nr.2_Lot_1.zip

Intrebare 68	***Va rugam sa clarificati care este profilul transversal tip ce se va executa in portiune de drum km 55+520 si km 54+700, deoarece in documentele depuse sunt mai multe tipuri diferite.***
Raspuns 68	Profilul transversal tip ce se va executa in portiunea de drum km 55+520 si km 54+700 este cel pus la dispozitia ofertantilor, plansa LWY-SF-D-PTT-PT, acesta fiind descris la pag 11 si structura rutiera in pagina 12, in cadrul Avizului CTE-CNADNR nr 4521 /28.01.2016, Astfel, profilurile transversale adoptate au urmatoarele caracteristici: **Obiectiv** / **Profil transversal adoptat** **Centura Bucuresti**: Platformă (P):17,90m; Parte carosabila (C):2 cai x 7,00, reprezentand 4 benzi de circulatie de cate 3,50m. Efect optic de bordura 2x0.40m; Trotuar 1,50m; Zona mediana (M): 1,60m ***Structura rutiera:*** ***Sectorul 3 km 43+000 – km 54+765*** km 43+000 – km 49+500: -8cm frezare -8cm+r* strat de baza AB31.5 -geocompozit - 6cm strat de legatura BAD20m - 5cm strat de uzura MAS16 km 50+700 – km 51+620: -8cm frezare -8cm+r* strat de baza AB31.5 -geocompozit - 6cm strat de legatura BAD20m 5cm strat de uzura MAS16 km 52+615 – km 54+765: -28cm reciclare si stabilizare** - 8cm strat de baza AB31.5 - geocompozit -6cm strat de legatura BAD20m 5cm strat de uzura MAS16 Refacere structura rutiera km 49+500 – 50+700 (sector fara capacitate portanta) -5cm strat de uzura MAS16; -6cm strat de legatura BAD20m; - 10cm strat de baza AB31.5; - 25cm strat superior de fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici rutieri; - 30cm strat inferior de fundatie din balast; - 20 cm strat de forma din balast; -Geotextil cu rol anticontaminant. ***Sectorul 4 km 54+765 – km 55+520*** km 54+765 – km 55+520: -28cm reciclare si stabilizare** - 8cm strat de baza AB31.5 - geocompozit -6cm strat de legatura BAD20m 5cm strat de uzura MAS16
Intrebare 69	***Va rugam sa ne comunicati in sectiunea de drum km 55+520 si km 54+700, se monteaza rigola carosabila monobloc?***
Raspuns 69	In vederea asigurarii tratamentului egal si a unei fundamentari cat mai bune a ofertelor tehnice si financiare Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor totalitatea datelor si documentelor pe care le detine. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. A se vedea si Volumul 1 - Raport de sinteza (februarie 2016), pagina 38:

	
Intrebare 70	***Perioada de 10 luni executie este fara perioada de timp friguros?***
Raspuns 70	Conform cap. 1 *PREAMBUL,* paragraful 1.3 *Descrierea lucrarilor [...]* din Cerintele Beneficiarului:. ***Durata de executie este de 10 luni***. Mentionam faptul ca Durata de executie de 10 luni include si perioada de timp friguros/de iarna. Lucrarile vor respecta prevederile reglementarilor in vigoare privind Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii.
Intrebare 71	***Va rugam sa ne transmiteti completarea studiului de fezabilitate realizat de Luca Way in 2015.***
Raspuns 71	In sprijinul dumneavoastra atasam Anexa nr.1 la prezenta Clarificare, care include si Arhiva „***1. Compl SF Luca Way.rar***", disponibila (din motive de natura tehnica, avand in vedere dimensiunea mare a fisierelor atasate) prin accesarea urmatorului link: http://storage.cnadnr.ro/achizitii/ID1395/Anexe_la_Clarificarea_nr.2_Lot_1.zip Astfel, va rugam sa consultati, *folderul denumit 1. Compl SF Luca Way.rar*
Intrebare 72	***Va rugam sa fiti de acord cu prelungirea termenului de depunere cu cel putin 10 zile de la data depunerii pentru realizarea unei oferte corespunzatoare solicitarilor dumneavoastra.***
Raspuns 72	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 73	***ACORD CONTRACTUAL lot 1, lot 2 CLAUZA 16 - Responsabilități și Asigurări 10% din Pretul Contractului va fi limita minima a asigurarii profesionale de proiectare,*** ***Va rugam clarificati daca asigurarea de raspundere civila profesionala pentru activitatea de proiectare este 10 % din pretul total al contractului sau se refera la 10 % DIN VALOAREA PROIECTARII.***
Raspuns 73	In conformitate cu prevederile art. 5.1 Sub-clauza 16.2.(b) 1. din Acordul contractual, limite de acoperire a asigurării pentru daune aduse terților reprezinta **10% din Pretul Contractului** va fi limita minima a asigurarii profesionale de proiectare.
Intrebare 74	***Cerintele beneficiarului lot 1/ 2, pag 4.*** ***Se face mentiune asupra unui certificat de urbanism din 2015 + alte avize expirate.*** ***Va rugam sa ne puneti la dispozitie toate avizele si certificatele de urbanism care sunt in termen de valabilitate si care fac referire la obiectul contractului – lot 1 / lot 2***
Raspuns 74	In sprijinul dumneavoastra atasam Anexa nr.1 la prezenta Clarificare, care include si Folderul „***AVIZE Obtinute 2015-2016 (actualizat 2018)***" disponibila (din motive de

	natura tehnica, avand in vedere dimensiunea mare a fisierelor atasate) prin accesarea urmatorului link: http://storage.cnadnr.ro/achizitii/ID1395/Anexe_la_Clarificarea_nr.2_Lot_1.zip
Intrebare 75	***Avand in vedere volumul mare de lucru pentru pregatirea ofertei (inclusiv timpul necesar pentru traducerea documentelor asociatilor straini), va rugam sa fiti de acord cu decalarea termenului de depunere al ofertei cu cel putin 30 zile a.i. sa putem depune o oferta corecta si atent elaborata, pe masura complexitatii proiectului.***
Raspuns 75	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 76	***Avand in vedere volumul mare de lucru pentru pregatirea ofertei (inclusiv timpul necesar pentru traducerea documentelor ofertantilor straini), termenul de depunere foarte scurt, va rugam sa fiti de acord cu decalarea termenului de depunere al ofertei cu cel putin 30 zile a.i. sa putem depune o oferta corecta si atent elaborata, pe masura complexitatii proiectului.***
Raspuns 76	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 77	***Avand in vedere volumul mare de lucru pentru pregatirea ofertei (inclusiv timpul necesar pentru traducerea documentelor ofertantilor straini), termenul de depunere foarte scurt, va rugam sa fiti de acord cu decalarea termenului de depunere al ofertei cu cel putin 30 zile a.i. sa putem depune o oferta corecta si atent elaborata, pe masura complexitatii proiectului.***
Raspuns 77	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 78	***Având in vedere contextul epidemiei de coronavirus si a următoarelor, așa cum sunt acestea descrise mai jos:*** ***-faptul ca multe companii au luat masuri de adaptare la situația actuala, limitând activitatea si*** ***limitând deplasarea angajaților la sediul companiilor, in contextul accentuării răspândirii virusului COVID 19 si a creșterii accelerate a numărului zilnic de îmbolnăviri;*** ***-faptul ca angajații sunt obligați sa își ia concediu sau majoritatea dintre aceștia lucrează in regim de telemunca cu acces limitat la mijloacele IT, de comunicare, cu lipsa acces la mijloace*** ***de printare, plotare, facand dificila cooperarea in vederea elaborării documentelor aferente licitatiei sau se lucrează in schimburi cu program decalat pentru a limita interacțiunea angajaților si a păstra o distanta de siguranță intre aceștia;*** ***-având in vedere complexitatea si diversitatea lucrarilor ce fac obiectul serviciilor, VA RUGAM SA ACCEPTAȚI DECALAREA TERMENULUI DE PREDARE A CANDIDATURILOR CU 30 DE ZILE CALENDARISTICE, pentru a se putea elabora o candidatura apta sa răspundă in totalitate cerințelor formulate de către Autoritatea Contractanta solicitate prin FDA. Ne referim aici si la faptul ca documentele prezentate de către partenerii străini trebuie sa fie însoțite de traducere autorizata, activitate ce necesita o perioada mai mare de timp;*** ***-de asemenea trebuie sa menționam ca ofertanții străini trebuie sa se înregistreze in SEAP pentru a putea depune oferta pentru prezenta procedura, fiind de asemenea necesara o perioada de timp pentru acesta operațiune, ținând cont la fel, ca toate documentele ce trebuie*** ***înaintate, au nevoie de traducere autorizata in limba romana;*** ***-si având in vedere toate cele menționate anterior si ținând cont de complexitatea***

	serviciilor si ***lucrarilor ce fac obiectul achiziției, <u>VA RUGAM SA AVEȚI AMABILITATEA DE A ACCEPTA O DECALARE DE TERMEN DE 30 DE ZILE</u>, având in vedere condițiile prezente ce ne obliga la luarea unor masuri ce restricționează desfășurarea unei activități normale si pentru a da posibilitatea tuturor potențialilor ofertanți la elaborarea candidaturilor conform tuturor prevederilor din FDA si posibilitatea Autorității Contractante de a respecta principiile de baza ale Legii achizițiilor publice 98/2016 in baza căreia a fost lansata procedura, respectiv:*** ***a) nediscriminarea;*** ***b) tratamentul egal;*** ***c) recunoașterea reciprocă;*** ***d) transparența;*** ***e) proporționalitatea;*** ***f) asumarea răspunderii.***
Raspuns 78	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 79	***Ref cerinta Fisa de date Lot 1 Experienta detinuta in pozitia de Manager Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect in cadrul unor contracte de supervizare executie lucrari si/sau supervizare proiectare si executie lucrari si/ sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi si/sau drumuri judetene.*** ***Va rugam sa acceptati indeplinirea cerintei privind Experienta detinuta de Managerul de proiect si prin participarea acestuia in cadrul unor contracte de supervizare executie lucrari si/sau supervizare proiectare si executie lucrari si/ sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi si/sau drumuri judetene.*** ***pe pozitia similara Managerului de proiect respectiv pe pozitia de Director Tehnic.***
Raspuns 79	In conformitate cu Instructiunile catre ofertanti, Sectiunea II.2.5) Criterii de atribuire, factorul de evaluare "*Experienta detinuta de Managerul de Proiect*", atat in descrierea criteriului cat si in algoritmul de calcul Autoritatea Contractanta a precizat clar **pozitiile care vor fi luate in considerare pentru calcularea punctajului aferent acestui expert**, respectiv „*Participarea expertului propus in pozitia de **Manager Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect** in cadrul unor contracte de supervizare executie lucrari si/sau supervizare proiectare si executie lucrari si/ sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi si/sau drumuri judetene [...]”* De asemenea, avand in vedere responsabilitatile Managerului de proiect cuprinse in Cerintele Beneficiarului, sectiunea 7.1. *Cerinte privind personalul implicat [..]*, consideram ca Directorul tehnic, care in principal are responsabilitati privind partea tehnica a unui contract , nu are experienta cumulata necesara unui manager de Proiect, acesta fiind responsabil cu toate activitatile privind implementarea contractului (organizarea santierului si a activitatii intregului personal din santier, atat persoanl tehnic cat si de executie, planificarea activitatilor si asigurarea resurselor tehnice , materale si de personal, etc), aferente unui contract de proiectare si executie. Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi **<u>mentine factorul de evaluare asa cum acesta</u>**

	a fost publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire.
Intrebare 80	***Având in vedere contextul epidemiei de coronavirus si a următoarelor, așa cum sunt acestea descrise mai jos:*** ***- faptul ca multe companii au luat masuri de adaptare la situația actuala, limitând activitatea si limitând deplasarea angajaților la sediul companiilor, in contextul accentuării răspândirii virusului COVID 19 si a creșterii accelerate a numărului zilnic de îmbolnăviri;*** ***- faptul ca angajații sunt obligați sa își ia concediu sau majoritatea dintre aceștia lucrează in regim de telemunca cu acces limitat la mijloacele IT, de comunicare, cu lipsa acces la mijloace de printare, plotare, facand dificila cooperarea in vederea elaborării documentelor aferente licitatiei sau se lucrează in schimburi cu program decalat pentru a limita interacțiunea angajaților si a păstra o distanta de siguranță intre aceștia;*** ***- având in vedere complexitatea si diversitatea serviciilor si lucrarilor ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, va rugam sa acceptați decalarea termenului de predare a ofertelor cu 3 saptamani, pentru a se putea elabora o oferta apta sa răspundă in totalitate cerințelor formulate de către Autoritatea Contractanta solicitate prin FDA;*** ***- tinând cont de faptul ca prezenta procedura de achiziție este una de tip proiectare si execuție;*** ***- modul de prezentare a propunerii tehnice, respectiv completarea Formularului impus prin Documentatia de atribuire si faptul ca inca de la faza de oferta va trebui prezentata o schita de proiect ce include atat parte scrisa cat si parte desenata, respectiv:*** ***pentru Lot 1*** ***Traseul in plan*** ***Descriere Structura rutiera*** ***Planse generale Lucrari de consolidare*** ***Descrierea umpluturilor din terasamente*** ***- modul de prezentare a propunerii financiare, respectiv, faptul ca operatorii economici vor trebui sa fundamenteze valoarea propunerii financiare, tinand cont de includerea tuturor cheltuielilor in valoarea ofertata, respectiv costurile proprii cu manopera pentru executie, consumurile proprii de materiale, manopera, utilaje si transport pentru lucrari, respectand prevederile caietul de sarcini si ale Documentatiei de atribuire*** ***- faptul ca Antreprenorul este responsabil avand in vedere faptul ca este un contract de tip proiectare si executie, sa cuantifice in oferta tehnica si financiara, absolut toate lucrarile prevazute, astfel incat sa fie cuantificate corect toate activitatile necesare realizarii obiectivului de investitii si pentru a putea oferta un pret real care sa includa toate cheltuielile (inclusiv teste, incercari, probe tehnologice) si orice alte cheltuieli necesare pe perioada de execuție si pana la recepția finala, informatii necesare in sustinerea fundamentarii pretului ofertat;*** ***– faptul ca pretul ofertei este criteriu de atribuire cu o pondere totala de 75% pentru Lot 1 si de 55% pentru Lot 2;*** ***- si având in vedere toate cele menționate anterior si ținând cont de complexitatea serviciilor si lucrarilor ce fac obiectul achiziției, va rugam sa aveți amabilitatea de a accepta o decalare de termen de 3 saptamani, avand in vedere si faptul ca lipsesc informatii de baza (de ex. proiectul de revizuire elaborat de Luca Way in 2015)si tinand cont de condițiile prezente ce ne obliga la luarea unor masuri ce restricționează desfășurarea unei activități normale si pentru a da posibilitatea tuturor potențialilor ofertanți la elaborarea ofertelor conform tuturor prevederilor din***

	FDA si posibilitatea Autorității Contractante de a respecta principiile de baza ale Legii achizițiilor publice 98/2016 in baza căreia a fost lansata procedura, respectiv: ***a) nediscriminarea;*** ***b) tratamentul egal;*** ***c) recunoașterea reciprocă;*** ***d) transparența;*** ***e) proporționalitatea;*** ***f) asumarea răspunderii.***
Raspuns 80	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 81	***Având in vedere ca in Documentele Beneficiarului, SF Search 2008, Vol. 3 Lucrari de poduri si expertize, vol. Pasaj peste centura in zona Str. Leordeni este gol, va rugam sa aveti amabilitatea de a pune la dispozitia potentialilor ofertanti planurile pentru pasajul respectiv.***
Raspuns 81	A se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare. Astfel, conform Aviz CTE din volumul *AVIZE Obtinute 2015-2016(actualizat 2018)* pasajul in cauza este prevazut la km 28+380, si prin urmare nu face obiectul procedurii de atribuire aferente prezentului Lot. Trecerea de la mediul rigid al podului la mediul elastic este asigurata prin [illegible] lungimea L=6.00m. **5) Pasaj peste Centura Bucuresti km 28+380 - drum de legatura cu DC13 (Leordeni)** *Situatia existenta* Intersectia dintre CB si DC13 - km 27+860, in amenajarea existenta se realizeaza in T, drum prioritar CB. Intersectia nu are amenjate benzi de virare la stanga, benzi sau pene de viraj la dreapta, marcaje orizontale corespunzatoare de dirijare a fluxurilor de trafic, iar semnalizarea verticala este necorespunzatoare cu normele in vigoare. Pe partea dreapta a CB este amplasata calea ferata. Legatura dintre CB si DC 13 se face printr-o trecere la nivel amenajata. 22
Intrebare 82	***In cadrul Documentelor Beneficiarului, Documente CB SUD A1 - DN 5, au fost puse la dispozitia potentialilor ofertanti, doar planurile de situatie, profile longitudinale si sectiuni transversale tip, in format needitabil aferente documentatiei din anul 2015 pentru „COMPLETAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU "LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A2 KM 23+600 SI A1 KM 55+520 SI AMENAJARE PUNCT DE INTOARCERE IN SOLUTIE GIRATORIE PE CB IN ZONA AUTOSTRAZII A1» elaborata de Luca Way SRL.*** ***Va rugam sa puneti la dispozitia potentialilor ofertanti, toata documentatia completa, incluzand detaliile pentru amenajarea intersectiilor si pentru lucrurile de arta, lucrari de consolidari si partea scrisa, in format editabil.*** ***Solicitam formatul editabil astfel incat sa se poata calcula listele de cantitati aferente licitatiei de proiectare si executie.***
Raspuns 82	Autoritatea Contractanta a pus la dispozitie in cadrul Documentelor Beneficiarului din Documentatia de atribuire publicata in SEAP toate documentele pe care acesta le detine, **in formatul in care acestea exista la dispozitia sa**.
Intrebare 83	***Va rugam sa aveti amabilitatea de a pune la dispozitia potentialilor ofertanti documentatia PT Arkadis 2009 intersectii,, in format editabil, astfel incat sa se poata calcula listele de cantitati aferente licitatiei de proiectare si executie.***

<table>
<tr><td>Raspuns 83</td><td>In vederea asigurarii tratamentului egal si a unei fundamentari cat mai bune a ofertelor tehnice si financiare Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor totalitatea datelor si documentelor pe care le detine.

Prin Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare s-a pus la dispozitia ofertantilor amenajarea intersectiilor, in formatul disponibil detinut de catre Autoritatea Contractanta.

Anexa nr.1 la prezenta Clarificare este disponibila (din motive de natura tehnica, avand in vedere dimensiunea mare a fisierelor atasate) prin accesarea urmatorului link: http://storage.cnadnr.ro/achizitii/ID1395/Anexe_la_Clarificarea_nr.2_Lot_1.zip</td></tr>
<tr><td>Intrebare 84</td><td>Având in vedere ca in Documentele Beneficiarului, se regasesc atat SF Search 2008, PT Arkadis 2009 intersectii, si extras din proiectul revizuit de Luca Way SRL in 2015, va rugam sa specificati care din aceste documentatii vor fi luate in considerare pentru calculul listelor de cantitati, astfel incat toti ofertantii sa ia in considerare aceleasi elemente de baza in vederea realizarii listelor de cantitati pentru elaborarea unor oferte financiare unitare.</td></tr>
<tr><td>Raspuns 84</td><td>Asa cum s-a precizat in Cerintele Beneficiarului PREAMBUL, la cap. 1.2. Studii existente, ofertantii au fost informati ca pentru acest obiectiv au fost realizate mai multe studii, atat Studiul de fezabilitate realizat in anul 2007 de catre proiectantul Search Corporation, revizuirea acestuia ca urmare a solutiilor incluse in Proiectele tehnice realizate de catre Antreprenori, cat si completarea Studiului de fezabilitate realizat de catre proiectantul LucaWay.

Ofertantii vor respecta cerintele prevazute in capitolul 9 Schita de proiect din Cerintele Beneficiarului</td></tr>
<tr><td>Intrebare 85</td><td>In urma studierii documentatiei am constatat ca volumul de munca este foarte mare raportat la timpul alocat pentru pregatirea concludenta a ofertelor. Va solicitatm sa decalati termenul de depunere cu minim 15 zile lucratoare.</td></tr>
<tr><td>Raspuns 85</td><td>Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.</td></tr>
<tr><td>Intrebare 86</td><td>Acordul Contractual Clauza 1 – Definițiilit. ww) [Sector de lucrări]

Conform Acordului Contractual, „Antreprenorul, de comun acord cu Beneficiarul sau Beneficiarul, de comun acord cu Antreprenorul, au posibilitatea definirii sectoarelor de lucrari fie in cadrul Proiectului pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire, fie in cadrul Proiectului Tehnic de Executie, fie in functie de stadiul achizitiei terenurilor necesare obtinerii Autorizatiei / Autorizatiilor de construire.”

Față de această definiție şi având în vedere numeroasele prevederi din condițiile generale care se referă la „sectorul / sectoarele de lucrări”, considerăm că sectoarele de lucrări ar trebui definite şi cunoscute anterior depunerii ofertei de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire.

În subsidiar, în măsura în care sectoarele de lucrări nu pot fi definite, solicităm eliminarea posibilității de definire a acestora în funcție de stadiul achiziției terenurilor necesare obținerii autorizației / autorizațiilor de construire, această operațiune nefiind sub controlul contractantului.</td></tr>
<tr><td>Raspuns 86</td><td>Introducerea acestei prevederi in clauzele contractuale are ca scop necesitatea asigurarii Autoritatii Contractante de realizarea cu celeritate a obiectivului contractului.

Prevederile art. 5.1 Clauza 1 litera ww) din Acordul Contractual, se modifica dupa cum urmeaza:

<table>
<tr><td>ww)</td><td>Sector de lucrări</td><td>Prezentul contract nu este împărțit pe Sectoare de lucrări</td></tr>
</table>
.</td></tr>
</table>

Intrebare 87	***Acordul Contractual Sub-clauza 36.4 [Valoarea penalităților de întârziere pentru fiecare zi de întârziere]*** ***Valoarea penalităților de întârziere pentru fiecare zi de întârziere care se scurge între finalul Duratei de Execuție după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție] și data efectivă de finalizare a lucrărilor menționată în Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor aprobat de către Beneficiar, este excesivă prin raportare la valoarea Contractului.*** ***Solicităm diminuarea cuantumului penalităților de întârziere sau aplicarea regulii din sub-clauza 36.4 din Condițiile Generale (i.e. valoarea penalităților de întârziere pentru fiecare zi de întârziere va fi egală cu Prețul Contractului (sau al Sectorului) la semnarea Contractului împărțit la Durata de Execuție la semnarea Contractului exprimată în zile. Suma maximă a penalităților de întârziere va fi de 15% din Prețul Contractului la semnarea Contractului.)***
Raspuns 87	A se vedea **Raspunsul 3** din prezenta Clarificare.
Intrebare 88	***Sume provizionate*** ***Vă rugăm să confirmați sau să clarificați, după caz, dacă sumele provizionate (rezerve de implementare) au fost incluse în valoarea estimată a Contractului.***
Raspuns 88	Valoarea estimata aferenta Lotului 1, in cuantum de **31.508.631,97 Lei fara TVA** include si valoarea aferenta rezervelor de implementare, in cuantum de **1.236.431,17 Lei fara TVA**. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora parte integranta din Acordul Contractual.
Intrebare 89	***Acordul ContractualSub-clauza 50.3 [Valori pentru obligații neîndeplinite sau nerespectate de către Antreprenor]*** ***În ceea ce priveşte penalităţile stabilite pentru:*** ***- nerespectarea prevederilor Sub-clauzei 27.2;*** ***- nerespectarea prevederilor Sub-clauzei 27.3;*** ***- înlocuirea Personalului cheie al Antreprenorului, exceptand situatiile prevazute la Sub-clauza 14.3 din Conditiile Generale de Contract;*** ***- netransmiterea Propunerii de prețuri unitare pentru fiecare cantitate din Proiectul Tehnic de Execuție precum și nedefalcarea acestor prețuri unitare conform Sub-clauzei 18.1,*** ***cuantumul acestora este excesiv prin raportare la valoarea Contractului şi la consecinţele încălcărilor. Solicităm diminuarea cuantumului acestor penalităţi astfel încât acestea să reflecte gravitatea încălcărilor, iar nu să reprezinte doar o modalitate de constrângere a contractantului de a-şi executa obligaţiile contractuale.***
Raspuns 89	A se vedea Raspunsurile nr. 8, 9, 10 si nr. 13 din prezenta Clarificare.
Intrebare 90	***Condiţiile Speciale Sub-clauza 5.1 [Sarcinile Supervizorului] lit. d)*** ***Conform sub-clauzei 5.1, lit. d) din Condiţiile Speciale, Supervizorul are ca sarcină principală, inter alia, verificarea, acceptarea sau respingerea Programului de Execuţie al Antreprenorului, inclusivv existenţa fizică a resurselor necesare îndeplinirii programului transmis.*** ***Solicităm completarea acestei prevederi după cum urmează:*** ***„d) verifică, acceptă sau respinge Programul de Execuţie al Antreprenorului, inclusiv existenţa fizică a resurselor necesare îndeplinirii programului transmis, în orice situaţie numai în situaţiile prevăzute expres de condiţiile contractuale în care Supervizorul are dreptul să respingă sau să solicite actualizarea/revizuirea***

	Programului de Execuţie".
Raspuns 90	Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.1. lit. d) din Condiţiile Speciale, intrucat aceasta clauza este identica cu Clauza 5.1 lit. c), prevazuta in cadrul Anexei nr. 2 la HG nr. 1/2018.
Intrebare 91	***Condiţiile Speciale Sub-clauza 10.1 [Responsabilitati privind Autorizatiile de Construire]*** ***Conform tezei finale a sub-clauzei 10.1 din Condiţiile Speciale, „Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii sarcinilor/obligaţiilor stabilite in prezenta sub-clauza."*** ***Având în vedere că eventualele neîndepliniri ale obligaţiilor Antreprenorului stabilite prin această sub-clauză pot fi externe acţiunii Antreprenorului, fără o culpă a acestuia, solicităm completarea după cum urmează:*** ***„Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii sarcinilor/obligaţiilor stabilite in prezenta sub-clauza, în măsura în care aceste neîndepliniri se datorează acţiunii/inacţiunii culpabile a Antreprenorului."***
Raspuns 91	In conformitate cu prevederile Documentatiei de atribuire, respectiv Sub-clauza 10.1 din Conditiile Speciale de Contract, Autoritatea contractanta a identificat activitati care intra in responsabilitatea Antreprenorului si vor trebui realizate de catre acesta. Orice cost rezultat se va include in pretul ofertei. Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Sub-clauzei 10.1 ultimul paragraf din Conditiile Speciale de Contract, intrucat aceasta clauza este identica cu prevederile Clauzei 10.1, lit. b) – teza finala, din Anexa nr. 2 la HG nr. 1/2018.
Intrebare 92	***Acordul Contractual Art. 5.3.*** ***Vă rugăm să clarificaţi până la ce nivel de detaliu vor fi identificaţi furnizorii şi valoarea prestaţiilor acestora, respectiv să indicaţi dacă se acceptă indicarea exclusiv a principalilor furnizori de materiale de construcţii.***
Raspuns 92	Antreprenorul trebuie sa respecte prevederile Legii nr. 76/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta nr. 55/2016. Mentionam totodata faptul ca, in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 5.1 alin. (2) lit. i) din Conditiile Speciale pentru Contract, Supervizorul are responsabilitati cu privire la **aprobarea DOAR a acelor furnizori de bunuri/materiale**, subcontractanti si prestatori de servicii ai activitatilor **care sunt in legatura directa cu executia lucrarilor.**
Intrebare 93	***In cadrul formularului 6 solicitati „dovada/dovezile care confera caracterul de confidentialitate al informatiilor din Propunerea Tehnica, elementelor din PROPUNEREA FINANCIARA si, daca este cazul, al fundamentarilor/ justificarilor preturilor/ costurilor transmise; in caz contrar informatiile mentionate in prezentul formular nu sunt considerate confidentiale."*** ***Va rugam sa ne comunicati ce trebuie sa contina aceasta dovada care trebuie sa fie anexa la oferta.***
Raspuns 93	art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 *Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost transmise de operatorii economici indicate și dovedite de aceștia ca fiind confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate*

	intelectuală. Caracterul confidențial se aplică doar asupra datelor/informațiilor indicate și dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală." **In conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 98/2016:** "*Operatorii economici* ***indică și dovedesc*** *în cuprinsul ofertei care informații din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost ca fiind confidențiale trebuie să fie* ***însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin****. (1)*." documentelele pe care operatorii economici le declară şi probează ca fiind confidenţiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice şi/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală. Dovezile pe care Ofertantii pot sa le prezinte raman la latitudinea acestora, atat timp cat documentele/informatiile prezentate sunt de natura sa confirme caracterul confidential al partilor din oferta declarate ca atare.
Intrebare 94	***Va rugam sa ne transmiteti profilele transversale si profilele transversale tip pentru parcare.***
Raspuns 94	A se vedea Anexa 1 la prezenta Clarificare, in cadrul careia se regaseste plansa "*Plan situatie- parcare-54.pdf*" precum si plansele din cadrul documentului "*Pl situatie Profile long.pdf*". Anexa nr.1 la prezenta Clarificare este disponibila (din motive de natura tehnica, avand in vedere dimensiunea mare a fisierelor atasate) prin accesarea urmatorului link: http://storage.cnadnr.ro/achizitii/ID1395/Anexe_la_Clarificarea_nr.2_Lot_1.zip
Intrebare 95	***Va rugam sa indicati unde se va transporta pamantul din sapatura, materialul rezultat din spargeri/desfaceri de beton si daca depozitarea, imprastierea implica costuri suplimentare.***
Raspuns 95	In Cerintele Beneficiarului, sectiunea 19.60 *Structura Şantierului* se precizeaza ca este responsabilitatea Antreprenorului depozitarea, eliminarea si gestionarea deseurilor. Astfel, locatia unde se va transporta pamantul din sapatura, materialul rezultat din spargeri/desfaceri de beton, ramane la latitudinea fiecarui ofertant, Autoritatea Contractanta neimpunand o anumita locatie, iar costurile de transport a pamantului din sapatura, materialului rezultat din spargeri/desfaceri de beton vor fi prinse in cadrul valorii din Propunerea Financiara.
Intrebare 96	***Va rugam sa ne comunicati daca groapa de imprumut va fi pusa la dispozitie de Beneficiar si daca da, la ce distanta se afla de amplasamentul lucrarii.***
Raspuns 96	In Cerintele Beneficiarului, sectiunea 19.60 Structura Şantierului subpunct 19.60.8. se precizeaza ca este responsabilitatea deplina a Antreprenorului pentru *identificarea, amenajarea şi eventuala readucere la nivelul şi condiţia stabilită a tuturor terenurilor necesare pentru gropi de împrumut, depunerea materialului excavat şi orice alt tip de lucrări temporare necesare pentru a se asigura că organizarea de şantier funcţionează la capacitatea optimă necesară pentru a sprijini atât organizarea de şantier cât şi implementarea contractului cu respectarea legislatiei specifice in domeniu*.
Intrebare 97	***Va rugam sa ne transmiteti studiul Geotehnic ce a stat la baza elaborarii documentatiei.***
Raspuns 97	Studiul geotehnic este parte a expertizei tehnice realizate DE SC EXPERT PROIECT 2000

	SRL, pus la dispozitie prin Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare.
Intrebare 98	***Va rugam sa ne transmiteti studiul geo.***
Raspuns 98	A se vedea Raspunsul nr. 97 din prezenta Clarificare.
Intrebare 99	***Va rugam sa eliminati cerinta:*** 4. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind componenta de arheologie in ceea ce priveste identificarea siturilor arheologice si a zonelor cu potential arheologic; ***Din cadrul Graficului de esalonare Calendaristica Gantt.***
Raspuns 99	Conform punctului 6.2.4 - *Caracteristici imperative privind cercetarea arheologica* din Cerintele Beneficiarului: *În condiţiile unor descoperiri excepţionale/situri arheologice care nu se pot evita, se vor elabora fie soluţii tehnice de proiectare care să le afecteze cât mai puţin, fie soluţii de protejare/conservare.* Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine cerinta din cadrul Formularului nr. 4.
Intrebare 100	***Referitor la Contract. Va rugam sa clarificati daca perioada de construire cuprinde lunile de iarna in care executia lucrarilor este sistata. In ceea ce priveste termenul de executie de 10 luni va rugam sa confirmati ca acesta se refera strict la perioada de executie a lucrarilor, iar pentru perioada de iarna se va emite ordin de sistare si reincepere a lucrarilor.***
Raspuns 100	Conform cap. 1 *PREAMBUL,* paragraful 1.3 *Descrierea lucrarilor [...]* din Cerintele Beneficiarului:. ***Durata de executie este de 10 luni***. Mentionam faptul ca Durata de executie de 10 luni include si perioada de timp friguros/de iarna. Lucrarile vor respecta prevederile reglementarilor in vigoare privind Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii.
Intrebare 101	***Va rugam sa eliminati cerinta***: • Ofertantul va prezenta informaţii referitoare la momentele din procesul tehnologic de execuţie a lucrărilor când va intenţiona să utilizeze aceste echipamente şi va justifica propunerea sa tinand cont si de puterea si capacitatea echipamentelor necesare pentru execuţia corespunzătoare a lucrărilor in timpul alocat executiei acestora. ***tinand cont ca aceste informatii se vor regasii atat in graficul Gantt cat si in Metodologie***.
Raspuns 101	Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta. Va rugam sa aveti in vedere si prevederile din Instructiunile catre Ofertanti, sectiunea IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice, unde se face urmatoarea mentiune: *Pentru fiecare lot in parte, ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea Tehnica astfel incat sa corespundacerintelor minime prevazute in Cerintele Beneficiarului din cadrul Documentatiei de Atribuire. respectand cel putin continutul minim indicat in Formularul nr. 4 A/, respectiv 4B "Propunerea Tehnica", respectiv:* *I. Programul de lucrari;* *II. Modalitatea de realizare a contractului* *[Ofertantii vor avea in vedere ca pentru obtinerea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza perioada de garantie a lucrarilor suplimentar ofertata, acestia trebuie sa includa in Propunerea Tehnica materialele si tehnologiile pe care Ofertantul le va utiliza in vederea asigurarii calitatii lucrarii pe intreaga perioada de garantie ofertata. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modul in care planul de management al calitatii va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si al proceselor de lucru, prin prezentarea abordarii generale si modalitatii de realizarea activitatilor din cadrul contractului (proiectarea si executarea lucrarilor), inclusiv prin descrierea detaliata a metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrarilor si a materialelor pe care le va pune in opera, astfel incat ofertarea unei garantii extinse a lucrarilor sa nu se faca doar la nivel declarativ in vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare. Neprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza perioada de garantie a lucrarilor suplimentar ofertata.]*

	III. Schita de proiect; *IV. Planul de Calitate al Proiectului [Ofertantii vor avea in vedere si observatiile de la pct. II de mai sus];* *V. Organizarea de santier si surse de materiale;* *VI. Echipamente/ instalatii/ utilaje la dispozitia ofertantului pentru executarea contractului;* *VII. Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului;* *VIII. Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014;* *IX. Orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii Propunerii Tehnice raportat la Cerintele Beneficiarului.*
Intrebare 102	***Va rugam sa permiteti inlocuirea topografului de categorie A sau D cu un topograf de categorie B***
Raspuns 102	Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta din Cerintele Beneficiarului si anume: *Topograf - Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea Tehnica, modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile expertului. Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului, la solicitarea acestuia:* *i. numele expertului desemnat in aceasta pozitie,* *ii. autorizatia pentru categoria A sau D conform Ordinului ANCPI nr. 10712010 pentru* *aprobarea Regulamentului din 29 martie 2010 privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romiiniei.* *Autorizatia va fi valabila la data prezentarii acesteia.;,* **intrucat Topograful autorizat categoria B nu realizeaza aceleasi activitati ca cel categoria A sau D.**
Intrebare 103	***Va rugam sa ne transmiteti Formularele in format editabil.***
Raspuns 103	A se vedea Raspunsul nr. 54 din prezenta Clarificare
Intrebare 104	***Va rugam sa mentionati care sunt domneniile obligatorii ale RTE-ului.***
Raspuns 104	**Conform Cerintelor Beneficiarului:** *Responsabil tehnic cu executia* Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea Tehnica, momentul in care expertul va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia. Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului, la solicitarea acestuia: numele expertului desemnat in aceasta pozitie, atestarea tehnico-profesionala in conformitate cu prevederile Legii nr. l0/1995 privind calitatea in constructii, sau echivalent. Aceasta va fi valabila la data prezentarii acesteia. ***Responsabilitati, enuntate neexhaustiv:*** a) Admite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati; b) Verifica si avizeaza fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de realizare a constructiilor; c) Intocmeste si tine la zi un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le

	coordoneaza tehnic si de care raspunde; d) Asigura respectarea riguroasa a tehnologiilor de executie, fiind responsabil de implementarea acestora; e) Controleaza calitatea lucrarilor pentru asigurarea prevederilor din documentatiile tehnice. f) Opreste executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie si permite reluarea lucrarilor numai dupa remedierea acestora. g) Va asigura o buna com uni care cu Beneficiarul/ Autoritatea Contractanta si cu Managerul de proiect, in toate circumstantele legate de implementarea contractului; h) Solicitarea de asistenta tehnica si implementarea solutiilor tehnice in cazul aparitiei unor situatii neprevazute; i) Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele instructate de Beneficiar/ Supervizor si de Managerul de proiect in realizarea acestui proiect in confonnitate cu prevederile legale in domeniul constructiilor. **Prin urmare, domeniile de autorizare pentru RTE vor fi corespunzatoare tipurilor lucrărilor de construcții realizate in cadrul contractului.**
Intrebare 105	***Va rugam sa eliminati cerinta:*** ***Tinand cont ca nu se vor executa lucrari de poduri pe acest lot.*** 6.2.2 **Caracteristici imperative de proiectare structurala** Proiectarea va avea ca referinta Eurocodurile, Normele si Standardele in vigoare conform sub-clauzei 12.7 din Conditiile Generale. Toate Cerintele Beneficiarului sunt obligatorii. In mod suplimentar, cerintele obligatorii de proiectare a structurilor sunt: - Se vor pastra lungimea si numarul deschiderilor, tipul suprastructurilor si schema statica. - Toate podurile vor avea panta longitudinală şi transversală pentru a asigura scurgerea adecvată a apelor pluviale. - Tasările din spatele culeilor podurilor/pasajelor/viaductelor, a dalelor de racordare a podurilor trebuie să fie limitate la maxim 25 mm. Orice tasare în exces care apare înainte de Perioada de Notificare a Defectiunilor trebuie reparată pe cheltuiala Antreprenorului. Aceasta cheltuiala nu va reprezenta un cost solicitat Beneficiarului si va fi considerata ca inclusa in Valoarea de contract acceptata. - Placile de racordare ale podurilor cu terasamentele se pot realiza monolit sau prefabricat si vor avea lungimea de minim 6 m. Compactarea in zona rampelor trebuie sa fie de 100% (Proctor/Proctor modificat)
Raspuns 105	Desi la nivelul Studiului de fezabilitate, care are caracter ilustrativ, nu sunt prevazute lucrari de poduri pentru acest lot, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. Prin urmare, Autoritatea Contractantă îşi menţine cerinţele menţionate la 6.2.2 *Caracteristici imperative de proiectare structurala* din Cerintele Beneficiarului, intrucat contin inclusiv prevederi referitoare la gabaritul de libera trecere.
Intrebare 106	***Va rugam sa eliminati cerinta:*** 6.2.5 **Caracteristici imperative privind masurile de mediu** Prestatorul va fi responsabil de revizuirea actului de reglementare emis de catre autoritatea competenta privind protectia mediului ori de cate ori este necesar, la aparitia oricaror modificari ale proiectului sau alte modificari/actualizari legislative, astfel incat solutiile prevazute in proiect sa se regaseasca in cadrul actului de reglementare in domeniul protectiei mediului. Antreprenorul va intocmi proiectul tehnic corelat cu cerintele din actul de reglementare in domeniul protectiei mediului emis de autoritatea de mediu competenta.
Raspuns 106	Autoritatea Contractantă îşi menţine cerinţele menţionate la 6.2.5 *Caracteristici*

	imperative privind masurile de mediu din Cerintele Beneficiarului, intrucat activitatile privind masurile de mediu sunt prinse atat in Formularul E1 – *MODALITATEA DE PLATA - GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR* si in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 – *Propunere financiara* la punctul 2.2 - *Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala*, precum si in contract.
Intrebare 107	***Va rugam sa eliminati cerinta:*** 6.2.4 **Caracteristici imperative privind cercetarea arheologica** Antreprenorul va realiza investigaţii arheologice în conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti în vigoare, privind aprobarea procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică, folosind instituţii legal abilitate în realizarea de cercetări arheologice. Antreprenorul va realiza supravegherea arheologică pe toată durata lucrărilor ce presupun intervenţii în sol. Cercetarea arheologică se va derula corespunzător recomandărilor din avizul emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. Antreprenorul are obligaţia ca la data începerii lucrărilor de execuţie să înştiinţeze Direcţiile Judeţene pentru Cultură şi să încheie un contract cu o instituţie legal abilitată conform Ordinului 2562/2010, art. 1, alin. (1), (2), modificat şi completat prin Ordinul 2178/2010, pentru a asigura prezenţa personalului de specialitate în teren pentru supravegherea lucrărilor de execuţie care presupun intervenţii în sol. Dacă este cazul, se vor elabora lunar rapoarte de supraveghere arheologică care vor fi transmise către Beneficiar. C.N.A.I.R S.A. îşi rezervă dreptul de a recupera de la Antreprenor orice prejudicii care vor fi generate de întârzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratării cercetării arheologice, de nerespectarea obligaţiilor, conform Cerinţelor Beneficiarului şi a legislaţiei în vigoare. În condiţiile unor descoperiri excepţionale/situri arheologice care nu se pot evita, se vor elabora fie soluţii tehnice de proiectare care să le afecteze cât mai puţin, fie soluţii de protejare/conservare.
Raspuns 107	Autoritatea Contractantă îşi menţine cerinţele menţionate la 6.2.4 *Caracteristici imperative privind cercetarea arheologica* din Cerintele Beneficiarului, intrucat activitatile privind cercetarea arheologica sunt prinse atat in Formularul E1 – *MODALITATEA DE PLATA - GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR* si in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 – *Propunere financiara* la punctul 3.2 - *Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica*, precum si in contract.
Intrebare 108	***Va rugam sa eliminati pct. 6.2.2 din cerinte Beneficiar Lot 1 deoarece fac referiri la poduri.***
Raspuns 108	A se vedea Raspunsul la Intrebarea nr. 105 din prezenta Clarificare.
Intrebare 109	***Va rugam sa eliminati cerinta:*** **DREPTUL DE A LUCRA ÎN ZONA CĂII FERATE** **19.102** Antreprenorul va încheia acorduri cu autorităţile feroviare în ceea ce priveşte dreptul de acces în zona căii ferate, conform cerinţelor privind lucrările în zona căii ferate, si va obtine totalitatea avizelor/autorizatiilor necesare executiei lucrarilor in zona caii ferate. De asemenea, Antreprenorul va avea obligatia incheierii procesului verbal de predare-primire amplasament cu autoritatile feroviare (daca va fi cazul) in scopul executiei lucrarilor. Acestea se vor realiza pe cheltuiala Antreprenorului. **19.103** Antreprenorul va furniza Supervizorului detalii complete despre cerinţele sale cu privire la dreptul de a lucra în zona căilor ferate din timp pentru a permite Supervizorului să analizeze propunerile.
Raspuns 109	Autoritatea Contractantă îşi menţine cerinţele menţionate la *Dreptul de a lucra in zona caii ferate* punctele 19.102 si 19.103 din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 110	***Va rugam sa eliminati cerinta*:** **INVESTIGAŢII ARHEOLOGICE** ***19.130 Prezentare generală*** Amplasamentul obiectivului de infrastructură rutieră necesită investigaţii arheologice. Acestea trebuie să se conformeze legislaţiei române de patrimoniu în vigoare. Se va realiza supravegherea arheologică de specialitate pe toate zonele afectate de lucrările de execuţie care presupun intervenţii în sol (inclusiv organizări de şantier, gropi de împrumut etc., dacă
Raspuns 110	A se vedea Raspunsul la Intrebarea nr. 107 din prezenta Clarificare. Prin urmare, Autoritatea Contractantă îşi menţine cerinţele menţionate la

	INVESTIGATII ARHEOLOGIGE punctul 19.130 *Prezentare generala* din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 111	***Va rugam sa eliminati cerinta:*** este cazul) Pentru realizarea investigaţiilor arheologice, Antreprenorul va trebui sa ţină cont de legislaţia în domeniu: Legea nr. 378/2001 (legea de adoptare de către Parlament a O.G. nr. 43/2000), Legea nr. 422/2001, Legea nr. 462/2003, Legea nr. 258/2006, O.M.C.C. nr. 2071/2000, O.M.C.C. nr. 2392/2004, OMCPN nr. 2562/4.10.2010 şi OMCPN 2178/17.03.2011. Antreprenorul respectă prevederile legislaţiei române în vigoare referitoare la cercetarea arheologică (cu etapele definite în OG 43/2000 republicată şi în Ordinul Ministrului Culturii nr. 2392/2004 şi prevederile Ordinului Ministrului Culturii 2562/2010 privind aprobarea procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică) utilizând entităţi abilitate. Antreprenorul va obţine toate aprobările/avizele necesare. Costurile de realizare a cercetării arheologice, cât şi alte costuri, riscuri şi responsabilităţi aferente investigaţiilor şi obţinerii sunt incluse în suma prevăzută de către Antreprenor pentru această activitate. Preţul ofertei include riscurile prezentate mai jos, iar Antreprenorul nu va avea nicio pretenţie de orice natură (materială, financiară etc.), în cazul apariţiei acestora. Beneficiarul a identificat riscurile pe care le aduce la cunoştinţa Antreprenorului, în prezentele Cerinte ale Beneficiarului. Antreprenorul îşi va asuma riscurile identificate de Beneficiar prin participarea sa la procedura de atribuire şi prin semnarea contractului şi nu va avea nicio pretenţie în cazul apariţiei acestora sau a altora neidentificate mai jos, dar posibil să apară.
Raspuns 111	A se vedea Raspunsul la Intrebarea nr. 107 din prezenta Clarificare. Prin urmare, Autoritatea Contractantă îşi menţine cerinţele menţionate la INVESTIGATII ARHEOLOGIGE punctul 19.130 *Prezentare generala* din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 112	***Va rugam sa eliminati pct. 9.3 din cerinte Beneficiar Lot 1 deoarece fac referiri la poduri.***
Raspuns 112	Autoritatea Contractantă **elimina punctul 9.3** din cadrul cap. 9 – Schita de proiect din Cerintele Beneficiarului: *9.3 Tabel cu lungimea podurilor cu precizari la nivel de solutii constructive infrastructura si suprastructura.* In vederea corelarii informatiilor la nivelul intregii documentatii de atribuire, in cadrul Formularului nr. 4A, in cadrul cap. III – Schita de proiect, paragraful: *Pentru fiecare dintre punctele de mai sus, vor fi prezentate toate informatiile/documentele solicitate in capitolul 11 din Cerintele Beneficiarului, la nivelul de detaliu indicat la sub-punctele 11.2-11.7.* **se modifica dupa cum urmeaza:** *Pentru fiecare dintre punctele de mai sus, vor fi prezentate toate informatiile/documentele solicitate in capitolul 9 din Cerintele Beneficiarului, la nivelul de detaliu indicat la sub-punctele 9.2-9.7.*
Intrebare 113	***Conform studiului de fezabilitate intocmit in 2008 debitul afluent este propus a fi deversat in canalul Arges. Analizand situatia din teren canalul Argeş a fost identificat la - 2.7km fata de cel mai apropiat punct al lucrărilor propuse prin proiect. Totodata in urma vizitei in teren s-a identificat canalizarea existenta care are cota radier la 1.5m si este in mare parte colmatata.*** ***Va solicitam sa ne comunicaţi soluţia luata in considerare la faza SF pentru evacuarea apelor pluviale.***
Raspuns 113	Solutia pentru evacuarea apelor pluviale luata in considerare la SF este descrisa in Memoriul tehnic privind sensul giratoriu.

	II.2.2 Scurgerea apelor Proiectul se elaboreaza pe baza studiului de fezabilitate intocmit de SC ECOTERA SRL Bucuresti. Colectarea si evacuarea apelor meteorice se face gravitational pe tronsonul km 54+502 – 55+520 si evacuarea acestora in canalul Arges (amplasat pe pe sectorul A1-DN7) dupa o pealabila preepurare pentru retinerea hidrocarburilor. Acest sistem este alcatuit din 2 tronsoane diferite. Primul tronson cuprins intre km 54+502 – km 55+520 avand o lungime de 971m si al 2-lea tronson care reprezinta segmentul cuprins intre km 55+520 si punctul de descarcare in canalul Arges, avand o lungime de 750m. Apele meteorice sunt colectate astfel: Colectare rigola la margine bordura 55m PAFSIN Dn 900mm 165m PAFSIN Dn 1000 mm 751m PAFSIN Dn 1000 mm (evacuare canal Arges) 750m Statia de prepurare are capacitatea de 600L/s
Intrebare 114	***Intre calea ferata si drum exista zidul de sprijin pe care urmeaza sa fie montat parapetul New Jersey. Având in vedere ca in expertiza tehnica nu se regăsesc informaţii despre acest zid va solicitam sa clarificaţi daca acesta se va demola si se va reface conform proiect sau se va menţine si reface pe zonele unde situatia o impune.*** ***Va solicitam sa puneţi la dispoziţie certificatul de urbanism emis pentru lucrare.***
Raspuns 114	Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor toate datele disponibile, in formatul in care acestea exista la dispozitia sa, in cadrul Documentelor Beneficiarului din Documentatia de atribuire publicata in SEAP. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. A se vedea Raspunsul nr. 38 din prezenta Calificare.
Intrebare 115	***Va solicitam sa puneţi la dispoziţie toate avizele si acordurile obtinute la faza SF chiar daca acestea au termenul de valabilitate expirat.***
Raspuns 115	In sprijinul dumneavoastra atasam Anexa nr.1 la prezenta Clarificare, care include si Folderul „***AVIZE Obtinute 2015-2016 (actualizat 2018)***” disponibila (din motive de natura tehnica, avand in vedere dimensiunea mare a fisierelor atasate) prin accesarea urmatorului link: http://storage.cnadnr.ro/achizitii/ID1395/Anexe_la_Clarificarea_nr.2_Lot_1.zip
Intrebare 116	***Va solicitam sa puneţi la dispoziţie expertiza tehnica aferenta lucrărilor.***
Raspuns 116	A se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare, care include si Folderul „***Expertiza***”, disponibila (din motive de natura tehnica, avand in vedere dimensiunea mare a fisierelor atasate) prin accesarea urmatorului link: http://storage.cnadnr.ro/achizitii/ID1395/Anexe_la_Clarificarea_nr.2_Lot_1.zip
Intrebare 117	***In vederea intocmirii schiţei de proiect va solicitam sa ne puneţi la dispoziţie documentaţia in format electronic .dwg cat si limitele de proiect (culoarul expropriat).***
Raspuns 117	A se vedea Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare *Plan coridor expropriere_Centura Bucuresti-DN5-A1.dwg* Autoritatea Contractanta a pus la dispozitie in cadrul Documentelor Beneficiarului din Documentatia de atribuire publicata in SEAP toate documentele pe care acesta le detine, in formatul in care acestea exista la dispozitia sa.
Intrebare 118	***Va solicitam sa precizaţi nivelul minim de dotare pentru grupul social din cadrul parcarii Km 54+765.***
Raspuns 118	Dotarea parcarii este descrisa in cadrul Cerintelor Beneficiarului sectiunea *1.3.7. Amenajare parcare de lunga durata km 54+765*. Pentru realizarea acesteia se vor respecta prevederile legislatiei in vigoare, respectiv ORDINULUI nr. 1298 din 30 august

	2017 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind proiectarea şi dotarea parcărilor noi, a locurilor de oprire şi staţionare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localităţilor.
Intrebare 119	***In cadrul auditului de siguranţa rutiera se precizeaza ca in incinta parcarii de la km 54+765 se va executa o benzinărie Lukoil. In planurile de situatie puse la dispoziţie acest aspect nu este tratat.*** ***Va solicitam sa precizaţi daca planul de situatie pus la dispoziţie este in concordanta cu lucrările ce se vor oferta pentru execuţia parcarii de la km 54+765.***
Raspuns 119	In vederea asigurarii tratamentului egal si a unei fundamentari cat mai bune a ofertelor tehnice si financiare Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor totalitatea datelor si documentelor pe care le detine. Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Documentatiei Tehnice puse la dispozitie și documentatiei de atribuire. **Prin urmare, raportat la documentatia tehnica pusa la dispozitia operatorilor economici prin intermediul platformei electronice SICAP, nu este in sarcina viitorului Antreprenor realizarea de benzinarii ci, doar asigurarea accesului tuturor riveranilor, dupa caz.**
Intrebare 120	***Va rugam sa ne comunicaţi daca operatorii economici au obligaţia de a declara subcontractantii in vederea proiectării si execuţiei lucrărilor de deviere utilitati. In cazul in care trebuie declaraţi subcontractantii, va rugam sa ne comunicaţi tipurile de reţele ce se găsesc in amplasament si trebuie deviate/protejate.***
Raspuns 120	Cunoscand faptul ca Antreprenorul are obligatia de realiza, prin resurse proprii sau prin intermediul altor operatori economici, toate activitatile prevazute in Cerintele Beneficiarului si Documentatia tehnica, fiind obligatoriu ca prin Propunerea Tehnica sa se demonstreze modul de indeplinire a tuturor cerintelor si prezentarea metodologiei de prestare a serviciilor/ executare a lucrarilor in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, in situatia in care ofertantul nu are in obiectul sau de activitate astfel de servicii/ lucrari, nu detine autorizarile specifice necesare sau capacitatea de a le realiza, poate fie sa se asocieze cu un operator economic, fie sa subcontracteze aceste activitati catre un operator economic care are dreptul si capacitatea de a desfasura activitatile. Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui ofertant de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti operatori economici, a caror calitate este reglementata de legislatia in materia achizitiilor publice. De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor activitatilor, cuprinzand in Formularul de Propunere Financiara a acestuia sumele necesare indeplinirii obiectului contractului in integralitate. In situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului contractului este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii speciale, operatorii economici care vor presta/executa efectiv respectivele activitati/lucrari trebuie sa detina autorizatiile necesare. Va rugam sa aveti in vedere ca in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, precum si cu prevederile art. 179 lit. k) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor precizarea partii/ partilor din contract pe care ofertantul intentioneaza sa o/le subcontractaze. Potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. 51.yy), prin subcontractant se va intelege "orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop".

	De asemenea, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare: (1)Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv. Se vor avea in vedere, totodata, si prevederile art. 219 alin. (3) din Legea 98/2016, precum si prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului: (3)Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221, precum si prevederile: *Art. 150* *(2)În vederea determinării valorii creanţei, ofertantul are obligaţia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte.* *Art. 151* *Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii:* *a)înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi,* *b)declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora,* *c)renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică.* *Art. 156* *Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante.* *Art. 159* *În situaţia prevăzută la art. 151 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică în condiţiile art. 221 din Lege.* *Art. 160* *Situaţia prevăzută la art. 151 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum este aceasta definită la art. 221 din Lege, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:* *a)introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;* *b)introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre autoritatea contractantă şi contractant;* *c)introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică;* *d)prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al*

	obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi. Aceste dispozitii privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului, precum si prevederile relevante din contract, nu inlocuiesc /suplinesc obligatiile existente la momentul depunerii ofertelor, astfel cum acestea au fost prevazute in documentatia de atribuire. Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii cunosc ca, de exemplu, pentru activitatile de devieri/mutari/relocari/protejari retele de utilitati si instalatii este necesara o anumita autorizare, ofertantii au obligatia de a include aceste activitati atat in Propunerea tehnica, cat si in Propunerea financiara, si tinand cont de faptul ca potrivit legislatiei aplicabile, activitatile sus mentionate se realizeaza cu operatori specializati/ autorizati, ofertantii vor declara in DUAE subcontractantii desemnati pentru aceste activitati numai in situatia in care Antreprenorul nu detine autorizarile necesare pentru a realiza el insusi aceste activitati. Totodata, mentionam ca Autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile art. 151 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, privind inlocuirea/ implicarea subcontractantilor in perioada de implementare a contractului, in situatia in care se indeplinesc conditiile specifice prevazute la art. 152-162 din acelasi act normativ.
Intrebare 121	***Va solicitam sa puneţi la dispoziţie Studiul de Fezabilitate realizat de SC LUCA WAY SRL integral, cu indicatorii aprobaţi, inclusiv listele de cantitati in format editabil .xls.***
Raspuns 121	Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. In sprijinul dumneavoastra atasam Anexa nr.1 la prezenta Clarificare, care include si Arhiva „***1. Compl SF Luca Way.rar***", disponibila (din motive de natura tehnica, avand in vedere dimensiunea mare a fisierelor atasate) prin accesarea urmatorului link: http://storage.cnadnr.ro/achizitii/ID1395/Anexe_la_Clarificarea_nr.2_Lot_1.zip In acest sens, va rugam sa consultati, *folderul denumit 1. Compl SF Luca Way.rar* Astfel, in vederea asigurarii tratamentului egal si a unei fundamentari cat mai bune a ofertelor tehnice si financiare Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor totalitatea datelor si documentelor pe care le detine. Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Documentatiei Tehnice puse la dispozitie și documentatiei de atribuire. Asa cum este precizat in Cerintele Beneficiarului, sectiunea **1.1. Studii existente**, indicatorii tehnico economici reavizuiti au fost aprobati prin **Hotărârea Guvernului nr. 1009/20.12.2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 344/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiții "Lărgire la 4 benzi - Centura București Sud între A2 (km 23+600) și A1 (km 55+520)"** , acestia au fost publicati MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 4 ianuarie 2019.
Intrebare 122	***In Caietul de sarcini cap.6.1.2.5.4. tabel "Program de Proiectare" se precizeaza : "Verificare de catre Verificatori autorizati contractati de Beneficiar conform Clauzei 19.2 din Conditii Speciale"*** ***Cerinta este clara !*** ***La Clauza 19.2 din Conditii Speciale se precizeaza : "Antreprenorul va transmite Supervizorului si Beneficiarului documentatia aferenta proiectului , verificata de verificatori autorizati contractati de Antreprenor".....“Intra in sarcina Antreprenorului angajarea/ contractarea tuturor verificatorilor autorizati" (repetare pentru o cat mai buna intelegere !)*** ***Cerinta, desi incalca legislatia in vigoare, este la fel de clara !***

	Ce nu este clar si va rugam sa clarificati este in sarcina cui doreste totusi Autoritatea contractanta sa fie contractarea verificatorilor de proiecte si mai ales de ce la aproape fiecare documentatie a Autoritatii contractante ofertantii sunt confruntati cu aceeasi confuzie si ilegalitate (in cazul contractarii verificatorilor de catre Antreprenor). Va rugam de asemenea insistent sa nu mai repetati si sa nu mai promovati "opinia" MDRAP cu privire la verificatorii de proiecte pentru ca este un "rebut" din punct de vedere juridic. Conventia intre Parti devine "lege a Partilor" (care este un sablon lingvistic, nu un izvor de drept) numai daca este incheiata legal, adica daca nu incalca LEGEA. In caz contrar clauza in cauza este NULA si, mai mult, poate atrage nulitatea intregului Contract.(Cod Civil, art. 1255).
Raspuns 122	A se vedea Raspunsul la Intrebarea nr. 52 din prezenta Clarificare.
Intrebare 123	***Termenele stabilite pentru raspunsul la clarificari dovedesc ceea ce s-a mai semnalat si anume ca autoritatea contractanta nu numai ca nu pune niciun prêt nici pe termene, nici pe raspunsuri, dar le si stabileste exact in scopul de a nu raspunde niciodata la primul termen.*** ***40 de zile inainte de data depunerii (primul termen) inseamna cca. 2 saptamani (10 zile lucratoare) de la publicarea anuntului, adica max. 4-5 zile (restul pentru raspuns!) termen neserios si care nu merita comentat, pentru a putea parcurge o documentatie complexa, invariabil stufoasa si de mult prea multe ori confuza.*** ***Chiar in cazul in care sunt solicitate clarificari in acest termen, autoritate contractanta si-a rezervat dreptul de a raspunde si la acestea tot la al doilea termen.*** ***In concluzie, raspunsurile la clarificari, element de mare importanta in desfasurarea procedurilor de achizitie sunt tratate astfel:*** ***a/ un prim termen de raspunsuri neserios si ca atare inutil;*** ***b/ o perioada care acopera cea mai mare parte a termenului de depunere a ofertelor, lipsita de elemente adeseori esentiale de intocmire a ofertelor;*** ***c/ un aflux de raspunsuri denumit pompos si pretios, dar cam in afara intelesului "raspuns consolidat", insumand in unele cazuri SUTE de raspunsuri , publicat de regula nu cu 20 zile inainte de data depunerii ci adesea chiar in ziua depunerii.*** ***Consecinta, invariabil si inevitabil, suspendarea procedurii, solutie care nici macar nu are temei legal.*** ***Va rugam sa clarificati cum intelege autoritatea contractanta, ca un calendar si o desfasurare ca cele prezentate mai sus pot asigura:*** ***a/ conditii normale pentru operatorii economici in pregatirea si prezentarea ofertelor*** ***b/ respectarea dreptului de a depune contestatii, sau macar de a replica, in cazurile frecvente in care raspunsurile la clarificari (care sunt parte a documentatiei de atribuire) reprezinta in sine abuzuri si incalcarea legislatiei*** ***b/ evitarea intarzierilor in desfasurarea procedurilor***
Raspuns 123	Autoritatea Contractanta a stablit un termen adecvat si suficient pentru pregatirea ofertelor raportat la complexitatea contractului, fiind asigurata o perioada de 54 de zile de la data publicarii Anuntului de Participare si pana la data depunerii ofertelor. De asemenea, va rugam sa aveti in vedere ca in cadrul prezentei proceduri, ofertele se depun exclusiv on-line prin intermediul platformei SICAP, asa cum a fost de altfel mentionat in cadrul Documentatiei de atribuire (conform prevederilor legale in vigoare - Legea nr. 98/ 2016 cu modificarile si completarile ulterioare si HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare). Astfel, tinand cont de momentul publicarii Documentatiei de atribuire, va rugam sa aveti in vedere ca a fost asigurata o perioada mai mult decat suficienta pentru studierea aprofundata si temeinica a lucrarii ce urmeaza a fi realizata, precum si pentru elaborarea ofertelor. c) Ulterior obtinerii Avizului neconditionat din partea ANAP dar anterior publicarii Raspunsului la solicitarile de clarificare, Autoritatea Contractanta procedeaza la

	stabilirea unui nou termen de deschidere a ofertelor prin crearea unui Anunt de tip "Erata", tinand cont de gradul de complexitate al raspunsului, astfel incat sa fie respectate atat prevederile legale in vigoare cat si prevederile Instructiunilor catre Ofertanti referitoare la cel de-al doilea termen de publicare a raspunsului consolidat la clarificari. Referitor la **al doilea termen**, exista o practica in randul ofertantilor, **care inainte cu 2-3 zile de expirarea celui de-al doilea termen**, transmit un numar **mare de clarificari**, de ordinul zecilor. De fiecare data cand a fost o astfel de situatie, **elaborarea raspunsului consolidat a fost intarziata din cauza volumului mare si a** **complexitatii solicitarilor de clarificare si a obligativitatii Autoritatii Contractante de a raspunde la toate clarificarile depuse.** In ceea ce priveste modalitatea de a raspunde ofertantilor prin "**Raspuns Consolidat"**, acesta este definit conform normelor ANAP fiind introdus pentru a se evita situatia in care Autoritatea Contractanta trebuie sa raspunda individual fiecarei solicitari de clarificare, situatie care poate conduce la numeroase contestatii. Astfel conform prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016 si a prevederilor H.G. nr. 395/2016, Autoritatea Contractanta a stabilit unul sau maxim 2 termene de publicare a Raspunsurilor Consolidate. In acelasi timp, aceasta modalitate de a raspunde ofertantilor, creeaza premizele optimizarii timpului de derulare a procedurii de achizitie publica, prin evitarea eventualelor contestatii pentru fiecare act emis de Autoritatea Contractanta, asa cum exista in trecut aceasta practica. Intotdeauna ulterior verificarii de catre ANAP a *"Raspunsului Consolidat*" si a validarii acestuia (moment in care raspunsul consolidat este automat publicat in SEAP) Autoritatea Contractanta a decalat termenul limita pentru depunerea ofertelor (de regula cu minim 2 - 3 saptamani), astfel incat sa acorde posibilitatea operatorilor economici de a analiza toate informatiile publicate si de a-si elabora ofertele in conformitate cu Raspunsul consolidat si cu specificatiile prevazute in Instructiunile catre Ofertanti. Referitor la decalarea termenului limita pentru depunerea ofertelor, odata cu publicarea Raspunsului Consolidat, Autoritatea Contractanta **transmite spre publicare in acelasi timp si Erata de decalare termen depunere oferte**. Aceasta erata, din punct de vedere al circuitului de publicare, are un parcurs independent de Raspunsul consolidat, termenul de publicare efectiva a acesteia fiind mai lung cu circa 5 – 7 zile, intrucat este necesara publicarea si validarea acesteia in cadrul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (JOUE). Prin urmare noul termen de depunere a ofertelor devine vizibil ulterior momentului publicarii Raspunsului consolidat la solicitarile de clarificare.
Intrebare 124	***Va rugam sa decalati data de depunere a ofertelor cu cel putin 60 de zile lucratoare, tinand cont de volumul mare de lucru si complexitatea lucrarii.***
Raspuns 124	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 125	***Va rugam sa ne puneti la dispozitie plansele din care au rezultat lungimile specificate in Cerintele Beneficiarului.***
Raspuns 125	In vederea asigurarii tratamentului egal si a unei fundamentari cat mai bune a ofertelor tehnice si financiare Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor totalitatea datelor si documentelor pe care le detine. A se vedea Raspunsul nr. 38 la prezenta Clarificare.
Intrebare 126	***Avand in vedere ca in Documentatiile puse la dispozitie, solutiile de realizare a lucrarilor de arta sunt prezentate doar in directorul "Vol.3. Lucrari poduri si expertize" aferente proiectului realizat de catre Search Corporation in 2008, iar solutiile tehnice pentru Centura Bucuresti Sud au fost radical modificate prin proiectele realizate ulterior de catre ARCADIS in 2009, precum si de LUKAWAY in 2015, va rugam sa ne puneti la dispozitie planurile pentru realizarea lucrarilor de***

	arta in concordanta cu ultimele modificari si solutii. ***Acestea ne sunt necesare in vederea evaluarii corecte a unei solutii unitare, a ofertarii acelorasi liste de cantitati de lucrari corecte, de catre toti participantii la licitatie.***
Raspuns 126	Asa cum s-a precizat in Cerintele Beneficiarului PREAMBUL, la cap. 1.2. *Studii existente*, ofertantii au fost informati ca pentru acest obiectiv au fost realizate mai multe studii, atat Studiul de fezabilitate realizat in anul 2007 de catre proiectantul Search Corporation, revizuirea acestuia ca urmare a solutiilor incluse in Proiectele tehnice realizate de catre Antreprenori, cat si completarea Studiului de fezabilitate realizat de catre proiectantul LucaWay. Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor toate datele si documentele pe care le detine, inclusiv documentatia intocmita anterior. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. In sprijinul dumneavoastra anexam Anexa nr.1 la prezenta Clarificare. Anexa nr.1 la prezenta Clarificare este disponibila (din motive de natura tehnica, avand in vedere dimensiunea mare a fisierelor atasate) prin accesarea urmatorului link: http://storage.cnadnr.ro/achizitii/ID1395/Anexe_la_Clarificarea_nr.2_Lot_1.zip
Intrebare 127	***Avand in vedere complexitatea documentatiei ce trebuie pregatita in vederea depunerii ofertelor precum si situatia actuala mondiala generata de pandemia COVID-19, va rugam sa prelungiti termenul de depunere al ofertelor cu o perioada de minim 20 zile.***
Raspuns 127	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 128	***Ref Cerintele beneficiarului – 7. CERINTE PRIVIND PERSONALUL SI UTILAJELE*** ***7.1 Cerinte privind personalul implicat pentru LOT 1 Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre Al (km 55+520) si km 54+700 inclusiv parcarea de lunga durata de la km 54+765*** ***PERSONAL CHEIE EXECUTIE*** ***Sef de santier*** ***Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea Tehnica, modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile expertului. Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului, la solicitarea acestuia:*** ***i. numele expertului desemnat in aceasta pozitie,*** ***ii. Diploma de Inginer al unei Facultati/Universitati in domeniul constructiilor, specializarea drumuri si/sau poduri sau similar;*** ***iii. CV-ul si documentele justificative care sa ateste experienta profesionala intr-un contract de executie lucrari de constructie noua si/sau largire si/sau reabilitare si/sau modemizare de autostrazi si/sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres.*** ***Va solicitam sa acceptati indeplinirea cerintei privind Experienta profesionala detinuta de Seful de santier si prin participarea acestuia in cadrul unor contracte de executie lucrari privind lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare la nivel de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi si/sau drumuri judetene.***
Raspuns 128	In Cerintele Beneficiarului, Cap. 7.1, Sectiunea PERSONAL CHEIE EXECUTIE,

	pentru Sef de santier, punctul iii. *iii. CV-ul si documentele justificative care sa ateste experienta profesionala intr-un contract de executie lucrari de constructie noua si/sau largire si/sau reabilitare si/sau modernizare de autostrazi si/sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres*. **se modifica dupa cum urmeaza:** *iii. CV-ul si documentele justificative care sa ateste experienta profesionala intr-un contract de executie lucrari de constructie noua si/sau largire si/sau reabilitare si/sau modernizare de autostrazi si/sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/sau drumuri judetene.*
Intrebare 129	***Va repostam solicitarea: „In urma studierii documentatiei am constatat ca volumul de munca este foarte mare raportat la timpul alocat pentru pregatirea concludenta a ofertelor. Va solicitatm sa decalati termenul de depunere cu minim 15 zile lucratoare"***
Raspuns 129	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 130	***In cadrul documentatiei puse la dispozitie sunt mentionate treceri la nivel peste CF industriale. In urma vizitei pe teren, s-au identificat ca acestea sunt dezafectate.*** ***Va rugam sa clarificati necesitatea includerii acestora in listele de cantitati.***
Raspuns 130	In cadrul Documentatiei de Atribuire a fost publicat Studiul de Fezabilitate, precum si toata documentatia tehnica relevanta detinuta de Beneficiar pentru realizarea Proiectului, astfel incat orice operator economic are posibilitatea sa analizeze in detaliu, inca de la acest moment, toate aspectele de natura tehnica, si sa sesizeze, totodata, ca urmare a acestei analize si a vizitei in Santier, eventualele erori/ greseli/neconcorante inca din procesul de elaborare a ofertei si oricum anterior realizarii documentatiei de proiectare, creeaza premisele pentru un Antreprenor diligent sa elaboreze o documentatie de proiectare corecta, din moment ce posibilitatea de notificare si corectare a erorilor este anterioara realizarii PAC/PTE. Studiul de Fezabilitate reprezintă Documentaţia tehnica la un nivel de exigenta cantitativa si calitativa minima acceptata de către Beneficiar. Pagina 9, unde faceti trimitere, face parte din descrierea lucrarilor cuprinse in Studiul de fezabilitate. Atragem atentia, totodata, asupra prevederilor din Conditiile Generale de Contract Clauza 8.1 Cerinţele Beneficiarului sunt documentul elaborat de Beneficiar care prezintă cerinţele esenţiale aferente Lucrărilor. Cerinţele Beneficiarului includ, fără a se limita la: (a) tema de proiectare şi caracteristicile imperative ale Lucrărilor inclusiv criterii de performanţă, (b) studiul de fezabilitate (cu titlu informativ), (c) standardele si normativele aplicabile, (d) Teste la Terminarea Lucrărilor, (e) teste care se efectuează în Perioada de Garanţie, (f) cerinţele privind manuale de operare şi întreţinere, (g) cerinţele privind instruirea Personalului Beneficiarului, şi (h) orice alte cerinţe ale Beneficiarului, potrivit prevederilor Condiţiilor Contractuale. sub-clauzele 19.1 si 19.6: 19.1 Antreprenorul va proiecta Lucrările Permanente în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului şi cu Oferta tehnică. Antreprenorul va fi răspunzător de proiectul elaborat. Antreprenorul va îndeplini rolul de proiectant în conformitate cu prevederile Legii, inclusiv cu privire la stabilirea testelor de efectuat, stabilirea fazelor determinante şi

	asigurarea asistenţei tehnice din partea proiectantului în conformitate cu prevederile Legii. Prin urmare, **<u>intocmirea listelor de cantitati reprezinta responsabilitatea si cad in sarcina viitorului Antreprenor care va detine si calitatea de proiectant</u>**. Suplimentar, mentionam faptul ca, **<u>stabilirea necesitatii amenajarii trecerilor la nivel peste CF industriale va rezulta din avizele obtinute de catre viitorul Antreprenor</u>**.
Intrebare 131	***Va rugam sa ne puneti la dispozitie solutia tehnica de colectare, transport si epurare a apelor pluviale (separatoare), inclusiv a punctelor de deversare si descarcare.***
Raspuns 131	In vederea asigurarii tratamentului egal si a unei fundamentari cat mai bune a ofertelor tehnice si financiare Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor totalitatea datelor si documentelor pe care le detine. In cadrul Formularului de Propunere financiara, sunt cuantificate activitatile privind utilitatile, atat Devieri/mutari/relocari/protejari a celor existente (ref. 3.1. Utilitati), cat si a celor ce se vor executa (ref 9.3. Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor) Colectarea, transportul si epurarea apelor pluviale se va face cu respectarea cap. 1.3.5. Colectarea si evacuarea apelor pluviale din cadrul Cerintelor Beneficiarului: *Apele de pe platforma drumului vor fi colectate in reteaua de canalizare pluviala prin guri de scurgere amplasate in afara partii carosabile.* *Reteaua principala de canalizare se va realiza pe partea stanga, amplasarea acesteia se face sub trotuar.* *Pentru zonele de convertire (dever unic) se va amplasa rigola carosabila monobloc in zona mediana cu descarcarea acesteia incanalizarea amplasata pe partea stanga.* *Deversarea apelor colectate se face in emisari naturali in urma preepurarii acestora. Se estimează că încărcările cu poluanti în apele colectate de pe platforma centurii vor fi mai mari decât concentratiile maxim admisibileindicate în Normativele în vigoare (HG nr. 188 /2002 completată cu HG. nr.352/2005). În conditiile în care apele meteorice colectate de pe platforma drumului vor fi descărcate în emisari naturali, concentratiile de poluanti trebuie să fie inferioare limitelor prevazute în NTPA001 din 2002. Pentru reducerea concentratiilor de poluanti, au fost proiectate următoarele tipuri de lucrări aplicabile înainte de descărcarea în emisari naturali (cursuri de apă, văi): Bazine de sedimentare şi separatoare de grăsimi.* *Rolul bazinelor de sedimentare este de a asigura o decantare grosieră a particulelor în timp ce separatoarele de grăsimi au rolul de asepara prin flotatie grăsimile (substantele mai uşoare decât apa), sedimentând în acelaşi timp şi o parte din suspensiile coloidale.* *În cazul în care apele meteorice vor fi descărcate pe terenul înconjurător, epurarea se va realiza în bazine de sedimentare urmate deseparatoare de grăsimi iar apoi de bazine de dispersie.* *Rolul acestora este de a proteja terenurile înconjurătoare împotriva eroziunii.*
Intrebare 132	***Va rugam sa ne puneti la dispozitie planul de situatie cu retele edilitare existente***
Raspuns 132	Autoritatea Contractanta a pus la dispozitie in cadrul Documentelor Beneficiarului din Documentatia de atribuire publicata in SEAP toate documentele pe care acesta le detine. **A se vedea si** Anexa nr.1 la prezenta Clarificare, disponibila (din motive de natura tehnica, avand in vedere dimensiunea mare a fisierelor atasate) prin accesarea urmatorului link: http://storage.cnadnr.ro/achizitii/ID1395/Anexe_la_Clarificarea_nr.2_Lot_1.zip
Intrebare 133	***Va rugam sa ne puneti la dispozitie avizele obtinute pana la momentul de fata.***
Raspuns 133	In sprijinul dumneavoastra atasam Anexa nr.1 la prezenta Clarificare, care include si

	Folderul „***AVIZE Obtinute 2015-2016 (actualizat 2018)***” disponibila (din motive de natura tehnica, avand in vedere dimensiunea mare a fisierelor atasate) prin accesarea urmatorului link: http://storage.cnadnr.ro/achizitii/ID1395/Anexe_la_Clarificarea_nr.2_Lot_1.zip
Intrebare 134	***Va rugam sa ne puneti la dispozitie limita de expropiere a lucrarilor proiectate si stadiul lucrarilor de expropiere.***
Raspuns 134	A se vedea Raspunsul nr. 66 din prezenta Clarificare.
Intrebare 135	***In documentul Cerintele Beneficiarului, cap. 6.1.2.5. Programul de proiectare se prevede: "Verificarea de către Verificatori autorizați contractați de Beneficiar conform Clauzei 19.2 din Condițiile Speciale", iar la Clauza19.2 din Condițiile Speciale de precizeaza "Intră în sarcina Antreprenorului angajarea/ contractarea tuturor verificatorilor autorizați". Va rugam clarificati.***
Raspuns 135	A se vedea Raspunsul la Intrebarea nr. 52 din prezenta Clarificare.
Intrebare 136	***Va rugam sa clarificati daca Beneficiarul lucrarii pune la dispozitie terenul cuprins in limita de expropiere liber de sarcini, sau lucrarile de demolare vor intra in sarcina Antreprenorului.*** ***In aceasta situatie, va rugam sa ne puneti la dispozitie toate datele necesare lucrarilor de demolare in vederea unei evaluari corecte.***
Raspuns 136	Activitatile privind demolarea constructiilor existente sunt in sarcina Antreprenorului, inclusiv intocmirea documentatiilor si obtinerea autorizatiilor prevazute in lege. Acestea intra in categoria lucrarilor de preconstructie, din cadrul activitatilor de amenajarea terenului.
Intrebare 137	***Buna ziua, conform ultimilor clarificari venite la lotul 1, dorim sa stim daca procedura se va tine luni 24.05.2021 si pt lotul 1***
Raspuns 137	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
