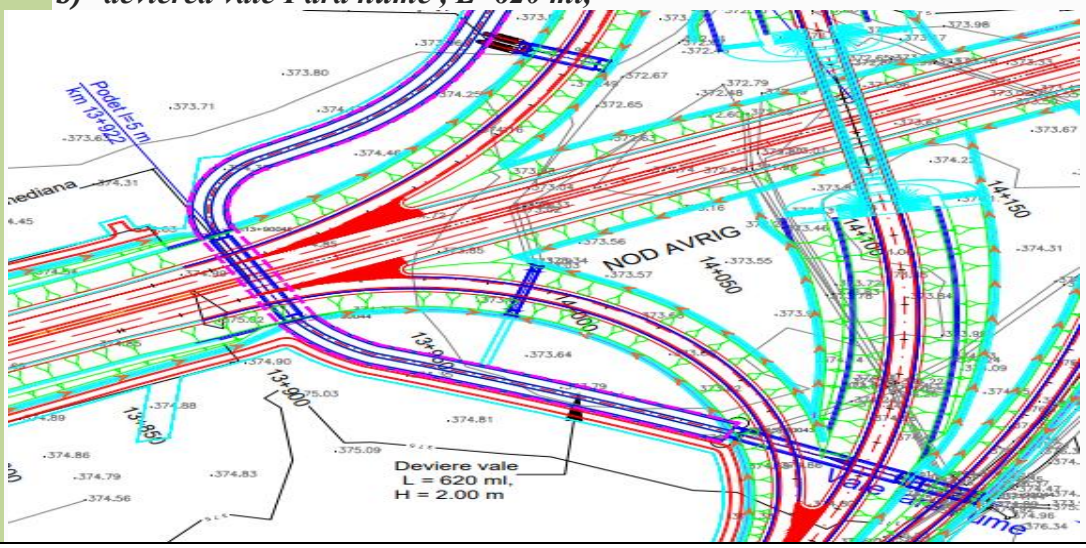
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro, registratura.cnair@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
www.erovinieta.ro

Clarificarea nr. 2 la documentatia de atribuire

PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Fagaras, Tronsonul 2: km 14+253 – 34+175, Avrig-Marsa (DJ105G) – Arpasu de Jos (DN1)"

Numar de referinta: 16054368/2022/3325/S/10

Intrebare 1	***Va rugam sa confirmați ca nu sunt parte din prezentul contract:*** ***a) podețul de la km 13+922*** ***b) devierea vale Fără nume , L=620 ml,*** 
Raspuns 1	Autoritatea Contractanta precizeaza urmatoarele: • Devierea Vale fara nume L=60 ml din zona km 13+922 nu intra in scopul contractului „*Proiectare si executie Autostrada Sibiu – Fagaras Tronson 2 km 14+253 – 34+175*" • Podetul de la km 13+922 nu intra in scopul contractului „*Proiectare si executie Autostrada Sibiu – Fagaras Tronson 2 km 14+253 – 34+175*"
Intrebare 2	***Cat priveste Durata de Executie, Clauza 1 - [Definitii], litera s) din Acordul Contractual prevede ca aceasta va fi de 48 de luni, reprezentand:*** ***„- 12 luni - durata activitatii de proiectare care incepe de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare [...]*** ***- 36 luni – durata executiei lucrarilor care incepe de la Data de Incepere a Lucrarilor [...]" (subl. ns.)*** ***Conform Sub-Clauzei 1.1 litera n) coroborata cu prevederile Sub-Clauzei 33.1 din Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie de Lucrari (Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare) („Conditiile Generale"), Data de Incepere este data notificata de Supervizor (o singura data), prin Ordinul***

	Administrativ de Incepere (care este un document unic), comunicat catre Antreprenor in termen de 30 de zile de la semnarea Acordului Contractual. Conform Sub-Clauzei 33.2, Antreprenorul va incepe proiectarea si executia Lucrarilor cat mai curand posibil dupa Data de Incepere. ***Avand in vedere prevederile din Acordul Contractual reproduse mai sus, coroborate cu cele ale Sub-Clauzelor 1.1 litera n), 33.1 si 33.2 din Conditiile Generale, care prevad ca Data de Incepere este una singura – atat pentru activitatea de proiectare, cat si pentru cea de executie Lucrari si este comunicata printr-un unic Ordin Administrativ de Incepere, va rugam sa clarificati daca, in cadrul acestui proiect Data de Incepere a Lucrarilor va fi stabilita prin Programul de Referinta, cu conditia incadrarii in Durata de Executie de 48 luni.***
Raspuns 2	Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca, in conformitate cu prevederile Clauzei 33 - *Inceperea* din H.G. nr. 1/2018, ***cu modificarile si completarile ulterioare,*** in cadrul contractului de lucrari de proiectare si executie, legiuitorul a prevazut emiterea a 2 Ordine, respectiv: **Ordinul Administrativ de Incepere a Activitatii de <u>Proiectare</u>** si **Ordinul Administrativ de Incepere a <u>Executiei Lucrarilor</u>**: *„**33.1** În termen de 15 zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul va emite Ordinul Administrativ de Începere a Activităţii de Proiectare către Antreprenor cu notificarea Datei de Începere a Activităţii de Proiectare.* ***33.2** Supervizorul va trimite Antreprenorului Ordinul Administrativ de Începere a Execuţiei Lucrărilor numai în condiţiile în care a fost finalizat Proiectul Tehnic de Execuţie şi au fost obţinute Autorizaţiile de Construire. Supervizorul va stabili în cadrul Ordinului Administrativ de Începere a Execuţiei Lucrărilor Data de Începere a Lucrărilor, dată care nu va depăşi 30 de zile de la momentul transmiterii Ordinului Administrativ de Începere a Execuţiei Lucrărilor. Ordinul Administrativ de Începere a Execuţiei Lucrărilor poate fi emis şi pe Secţiuni/Sectoare.* ***33.3** Antreprenorul va începe execuţia Lucrărilor la Data de începere a Lucrărilor şi va continua execuţia Lucrărilor cu promptitudine şi fără întârzieri.”* Asadar, rezulta, in mod explicit din textul de lege faptul ca, in cadrul contractului de proiectare si executie, se emit **2 Ordine** si **nu unul singur** astfel cum precizeaza operatorul economic in solicitarea de clarificare. Deasemenea, legiuitorul, in cadrul textului de lege anterior citat, prevede o **Data de Incepere a Activitatii de Proiectare** si o **Data de Incepere a Lucrarilor**, deci nu *una singura*, astfel cum precizeaza operatorul economic. Astfel, fata de solicitarea de clarificare conform careia *„[...] in cadrul acestui proiect Data de Incepere a Lucrarilor va fi stabilita prin Programul de Referinta, cu conditia incadrarii in Durata de Executie de 48 luni”* precizam ca Data de incepere a Lucrarilor va fi stabilita in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 33.2 din H.G. nr. 1/2018, ***cu modificarile si completarile ulterioare.***
Intrebare 3	***Cu referire la Durata de Executie de 48 de luni specificata mai sus, care include si 36 de luni pentru executia Lucrarilor „sub conditia obtinerii Autorizatiei/Autorizatiilor de Construire”, rezulta ca Autorizatia/Autorizatiile de Construire trebuie obtinute in termen de 12 luni de la Data de Incepere – va rugam sa clarificati si acest aspect.***
Raspuns 3	Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca, in conformitate cu prevederile Art. 5.1 lit. s) *Durata de Executie* din Acordul contractual: *„[...] 12 luni - durata activitatii de proiectare care incepe de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare si care include aprobarea de catre Beneficiar a Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie, precum si obtinerea Proiectului pentru Autorizatia de Construire;”.* Totodata, consideram necesar a se avea in vedere si prevederile Art. 5.1 - Sub-Clauza 19.3 b) Termen de obtinere a Autorizatie de Construire, din Acordul Contractual, astfel

	cum a fost modificat prin Clarificarea nr. 1 la documentatia de atribuire, conform carora: *„6 luni de la Data de Începere a activitatii de proiectare (pentru Sector/Sectoare de lucrari, daca este cazul) pentru transmiterea Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC/DTAC) la Supervizor* *si* *60 de zile de la data aprobarii de catre Supervizor a Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC/DTAC) pentru obținerea Autorizației de Construire."* Prin urmare, in durata de 12 luni aferenta activitatii de proiectare este asigurata obtinerea Proiectului pentru Autorizatia de Construire, precum si Autorizatia de Construire, asa cum este prevazut in H.G. nr. 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
Intrebare 4	***Cu privire la definitia Sectorului de Lucrari cuprinsa in Clauza 1 – [Definitii], litera ww) din Acordul Contractual, conform careia:*** ***„Suplimentar fata de Sectoarele 1 – 2 de mai sus", Partile, de comun acord, „au posibilitatea definirii si a altor sectoare de lucrari, fie in cadrul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de construire, fie in cadrul Proiectului Tehnic de Executie, fie in functie de stadiul achizitiei terenurilor necesare obtinerii Autorizatiei/Autorizatiilor de Construire."*** ***invederam faptul ca impartirea Lucrarilor pe Sectoare, indiferent ca are loc prin intermediul Proiectului Tehnic sau in functie de stadiul achizitiei terenurilor, va trebui sa tina cont de o limitare esentiala, respectiv de data limita pentru obtinerea Autorizatiei/Autorizatiilor de Construire – care, in intelegerea noastra, asa cum am indicat la intrebarea nr. 2 de mai sus, nu poate depasi 12 luni de la Data de Incepere. Va rugam sa ne confirmati ca impartirea Lucrarilor pe Sectoare va avea loc astfel incat Autorizatia de Construire finala si completa, pentru intregul proiect, sa fie obtinuta in maxim 12 luni de la Data de Incepere.***
Raspuns 4	Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca viitorul Antreprenor are obligatia realizarii activitatii de proiectare pentru intreg proiectul, inclusiv impartirea pe Sectoare, in cele 12 luni aferente activitatii de proiectare, asa cum este mentionat in Art. 5.1 Sub-clauza 1 ww) din Acordul contractual.
Intrebare 5	***Cu referire la prevederile Sub-Clauzei 9.1 [Termene si sectoare pentru punerea la dispoziție a Santierului] din Conditiile Speciale, conform carora Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia Antreprenorului in termen de maxim 13 luni de la „Data de Incepere a Activitatii de Proiectare", coroborate cu cele ale Clauza 1 – [Definitii], litera ww) din Acordul Contractual, va rugam sa ne confirmati faptul ca termenele limita de acordare a accesului pe Santier pe Sectoare:*** ***a) nu pot depasi 12 luni de la Data de Incepere (Acordul Contractual prevaland fata de Conditiile Speciale, conform ordinii de prioritate a documentelor contractuale din Art. 2 al Acordului Contractual);*** ***b) nu vor avea un impact asupra posibilitatii Antreprenorului de a pregati documentatia completa si a Beneficiarului de a obtine Autorizatia/Autorizatiile de Construire in termen de 12 luni de la Data de Incepere;*** ***c) in niciun caz nu pot depasi timpul necesar/ durata stabilita prin Programul de Referinta (care are la baza Programul de la Oferta) pentru realizarea activitatilor preliminare necesar a fi realizate anterior emiterii Autorizatiei/Autorizatiilor de Construire.***


Raspuns 5	Fata de solicitarea de clarificarea a operatorului economic de la literele a), b) si c), Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca Accesul pe Santier se va realiza in maxim 13 luni de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare, asa cum este prevazut in cadrul Sub-Clauzei 9.1 din Conditiile Speciale.
Intrebare 6	***Nota atasata Punctului de Referinta nr. 5 prevede dupa cum urmeaza:*** ***„** Nota: Punctul de Referinta nr. 5 se aplica fie pentru toate Lucrarile, fie in baza prevederilor Clauzei 1 – Definitii, litera ww) – Sectoare de Lucrari din Acordul Contractual, pentru fiecare Sector in parte. Astfel, in conditiile in care Beneficiarul acorda Antreprenorului Dreptul de acces pe Santier si punerea in posesia acestuia, etapizat, pe Sectoare astfel incat sa poata fi demarate lucrarile de executie pentru un Sector sau pentru mai multe Sectoare, indicatorii din cadrul Punctului de referinta nr.5 se aplica in mod corespunzator, fiecarui Sector in parte”.*** ***Punctul de Referinta nr. 5 se situeaza la 14 luni de la Data de Incepere si, prin referirea pe care o face la impartirea pe Sectoare a Lucrarilor, pare ca sugereaza ca este posibila depasirea termenului de 14 luni de la Data de Incepere, fara atragerea vreunei penalitati contractuale pentru Beneficiar, daca Beneficiarul nu ii acorda Antreprenorului accesul pe Sectorul respectiv inauntrul celor 12 luni de la Data de Incepere.*** ***Va rugam sa clarificati cum se coreleaza aceste prevederi cu cele din Clauza 1 – [Definitii], litera s) din Acordul Contractual, care prevad ca Durata de Eexecutie va fi de 48 de luni (dintre care 12 luni pentru proiectare si 36 de luni pentru executia lucrarilor), in cazul in care Antreprenorul nu primeste in timp util accesul pe Sectoarele de Santier pentru a se putea incadra cu indeplinirea activitatilor din punctul de referinta nr. 5 inauntrul celor 14 luni de la Data de Incepere prevazute contractual, caz in care Durata de Executie a Contractului va depasi cele 48 de luni cu un termen care nu poate cuantificat la acest moment.***
Raspuns 6	Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca, in situatia in care, Antreprenorul finalizeaza activitatea privind Documentatia Tehnica pentru Autorizatia de Construire in termenele stabilite, atunci Autoritatea contractanta va acorda Accesul pe santier, in termenul prevazut in Sub-Clauza 9.1 din Conditiile Speciale. Acest termen nu poate depasi 13 luni de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare. Mentionam de asemenea faptul ca, Autoritatea contractanta va actiona cu diligenta, astfel incat sa fie respectate termenele contractuale anterior mentionate.
Intrebare 7	***Acordul Contractual contine prevederi contradictorii cat priveste ajustarea sumelor platite Antreprenorului din Rezervele de Implementare:*** ***a) Sub-Clauza 48.3 [Ajustarea Sumelor Provizionate/rezervelor de Implementare] din Acordul Contractual prevede: „Beneficiarul va efectua ajustare la lucrarile executate sau serviciile prestate care vor fi suportate din Rezervele de Implementare”;*** ***b) Art. 5.10, care contine Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare, prevede la Capitolul V, litera C.1, Nota 2 si Nota 3: „Lucrarile/serviciile finantate din rezervele de implementare fac obiectul unor actualizari/indexari/ajustari ale preturilor”; „pretul acestor lucrari/servicii se va ajusta conform formulei de ajustare stabilita la Sub-Clauza 48.3 din Acordul Contractual [...]”;*** ***c) Art. 5.10, care contine Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare, prevede la Capitolul V, litera D faptul ca: „Nu se va aplica indexarea/actualizarea/ajustarea preturilor pentru categoriile de lucrari/servicii finantate din rezervele de implementare”.***

	Avand in vedere inadvertentele din Acordul Contractual semnalate mai sus, va rugam sa confirmati ca sumele platite Antreprenorului pentru lucrarile/serviciile finantate din Rezervele de Implementare vor fi ajustate conform formulei de ajustare stabilita in Sub-Clauza 48.3 din Acordul Contractual
Raspuns 7	Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca prevederile Art. 5.10 din Acordul Contractual au fost modificate prin **Clarificarea nr. 1 la documentatia de atribuire** (Clarifiare din oficiu 1 - II. Cu privire la Modelul de Contract - pct 3, 4, 7), astfel incat este absolut necesar ca operatorii economici interesati sa depuna oferta sa aiba in vedere atat prevederile documentatiei de atribuire, cat si modificarile aduse acesteia prin Clarificarea nr. 1.
Intrebare 8	***Acordul Contractual contine inadvertențe cat priveste situatiile in care Contractul poate fi modificat fara organizarea unei noi proceduri de atribuire:*** ***Conform Sub-Clauzei 48.8 [Revizuirea Valorii Contractului ca urmare a modificarilor legislative publicate ulterior Datei de Referinta si/sau ca urmare a instituirii/modificarii/renuntarii la anumite taxe/impozite locale al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor] din Acordul Contractual, modificarea valorii Contractului se va realiza, printre altele, in baza prevederilor Art. 221 alin. (1) litera a) si/sau e) din Legea nr. 98/2016 (subl. ns.);*** ***Art. 5.4 din Acordul Contractual expliciteaza situatiile prevazute de Art. 221 alin. (1) litera a) din Legea nr. 98/2016, in care poate avea loc modificarea Contractului fara organizarea unei noi proceduri de atribuire;*** ***Art. 5.5 alin. (2) din Acordul Contractual prevede: „Contractul poate fi modificat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, si atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ conditiile prevederilor art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare", fara a mai mentiona posibilitatea modificarii Contractului in situatiile prevazute de Art. 221 alin. (1) litera e) din Legea nr. 98/2016.*** ***Avand in vedere inadvertentele din Acordul Contractual semnalate mai sus, va rugam sa confirmati ca modificarea Contractului poate surveni fara organizarea unei noi proceduri de atribuire in toate cazurile prevazute de Art. 221 alin. (1) literele a), e) si f) din Legea nr. 98/2016.***
Raspuns 8	Autoritatea contractanta subliniaza faptul ca situatiile care pot conduce la modificarea Acordului Contractual, prevazute in cadrul acestui document **nu constituie *inadvertente,*** ci **sunt in conformitate cu prevederile Art. 221 din Legea nr. 98/2016**, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, eventualele modificari contractuale care se incadreaza in prevederile Art. 221 alin. (1) lit. a) si f) se trateaza conform prevederilor legale. Eventualele modificari contractuale care se incadreaza in prevederile Art. 221 alin. (1) lit. e) trebuie sa fie nesubstantiale, indiferent de tipul modificarii. Orice modificare contractuala care este substantiala va face obiectul organizarii unei noi proceduri de atribuire.
Intrebare 9	***Va rugam sa clarificati situatiile in care, conform prevederilor Art. 5.5 alin. (5) din Acordul Contractual:*** ***„Clauzele de revizuire/modificarile contractuale nu vor aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in Contract", atata vreme cat respectivele modificari/revizuiri ale Contractului se inscriu in limitele modificarilor/revizuirilor agreate de Parti prin Contract, respectiv sunt in limitele legii.***

Raspuns 9	Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca prevederile Art. 5.5 alin. (5) au in vedere situatiile care pot surveni in derularea contractului, rezultate din neexecutarea obligatiilor contractuale sau executarea acestora cu intarziere de catre Antreprenor, situatii care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale, fara a insemna, insa, ca Beneficiarul nu va aplica penalitati, in conformitate cu prevederile Acordului Contractual si ale Conditiilor de contract prevazute de H.G. nr. 1/2018 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest context, Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca penalitatile se aplica in functie de culpa Antreprenorului.
Intrebare 10	***Art. 5.14 din Acordul Contractual obliga Partile sa respecte prevederile Metodologiei privind inlocuirea Antreprenorului descrisa in continuarea respectivei clauze contractuale. Capitolul intitulat „IV.4 Motivele in care se poate recurge la inlocuirea Antreprenorului" indica printre acestea si urmatoarele situatii:*** • ***Litera f): „Modul de solutionare a revendicarilor stabileste culpa Antreprenorului".*** ***Avand in vedere ca:*** ***a) Nu exista notiunea de „mod de solutionare a revendicarilor" definita in Contract;*** ***b) Singura notiune mentionata si descrisa in capitolul din Contract intitulat „Solutionarea Litigiilor si Legea", respectiv in Clauza 69 [Revendicari si Decizii] si in Clauza 70 [Dispute si arbitraj] este „Decizia Supervizorului";*** ***c) Conform Sub-Clauzei 70.6 [Instantele de drept comun] din Acordul Contractual:*** ***„Exceptand cazurile in care disputele se solutioneaza pe cale amiabila, procesele si cererile care decurg din executarea contractului (implementarea, modificarea, interpretarea contractului), precum si cele care decurg din rezilierea, rezolutiunea, denuntare unilaterala sau incetarea anticipata a contractului se solutioneaza in prima instanta, de urgenta si cu precadere de catre sectia de contencios administrativ a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul Beneficiarului" – asadar Decizia Supervizorului nu este modalitatea finala de rezolvare a disputelor dintre parti, stabilirea in mod final a existentei culpei Antreprenorului fiind atributia instantelor de judecata mentionate mai sus,*** ***va rugam sa confirmati ca, in intelesul Art. 5.14, Capitolul IV.4, litera f), stabilirea culpei Antreprenorului va fi constatata doar prin decizia finala si irevocabila a instantelor de judecata competente sa rezolve disputele aparute din Contract.*** • ***Litera k): „Deficiente de proiectare si executie, pe care Antreprenorul nu e capabil sa le remedieze in termen de 90 de zile, si anume:*** ***[...]*** o ***Respingerea Proiectului Tehnic de 2 ori consecutiv [...]"*** ***Va rugam sa clarificati de catre cine se face respingerea mentionata mai sus.*** o ***„Antreprenorul a comis erori grave in Activitatea de Proiectare"*** ***Va rugam sa clarificați care sunt „erorile grave" in activitatea de proiectare avute in vedere in clauza reprodusa mai sus.*** o ***„Respingerea de 2 (doua) ori a avizarii Proiectului tehnic in CTE – CNAIR SA"*** o ***„Respingerea de 2 (doua) ori a Receptiei la terminarea lucrarilor".*** • ***Litera n): „Intarzieri semnificative in realizarea contractului care pot conduce la neincadrarea in perioada de finantare"*** o ***„Antreprenorul nu finalizeaza organizarea de santier in 90 de zile"*** o ***„Antreprenorul nu remediaza viciile/erorile de executie in termenul prevazut de Beneficiar in Notificarea de Remediere"*** ***Avand in vedere ca toate motivele de inlocuire a Antreprenorului mentionate mai sus, prevazute de literele k) si n) a Art. 5.14, Capitolul IV.4 nu exclud respingerea***

	in mod arbitrar de catre Beneficiar a documentelor de proiectare si/sau a efectuarii receptiei la terminarea lucrarilor sau in impunerea unor termene de remediere sau de organizare de santier nerezonabile, constituindu-se astfel in veritabile dispute care se solutioneaza in mod definitiv doar de catre instantele de judecata competente, va solicitam eliminarea lor din lista motivelor prevazute in Acordul Contractual pentru inlocuirea Antreprenorului.
Raspuns 10	Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca prevederile Art. 5.14 din Acordul Contractual au fost modificate prin **Clarificarea nr. 1 la documentatia de atribuire** (Clarifiare din oficiu 1 - II. Cu privire la Modelul de Contract pct. 8), astfel incat este absolut necesar ca operatorii economici interesati sa depuna oferta sa aiba in vedere atat prevederile documentatiei de atribuire, cat si modificarile aduse acesteia prin Clarificarea nr. 1. In acest context, cu titlu de exemplu, aratam faptul ca prevederile Art. 5.14 Capitolul IV.4 (devenit V.4) lit. f) din Acordul Contractual au fost eliminate. Cu privire la solicitarea de clarificare a operatorului economoc care vizeaza Art. 5.14 Cap. V.4 lit. k) din Acordul Contractual, respectiv *„de catre cine se face respingerea [...]”* precizam ca avizarea/aprobarea, respectiv respingerea documentelor emise de catre Antreprenor se vor realiza in conformitate cu Cerintele Beneficiarului de catre Supervizor si Autoritatea contractanta. Prin sintagma *„erori grave”* Autoritatea contractanta are in vedere erorile Antreprenorului cu impact important/semnificativ asupra Activitatii de proiectare. Cu privire la solicitarea de clarificare a operatorului economoc care vizeaza Art. 5.14 Cap. V.4 lit. k) din Acordul Contractual, reiteram necesitatea ca operatorii economici sa aiba in vedere nu doar documentatia de atribuire, ci si modificarile aduse acesteia prin Clarificarea nr. 1 la documentatia de atribuire. Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile documentatiei de atribuire, inclusiv cele stabilite prin Clarificarea nr. 1 publicata in 14.11.2022.
Intrebare 11	***Art. 5.14 din Acordul Contractual prevede la Capitolul VIII „Elemente ce pot fi modificate fata de contractul initial” in situatiile in care se poate inlocui Antreprenorul, dupa cum urmeaza:*** ***„Durata de executie a restului de realizat cu conditia sa se incadreze in perioada de programare”.*** ***Va rugam sa clarificati se inseamna „perioada de programare” mentionata mai sus.***
Raspuns 11	Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca *„perioada de programare”* face referire la fondurile necesare derularii contractului de lucrari, respectiv POIM, POT s.a.m.d., conform Contractelor de Finantare.
Intrebare 12	***Art.5.15 din Acordul Contractual prevede ca:*** ***„In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 101/2020, in cazul în care, în cadrul certificatelor de plată emise de către Supervizor există sume nerecunoscute la plată de către Beneficiar, Beneficiarul va solicita Supervizorului să refacă certificatele de plată, în baza măsurătorilor, cu includerea doar a acelor sume cuvenite, aferente lucrărilor executate şi recunoscute de Beneficiar.”*** ***Cata vreme O.U.G. nr. 101/2020 nu prevede criteriile in baza carora Beneficiarul poate sa refuze plata anumitor sume solicitate de Antreprenor pentru lucrarile executate si pentru a evita transformarea acestei clauze intr-un instrument de respingere abuziva a cererilor de plata inaintate de Antreprenor, va rugam sa clarificati care sunt aceste criterii.***
Raspuns 12	Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca prevederile Ordonanţa de urgenţă nr. 101/2020 *privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020* reglementeaza ca: *„Pentru obiectivele de investiţii din domeniul* ***infrastructurii publice de transport****, [...] finanţate din fonduri europene, denumite în continuare proiecte de infrastructură, care cuprind în structura devizului general de investiţii cheltuieli privind protecţia mediului, cheltuieli privind relocările de utilităţi, precum şi alte categorii de cheltuieli*

	*similare necesare pentru implementarea proiectelor, **care sunt independente de voinţa beneficiarului sau a executantului de lucrări sau care nu pot fi prevăzute cu exactitate la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică** sau a contractului sectorial, după caz, dar sunt **strict necesare** pentru implementarea proiectelor de infrastructură, beneficiarii/autorităţile/entităţile contractante pot include, odată cu iniţierea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz, **rezerve de implementare a proiectelor**, care fac parte din investiţia de bază, exprimate în procente din valoarea estimată a cheltuielilor pentru investiţia de bază sau în sume fixe, după caz."* Autoritatea contractanta precizeaza ca intotdeauna va actiona guveranat de principiul bunei credinte si nu va intarzia procesarea Cererilor de Plata ale Antreprenorului, intrucat scopul prezentei proceduri este reprezentat de finalizarea cu succes a obiectului contractului de lucrari, in durata contractului. Scopul Beneficiarului este acela de a atrage fonduri europene nerambursabile, de a plati lucrarile executate si receptionate si de a finaliza contractul prin atingerea obiectivului contractului. Autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea prevederii unor astfel de criterii intrucat modul in care se va derula implementarea contractului sau care sunt sumele pe care Antreprenorul le va prezenta spre decontare nu sunt cunoscute la momentul elaborarii documentatiei de atribuire.
Intrebare 13	***Conform Sub-Clauzei 5.1 [Sarcinile Supervizorului] din Conditiile Speciale, alin. (2) litera l), printre sarcinile principale ale Supervizorului se numara si urmatoarea: „masoara si certifica cantitatile de lucrari real executate".*** ***Avand in vedere ca aceasta modificare a sarcinilor Supervizorlui tinde sa transforme Contractul dintr-unul de proiectare si executie in unul exclusiv de executie si intra in contradictie cu Graficul de Esalonare a Platilor, care stabileste ca certificarea unui articol de lucrari se face in functie de procentul de lucrari executat, asadar in mod procentual, va solicitam sa eliminati formularea din Sub-Clauza 5.1 alin. (2) litera l) din Conditiile Speciale.***
Raspuns 13	Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca aceasta prevedere este stabilita prin Anexa 2 la H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, tot in acest context, in cadrul Conditiilor Generale de Contract, legiuitorul a prevazut, in cadrul mai multor Sub-clauze obligatii ale Antreprenorului care vizeaza „*cantitatile de lucrari real executate*". Cu titlu de exemplu, amintim Sub-clauzele 37.5 si 49.2: *„**37.5** Antreprenorul **este responsabil** pentru orice majorare sau reducere a unei **cantităţi de lucrări real executate** faţă de cele indicate în listele de cantităţi parte a Documentelor Antreprenorului, cu excepţia cazului în care o asemenea majorare sau reducere este cauzată de o Modificare. [...]"* *„**49.2** În scopul emiterii Certificatelor de Plată pe parcursul executării Contractului până la aprobarea Recepţiei la Terminarea tuturor Lucrărilor, Supervizorul va evalua valoarea contractuală a Lucrărilor executate (inclusiv Documentele Antreprenorului produse) la momentul respectiv în conformitate cu metoda prevăzută în Graficul de Eşalonare a Plăţilor. De asemenea, Supervizorul va folosi o metodă alternativă de evaluare a părţilor din Lucrările Permanente executate la acel moment (inclusiv Documentele Antreprenorului), folosind listele de cantităţi din Documentele Antreprenorului, **măsurarea acestor cantităţi real executate** şi preţurile unitare transmise de către Antreprenor potrivit prevederilor clauzei 18 [Structura detaliată a preţului] sau alte preţuri unitare relevante, cum ar fi preţuri de piaţă. Dacă aplicarea strictă a metodei prevăzute în Graficul de Eşalonare a Plăţilor ar cauza ca valoarea contractuală a Lucrărilor executate să fie semnificativ mai mari decât valoarea părţilor din Lucrările Permanente executate la acel moment, valoare stabilită de către Supervizor în conformitate cu*

	metoda alternativă prevăzută mai sus, Supervizorul va fi îndreptăţit ***să reţină temporar această diferenţă din Certificatul aferent de Plată****, transmiţând Antreprenorului detaliile justificative."* Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea contractanta mentine prevederile Sub-Clauzei 5.1 din Conditiile Speciale de Contract.
Intrebare 14	***Va rugam sa clarificați daca canal (ANIF), zona km 25+900 – 26+500, va fi dezafectat sau daca prin documentația de licitație, au fost stabilite soliții de relocare.*** 
Raspuns 14	Canalul ANIF din zona km 25+900 – 26+500 va fi dezafectat pe lungimea pe care se suprapune cu traseul Autostrazii Sibiu – Fagaras.
Intrebare 15	***Cu referire la Autostrada Sectiunea 3, Documentele Beneficiarului/Vol.5-Activitati de proiectare/Volum 5.3 - Lucrari de poduri, pag. 107/107, exista un pod la Victoria Junction km 0+620. Cu toate acestea, în „Formulare, pag. 70/79, Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7" acest pod nu este listat la Item 9 Categorie de lucrari: Lucrari de Poduri, Pasaje, Viaducte. Vă rugăm să clarificați în ce articol li se solicită ofertanților să stabilească prețul podului la 0+620.***
Raspuns 15	Aceasta clarificare nu are aplicabilitate in cadrul TRONSONULUI 2 km 14+253 – km 34+175 Avrig-Marsa (DJ105G) si Arpasu de Jos (DN1).
Intrebare 16	***Referitor la documentelor de licitație \Documentele Beneficiarului\Vol.6 - Evaluare impact asupra mediului\EA , Autostrada SibiuFagaras _ EA Rev 2 _ 2021.12.14, page 127/491,*** ***Există 4 Organizații de șantier propuse pentru proiectul Autostrazii Sibiu-Făgăraș at km 14+400, km 33+600, km 45+600, 67+100 km autostrada [1+350 (km drum de legatura)]. Vă rugăm să confirmați că aceste zone vor fi puse la dispoziție Contractorului gratuit.***
Raspuns 16	Amplasamentul Organizarii de santier nu va fi pus la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit. Antreprenorul trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a terenului afectat. Obtinerea autorizatiei pentru Organizarea de santier este in sarcina viitorului Antreprenor.
Intrebare 17	***Cu referire la documentele de licitatie Acord contractual P&Ex Sibiu Fagaras, CLAUZA 16 - Responsabilități și Asigurări,*** ***În ceea ce privește discuțiile noastre cu brokerii de asigurări, am fost informați că limita poliței de asigurare pentru design profesional (până la %10 din prețul contractului) pare să nu fie disponibilă comercial în cadrul pieței de asigurări. Vă rugăm să eliminați clauza contractuală aferentă sau să reduceți cerința limită în funcție de disponibilitatea pieței de asigurări.***
Raspuns 17	Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca se afla in imposibilitatea eliminarii Sub-clauzei 16.2 (b) 1., intrucat aceasta este prevazuta de H.G. nr. 1/2018, cu

CLAUZA 16 - Responsabilități și Asigurări		
16.2.(b) 1.	Limite de acoperire a asigurării pentru daune aduse terților	**10% din Pretul Contractului** va fi limita minima a asigurarii profesionale de proiectare, si **2.000.000 Lei per accident**, cu numar nelimitat de cazuri


	modificarile si completarile ulterioare, nefacand obiectul modificarii prin Conditiile speciale de contract. In ceea ce priveste cuantumul asigurarii pentru daune aduse tertilor, precizam ca acesta a fost stabilit in cadrul Acordului contractual, prin raportare la valoarea estimata a contractului de lucrari, complexitatea si importanta acestuia. In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16.2 (b)1. din Conditiile Generale de Contract, legiuitorul a prevazut dreptul autoritatilor contractante de a stabili limitele de acoperire la nivelul Acordului Contractual: *„cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, [...]”.* Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea contractanta mentine prevederile Art. 5.1 - Sub-Clauza 16.2 (b)1. din Acordul Contractual.
Intrebare 18	***Pentru forajele F3, F5 si F8 ce au fost executate pentru gropile de imprumut, coordonatele Latidutine si Longitudine prezentate in Documentul ”Studiu Geotehnic -Partea a III a - revizia 2” in Tabel pag 5 sunt diferite de coordonatele prezentate in Fisele Forajelor si Fisele Topografice aferente celor 3 foraje respectiv pag 48, 52, 58. Va rugam sa clarificati care sunt coordonatele Latitudine si Longitudine corecte pentru cele 3 foraje***
Raspuns 18	Pentru forajele F3, F5 si F8 coordonatele latitudine si longitudine prezentate in tabelul de la pag. 5 sunt corecte.
Intrebare 19	***Va rugam sa specificati sursele financiare pentru exproprierile temporare aferente organizarilor de santier si gropilor de imprumut.***
Raspuns 19	Amplasamentul Organizarii de santier nu va fi pus la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit. Antreprenorul trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a terenului afectat. Obtinerea autorizatiei pentru Organizarea de santier este in sarcina viitorului Antreprenor.
Intrebare 20	***In urma studierii aprofundate a Documentatiei de Atribuire, atat a partilor scrise cat si acelor desenate, nu s-au putut determina lucrarile ce ar trebui luate in considerare pentru ofertarea/pretuirea activitatilor/categoriei de lucrari 3.1.6 „Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati” din cadrul Anexei nr. 1 la Formularului nr.7.*** ***Va rugam sa clarificati ce activitati trebuie luate in considerare pentru acesta categorie de lucrari.***
Raspuns 20	Autoritatea Contractanta a mentionat in Anexa 1 la Formularul 7 cate o pozitie pentru fiecare categorie de lucrari cu mentiunea *„Orice alte activitati aferente...[...]*„ pentru a veni in sprijinul ofertantilor care pot cuantifica anumite activitati necesare realizarii categoriei principale de lucrari, altele decat cele prevazute in mod expres in cadrul formularului, astfel incat sa fie asigurat un flux de numerar corespunzator in implementarea viitorului contract.
Intrebare 21	***Cu referire la “Cerintele beneficiarului – Anexa Nr. 5: Schita de proiect”, in capitolul 7 pentru lucrari hidrotehnice, se impune furnizarea in interiorul schitei de proiect a documentelor enumerate mai jos:*** *7. Descriere si planse lucrari hidrotehnice* Lucrarile hidrotehnice- cu precizarea: km de inceput si km de sfarsit, cu precizarea solutiilor tehnice. i. Sectiuni transversale tip cu solutiile tehnice si aplicabilitatea acestora - cat mai complete sub aspect tehnic. ii. Planse cu tehnologia de executie pe faze de executie, inclusiv descrierea acestora. iii. Descriere pentru fiecare lucrare de consolidare. iv. Descrierea solutiei tehnice adoptate. ***intrucat in lista sunt mentionate consolidarea va rugam sa clarificati ce documente trebuie furnizate pentru lucrari hidrotehnice.***
Raspuns 21	In “Cerintele beneficiarului – Anexa Nr. 5: Schita de proiect”, capitolul 7. Descriere si planse hidrotehnice, paragraful: […] iii. Descrierea pentru fiecare ***lucrare de consolidare***”. **se modifica dupa cum urmeaza**:

	[…] iii. „Descrierea pentru fiecare ***lucrare hidrotehnica***”.
Intrebare 22	***Va solicitam sa ne puneti la dispozitie documente tehnice suplimentare pentru relocari de drumuri: plan, profile, secțiuni transversale.***
Raspuns 22	Autoritatea Contractanta a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile detinute in prezent, în formatele în care acestea au fost disponibile. Autoritatea Contractanta considera ca documentele si informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. De asemenea, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip **PROIECTARE SI EXECUTIE**, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, **lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.**
Intrebare 23	***Va solicitam sa ne puneti la dispozitie ridicările topografice pentru relocarile de drumuri.***
Raspuns 23	Ridicarile topografice au fost puse la dispozitia ofertantilor in cadrul Clarificarii nr. 1 publicata in SEAP de Autoritatea Contractanta.
Intrebare 24	***Secțiunea de consolidare Tip 16 este indicata a se aplica la drumul local de la km 27+790, dar nu există un drum local la aceasta pozitie kilometrica conform planșelor atasate Documentatiei de Atribuire. Vă rugam sa clarificati aplicarea corectă a secțiunii de consolidare Tip 16.***
Raspuns 24	Autoritatea Contractanta ataseaza plansa nr. P – CST- SbFg- PRDC- SF-53-PTT-016-03 care revizuieste aplicabilitatea Profilului Transversal Tip nr.16. In cadrul Tronsonului 2 al Autostrazii Sibiu – Fagaras (km 14+253 – km 34+175) profilul transversal tip nr.16 se aplica pentru drumurile locale de la pozitiile kilometrice: • 17+700 • 22+365 • 28+861 • 31+960
Intrebare 25	***Vă rugăm să confirmați dacă nu sunt planificate consolidări pentru urmatoarele Drumuri mentionate in Documentatia de Atribuire:*** - ***DC 51, DJ 105J*** - ***Drumuri locale la km 17+700, 22+365, 28+861, 31+960*** - ***Drumuri locale paralele cu autostrada de la aproximativ km 28,150 până la aproximativ km 28+860.***
Raspuns 25	Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea aferenta activitatii de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, revine in sarcina viitorului Antreprenor care va fi selectat dintre ofertantii participanti la prezenta procedura de achizitie publica.
Intrebare 26	***In planul atasat documenatiei pentru lucrarile de consolidare aferent Profil Transversal Tip 1 (plan nr PCSTSbFgPRDCSF53PTT00102) in descrierea sectiunii pentru reperul “Geogrila” rezistenta specifica conform variantei in Limba Romana este R=80kN/m iar conform variantei in Limba Engleza este R=110 kN/m Va rugam sa clarificati care este rezistenta Geogrilei***
Raspuns 26	Rezistenta geogrilei de la baza rambleului este R=110kN/m.
Intrebare 27	***Va rugam sa confirmati ca prevederile art. 4.1.10 din Cerintele Beneficiarului, respectiv: In elaborarea proiectului, Antreprenorul va tine cont de prevederile Legii 255/ 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica in privinta evaluarii imobilelor de pe coridorul de expropriere, evaluare ce va fi realizata de catre o persoana autorizata ANEVAR; Antreprenorul va respecta prevederile ANEXEI 3.sunt aplicabile doar in cazul exproprierilor suplimentare (adica doar in cazul in care vor fi necesare suprafete de teren suplimentare pentru executia lucrarilor).***
Raspuns 27	Autoritatea Contractanta confirma faptul ca Antreprenorul va fi responsabil cu intocmirea/punerea la dispozitie a documentatiei necesare exproprierilor terenurilor

	suplimentare, rezultate in urma proiectului tehnic. In acest sens se vor avea in vedere prevederile art. 5.1.18 din Cerintele Beneficiarului. Totodata, Antreprenorul, in calitatea sa si de Proiectant va tine seama de legislatia in vigoare.
Intrebare 28	***In Documentatia de Atribuire nu se regaseste plan cu reteaua de medie tensiune din incinta PSI / zona nod rutier Arpasu km 33+400.*** ***Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste informatii.***
Raspuns 28	Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia viitorilor ofertanti totalitatea documentatiei tehnice pe care o detine, astfel incat sa fie elaborate si prezentate oferte corecte, complete si competitive. Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea aferenta activitatii de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, revine in sarcina viitorului Antreprenor care va fi selectat dintre ofertantii participanti la prezenta procedura de achizitie publica.
Intrebare 29	***Va rugam sa clarificati cine proiecteaza iluminatul exterior din incintele spatiilor de servicii S1, S3, CIC, CIC/CMI,PSI. Proiectantul de instalatii electrice civile sau proiectantul instalatii electrice de iluminat de drum.***
Raspuns 29	Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea aferenta organizarii activitatii de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, revine in sarcina viitorului Antreprenor care va fi selectat dintre ofertantii participanti la prezenta procedura de achizitie publica.
Intrebare 30	***Va rugam sa clarificati cine proiecteaza telegestiunea iluminatului exterior din incintele S1, S3, CIC,CIC/CMI, PSI. Proiectantul de instalatii electrice civile sau proiectantul instalatii electrice de iluminat de drum.***
Raspuns 30	Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 31	***In Documentatia de Atribuire nu se specifica informatii despre statii electrice de incarcare auto, fac obiectul proiectului? In caz afirmativ, va rugam furnizati numarul lor din fiecare spatiu de servicii.***
Raspuns 31	A se vedea raspunsul la Clarificarea de Oficiu nr. 3 din cadrul Clarificarii nr.1, publicata in SEAP de Autoritatea Contractanta.
Intrebare 32	***In conditiile noului standard nZEB, va rugam sa specificati daca se vor prevedea panouri fotovoltaice pentru spatiile de servicii si de intretinere (S1,S3,CIC,CIC/CMI,PSI).***
Raspuns 32	**A se vedea Clarificarea din Oficiu nr. 1 din cadrul Clarificarii nr. 1 la documentatia de atribuire – punctul I.1:** *Iluminatul public* *Se va realiza la Nodurile rutiere, sensurile giratorii, Poduri, Spatii de servicii, Parcari, Centrele de Intretinere si Coordonare (CIC) si Centru de Monitorizare si Informare si in locatiile recomandate in "Ghidul privind conditiile de iluminat la drumuri nationale si autostrazi'' – indicativ AND 603/2012. Sistemul de iluminat va fi prevazut cu panouri fotovoltaice, corpurile de iluminat vor fi de tip LED montate pe stalpi metalici.*
Intrebare 33	***In Documentatia de Atribuire, Vol 10 Avize, nu este specificata nicio interferenta cu calea ferata (CFR) pentru Lotul 2 insa in vol V cap 5.1 subcap 2.3 Relocari, in planul de ansamblu PCTSTSbFgPRD1SF51.3PA-01102, relocarea drumului local km 28+861 prevede lucrari peste calea ferata implicit certificare AFER. Va rugam sa clarificati aceste lucrari.***
Raspuns 33	Referitor la relocarea drumului local de la km 28+861 nu sunt prevazute lucrari peste calea ferata, lucrarile efective proiectate incep dupa intersectia cu calea ferata existenta.
Intrebare 34	***Cu referire la formularul de ofertă "Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7" puteți clarifica următoarele:***

	• ***<u>3.4 - Orice alte activitati necesare amenajarii terenului</u> - ar trebui să includem studii geologice, investigații topografice și hidrotehnice în acest articol?*** • ***<u>6.5 - Orice alte lucrari necesare siguranței circulatiei, inclusiv amenajari</u> - ați putea vă rog să confirmați că putem include în acest articol stâlpii de ghidare și catadiopri reflectorizante?*** • ***<u>10.8 Orice alte lucrari aferente Nodului Rutier Avrig</u> - ați putea vă rog să confirmați că putem include în acest articol podete pentru nodurile care nu sunt prevăzute la articolele anterioare*** • ***<u>12.7 - Orice alte lucrari aferente amenajarii intersectiilor la nivel</u> - ați putea vă rog să confirmați că putem include în acest articol stâlpii de ghidare și catadiopri reflectorizante pentru sensul giratoriu? Deasemenea vă rog să confirmați că putem include în acest articol și lucrările temporare/provizorii ce vor fi necesare în vederea conectării intersecțiilor la nivel cu sistemul rutier existent.***
Raspuns 34	Autoritatea Contractanta a mentionat in Anexa 1 la Formularul 7 cate o pozitie pentru fiecare categorie de lucrari cu mentiunea *„Orice alte activitati aferente...[...]*„ pentru a veni in sprijinul ofertantilor care pot cuantifica anumite activitati necesare realizarii categoriei principale de lucrari, altele decat cele prevazute in mod expres in cadrul formularului, astfel incat sa fie asigurat un flux de numerar corespunzator in implementarea viitorului contract.
Intrebare 35	***Cu referire la procedura de licitatie CN1045619 - "PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Fagaras, Tronsonul 2: km 14+253 – 34+175, Avrig-Marsa (DJ105G) – Arpasu de Jos (DN1)", pentru care suspendarea procedurii de licitatie a fost revocata la data de 09.11.2022, întrucât răspunsurile la cererile de clarificare transmise înainte de suspendarea licitației nu au fost încă încărcate in SEAP și având în vedere că, odată primite răspunsurile menționate, ofertanții ar avea nevoie de timp suficient pentru a le analiza și respectiv a-și actualiza propunerile (totodata având în vedere și faptul ca la acest moment nu se cunoaște încă impactul real al răspunsurilor Clientului asupra licitației), vă rugăm să prelungiti termenul limita pentru a oferi ofertanților suficient timp pentru a-și revizui și finaliza propunerile.***
Raspuns 35	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 36	***Avem in vedere prevederile art. 152 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 conform cărora:*** ***(1) Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei legi referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunţurilor de participare şi, pe de altă parte, data-limită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare, autoritatea contractantă are obligaţia de a corela şi stabili perioada de depunere a ofertelor în funcţie de complexitatea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru şi de cerinţele specifice, astfel încât operatorii economici interesaţi să beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea ofertelor sau solicitărilor de participare şi pentru pregătirea documentelor de calificare şi selecţie care sunt solicitate prin documentele achiziţiei.*** ***Precum si prevederile art. 153 din aceeasi Lege:*** *(1)* ***Autoritatea contractantă prelungeşte perioada stabilită în anunţul de participare sau în documentele achiziţiei pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare [....]*** *(2)* *(3)* ***Durata prelungirii perioadei stabilite potrivit alin. (1) este proporţională cu volumul şi complexitatea informaţiilor transmise prin clarificări, a informaţiilor suplimentare sau a modificărilor aduse documentelor achiziţiei.*** ***Subliniem complexitatea deosebită a viitorului contract de achiziție publică si volumul impresionant de informații și documente care trebuie analizate si care trebuie incluse în propunerea tehnică și financiară.*** ***Mai mult, pana la aceasta data, autoritatea contractanta nu a raspuns deloc la solicitarile de clarificare transmise de catre operatorii economic, iar in aprecierea noastra numarul acestor solicitari este imens, cu siguranta de ordinul sutelor. Astfel,***

	chiar daca s-ar raspunde tuturor acestor solicitari de clarificare in termenul limita prevazut in Fisa de Date (respectiv 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor), este evident ca volumul urias de informatii si complexitatea acestora, ce urmeaza a fi transmise prin clarificari, fac ca termenul limita stabilit de catre autoritatea contractanta sa fie fara indoiala insuficient pentru a permite elaborarea unor oferte competitive și asigurarea unei concurențe reale între ofertanți. ***Raportat la aceste considerente, pentru promovarea competiției și asigurarea accesului efectiv la procedura de atribuire prin depunerea unei oferte de calitate, care să respecte în mod riguros cerințele autorității contractante, vă solicitam respectuos să dispuneți decalarea datei limită de depunere a ofertelor cu o perioadă de timp rezonabilă pe care o apreciem ca fiind de cel puțin 60 de zile.***
Raspuns 36	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 37	***Avand in vedere volumul foarte mare de raspunsuri la solicitari de clarificari, clarificari din oficiu continand modificari la documentatia de atribuire, anexe continand documentatie tehnica etc. publicate recent, va solicitam extinderea termenului limita de depunere al ofertelor cu cel putin 2 (doua) saptamani. Timpul ramas pana la depunerea ofertelor, de doar 8 zile lucratoare, nu permite analiza in detaliu a acestor clarificari si modificarea ofertelor intocmite pana acum.*** ***Apreciem ca solicitarea noastra este atat in interesul autoritatii contractante, cat si al ofertantilor, pentru depunerea de oferte corecte, complete si cu un nivel de calitate ridicat.***
Raspuns 37	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 38	***Ca urmare a numeroaselor solicitari de clarificari si a raspunsurilor aferente ale acestora, respectiv intarzierile mari cu care ne survin ofertele de pret necesare intocmirii propunerii tehnice/financiare si in urma cresterilor galopante a preturilor principalelor materiale de constructii, respectiv complexitatea documentatiilor necesare la intocmirea propunerii tehnice, va solicitam respectuos decalarea termenului de depunere a ofertelor cu minim 15 zile in vederea elaborarii ofertelor cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare a achizitiilor publice referitoare la principiul liberei concurente, principiul utilizarii eficiente a fondurilor publice si principiul tratamentului egal.***
Raspuns 38	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 39	***Datorita complexitatii elaborarii ofertelor, a multitudinii de clarificari si a raspunsurilor acestora, a studiilor amanuntite a documentelor puse la dispozite de autoritatea contractanta, cat si a necesitatii unui studiu de prefezabilitate, a cercetarii pietei in privinta disponibilitatii de furnizare a materialelor grosiere necesare privind executia si luand in considerare conflictele tarilor invecinate pentru previzionarea tuturor posibilitatilor de furnizare a pietei interne, va solicitam decalarea termenului limita de depunere a ofertelor.***
Raspuns 39	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 40	***Dat fiind faptul ca in data de 26, 27 sistemul sicap a anuntat oficial ca nu functioneaza sistemul, ne vedem in imposibilitatea de a urca documentele aferente licitatiei in aceasta perioada, chiar daca in ziua de luni 28.11 sistemul sicap revine, nu este timpul necesar. Prin urmare va rugam sa decalati termenul limita de depunere a ofertelor cu 7 zile calendaristice - zile care sa includa si zilele libere ce urmeaza cu ocazia sf andrei si zilei nationala a Romaniei.***
Raspuns 40	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 41	***Avand in vedere numeroasele erori pe care le genereaza site-ul de achizitii publice in ultima perioada, si luand in considerare zilele notificate de 26.11.2022 si***

	27.11.2022, pentru mentenanta paginii, va solicitam respectuos declarea termenului de depunere a ofertelor. 
Raspuns 41	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 42	***Va rugam sa ne comunicati daca iluminatul stradal exterior aferent acestui tronson de autostrada va fi sau nu cu panouri fotovoltaice si corpuri de iluminat LED integrate intr-un sistem de telegestiune.***
Raspuns 42	**A se vedea Clarificarea nr. 1 din Oficiu din cadrul Clarificarii nr. 1 la documentatia de atribuire.** De asemenea, corpurile de iluminat LED vor fi integrate intr-un sistem de telegestiune.

MASURI DE REMEDIERE
ADOPTATE DE CATRE AUTORITATEA CONTRACTANTA in cadrul
PROCEDURII DE ATRIBUIRE:
PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Fagaras, Tronsonul 2: km 14+253 – 34+175, Avrig-Marsa (DJ105G) – Arpasu de Jos (DN1)"
in conformitate cu prevederile Deciziei CNSC nr. 160/C7/2917/20.01.2023

In conformitate cu prevederile Deciziei CNSC nr. 160/C7/2917/20.01.2023, inregistrata la CNAIR sub nr. 92/7968/27.01.2023, prin care s-a dispus masura de remediere cu privire la revizuirea raspunsurilor la clarificari referitoare la solutiile tehnice aferente structurilor - cap. **5.2. – *Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor*** din Cerintele Beneficiarului, Autoritatea Contractanta **modifica** raspunsurile la intrebarile nr. 5, 6, 23, 24, 111, 118, 119, 120, 135, 136, 169, 185, 186, 212, 239, 249, 250, 251 din Raspunsul Consolidat publicat in SEAP prin Clarificarea nr. 1 din data de 14.11.2022, **dupa cum urmeaza**:

"Autoritatea Contractanta mentine ca cerinte imperative aspectele tehnice esentiale ale structurilor, precum lungimea totala, tipul suprastructurii/structurii, tipul de fundatie, si tipul lucrarilor de arta insa ofertantii au posibilitatea de a-si stabili propriile solutii cu privire la alte aspecte tehnice precum Schema statica, numarul si lungimea deschiderilor fara a diminua lungimea suprastructurii, numarul aparatelor de reazem si al rosturilor de dilatatie, numarul, inaltimea si/sau geometria grinzilor, asfel incat sa nu fie alterate cerintele imperative, cu respectarea normelor tehnice, normativelor, STAS-urilor in vigoare.

*Totodata, Autoritatea Contractanta **modifica** urmatorul paragraf din cadrul cap. 5.2.1 din Cerintele Beneficiarului:*

"Lucrarile de arta proiectate vor avea lungimile minime ale suprastructurilor conform tabelului de mai jos:"

***dupa cum urmeaza**:*

*"Lucrarile de arta proiectate vor avea lungimile minime ale suprastructurilor, **tipul suprastructurii/structurii, tipul de fundatie, precum si tipul lucrarilor de arta**, conform informatiilor de mai jos:"*

*Prin urmare, Autoritatea Contractanta **nu accepta modificarea aspectelor tehnice esentiale ale structurilor** stabilite prin documentatia de atribuire, precum lungimea totala, tipul suprastructurii/structurii, tipul de fundatie si tipul lucrarilor de arta."*
