COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro, registratura.cnair@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
www.erovinieta.ro

Clarificarea nr. 1
la DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

PROIECTARE SI EXECUTIE Largire la 4 benzi DN1A si masuri de siguranta rutiera pentru sectorul cuprins intre Centura Bucuresti si intersectia cu soseaua Chitila-Mogosoaia
Cod unic de identificare Contract: 16054368/2023/2624/S13

Intrebare 1	In conditiile in care Ofertantul alege sa NU declare subantreprenori de specialitate pentru utilitatile care necesita autorizari specifice domeniului de activitate (ex. Retele electrice inalta, medie, joasa tensiune; retele de gaz, iluminat, ITS, etc.), iar Ofertantul nu detine autorizarile necesare utilitatilor, cum se face dovada îndeplinirii criteriilor de eligibilitate de către Ofertant?
Raspuns 1	Cunoscand faptul ca Antreprenorul are obligatia de realiza, prin resurse proprii sau prin intermediul altor operatori economici, toate activitatile prevazute in Specificatii si Documentatia tehnica, fiind obligatoriu ca prin Propunerea Tehnica sa se demonstreze modul de indeplinire a tuturor cerintelor si prezentarea metodologiei de prestare a serviciilor/ executare a lucrarilor in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, in situatia in care ofertantul nu are in obiectul sau de activitate astfel de servicii/ lucrari, nu detine autorizarile specifice necesare sau capacitatea de a le realiza, **poate fie sa se asocieze cu un operator economic, fie sa subcontracteze aceste activitati catre un operator economic care are dreptul si capacitatea de a desfasura activitatile.** Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui ofertant de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti operatori economici, a caror calitate este reglementata de legislatia in materia achizitiilor publice. De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor activitatilor, cuprinzand in Formularul de Propunere Financiara si in Anexa nr. 1 si Anexa nr. 3 a acestuia sumele necesare indeplinirii obiectului contractului in integralitate. In situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului contractului este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii speciale, **operatorii economici care vor presta/executa efectiv respectivele activitati/lucrari trebuie sa detina autorizatiile necesare.** Va rugam sa aveti in vedere ca in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, precum si cu prevederile art. 179 lit. k) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, **Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor precizarea categoriile de servicii/ lucrari din contract pe care ofertantul intentioneaza sa o/le subcontractaze.** Potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. yy), prin subcontractant se va intelege "***subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu***

	este parte a unui contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi*".** De asemenea, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare: ***(1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv. Se vor avea in vedere, totodata, si prevederile art. 219 alin. (3) din Legea 98/2016, precum si prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului: ***(3)Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221***, precum si prevederile: ***Art. 150*** ***(2)****În vederea determinării valorii creanţei,* ***ofertantul are obligaţia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte.*** ***Art. 151*** ***Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii:*** ***a)****înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi,* ***b)declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora,*** ***c)renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică.*** ***Art. 156*** ***Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante.*** ***Art. 159*** *În situaţia prevăzută la art. 151 lit. b****), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică în condiţiile art. 221 din Lege.*** ***Art. 160*** ***Situaţia prevăzută la art. 151 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum este aceasta definită la art. 221 din Lege, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:***

	a)introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor; ***b)introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre autoritatea contractantă şi contractant;*** ***c)introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică;*** ***d)prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi.*** Aceste dispozitii privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului, precum si prevederile relevante din contract, nu inlocuiesc /suplinesc obligatiile existente la momentul depunerii ofertelor, astfel cum acestea au fost prevazute in documentatia de atribuire. Totodata, mentionam ca Autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile art. 151 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, privind inlocuirea/implicarea subcontractantilor in perioada de implementare a contractului, in situatia in care se indeplinesc conditiile specifice prevazute la art. 152-162 din acelasi act normativ. Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii cunosc ca, de exemplu, pentru activitatile de utilitati si instalatii este necesara o anumita autorizare, ofertantii au obligatia de a include aceste activitati atat in Propunerea tehnica, cat si in Propunerea financiara, si tinand cont de faptul ca potrivit legislatiei aplicabile, activitatile sus mentionate se realizeaza cu operatori specializati/ autorizati, **ofertantii vor declara in DUAE subcontractantii desemnati pentru aceste activitati numai in situatia in care Antreprenorul nu detine autorizarile necesare pentru a realiza el insusi aceste activitati, si doar daca respectivele autorizatii au fost solicitate in mod expres prin documentatia publicata.**
Intrebare 2	Solicităm Autorității Contractante formularea unei clarificări în ceea ce privește conținutul formularului A1 ASIGURARE DE GARANTIE DE PARTICIPARE la procedura de atribuire a contractului: PROIECTARE SI EXECUTIE Largire la 4 benzi DN1A si masuri de siguranta rutiera pentru sectorul cuprins intre Centura Bucuresti si intersectia cu soseaua Chitila-Mogosoaia. Potrivit formularului impus, Plata se va face de către noi în termenul menționat în cererea de plată și fără nicio altă formalitate suplimentară din partea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. În acest sens, solicităm Autorității Contractante indicarea unei perioadei/a unui termen clar în care să se facă plata către autoritatea contractantă, un astfel de termen nefiind indicat, formularea fiind ambiguă. Aducem la cunoștința Autorității Contractante că societățile de asigurare vor refuza emiterea poliței de asigurare în lipsa unui termen de plată expres și clar, cunoscut încă de la momentul eliberării poliței. De altfel, un astfel de termen de plată există în formularul B1 ASIGURARE DE GARANTIE PRIVIND BUNA EXECUTIE, anume 30 de zile.
Raspuns 2	Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca termenul de plata ce va fi mentionat in Cererea de plata va fi de maxim **30 de zile de la data transmiterii cererii de plata.**

Intrebare 3	Solicităm autorității contractante eliminarea mențiunii ”*se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internațională de Comerț*” din cuprinsul formularului A1 ASIGURARE DE GARANTIE DE PARTICIPARE la procedura de atribuire a contractului: *PROIECTARE SI EXECUTIE Largire la 4 benzi DN1A si masuri de siguranta rutiera pentru sectorul cuprins intre Centura Bucuresti si intersectia cu soseaua Chitila-Mogosoaia*. Aducem la cunoștința Autorității Contractante că Regulile Uniforme privind Garanțiile la Cerere se aplică a instrumentelor de garantare de sine stătătoare (autonome), cum este cazul scrisorilor de garanție bancară, iar nu și asigurărilor de garanții emise de societățile de asigurare. Societățile de asigurări sunt obligate să susțină un risc numai printr-un contract de asigurare, compus din polița de asigurare și din condițiile generale și speciale aferente, în conformitate cu prevederile art. 2.200 alin. (2) din Codul civil. Pentru claritate, societățile de asigurare emit polițe de asigurare care au ca anexă instrumentul de garantare aferent, iar nu instrumente de garantare de sine stătătoare (autonome) cărora să le fie aplicabile Regulile Uniforme privind Garanțiile la Cerere. Pentru aceste motive, vă solicităm eliminarea mențiunii ”*se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internațională de Comerț*”, pentru a da posibilitatea ofertanților de a constitui garanția de participare și prin intermediul unei asigurări de garanții emise de o societatea de asigurare, iar nu doar prin intermediul instrumentului de garantare eliberat de o instituție de credit. Precizăm că menținerea în formular a acestei mențiuni ar contraveni principiului egalității de tratament și ar limita participarea operatorilor economici la această licitație.
Raspuns 3	In conformitate cu **Publicatia nr. 758 “*Regulile Uniforme pentru Garanții la Cerere*” Art.1 lit.a.** *“Regulile Uniforme pentru Garanții la Cerere (“URDG”) **se aplica oricarei garantii la cerere** sau contragarantii care indica in mod expres ca se supun acestora. Acestea sunt obligatorii pentru toate partile garantiei la cerere sau contragarantiei, exceptand situatiile in care garantia la cerere sau contragarantia le modifica sau le exclude.”*. Asadar, paragraful „*Prezenta /Aceasta Garantie este supusă legilor din România si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internațională de Comert, cu exceptia celor mentionate mai sus”* **are aplicabilitate atat in privinta instrumentului de garantare emis de o instituție de credit din România, precum si in situatia in care acesta este emis de o societate de asigurări.** In urma dialogului purtat de Autoritatea contractanta cu reprezentantii Autoritatii de Supraveghere Financiara, s-a comunicat faptul ca prevederile Publicatiei 758 nu intra in contradictie cu dispozitiile Normei nr. 32/2021 emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, iar referinta la Regulile Uniforme privind Garantiile la cerere, publicate cu numarul 758 de catre Camera Internationala de Comert, poate fi utilizata in cadrul formularelor de garantie de participare, respectiv buna executie, inclusiv pentru situatia in care acestea sunt emise de catre o societate de asigurari. In consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate da curs solicitarii dumneavoastra privind eliminarea paragrafului mai sus mentionat.
Intrebare 4	Solicităm autorității contractante eliminarea mențiunii ”*se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internațională de Comerț*” din cuprinsul formularului B1 ASIGURARE DE GARANTIE PRIVIND BUNA EXECUTIE. Aducem la cunoștința

	Autorității Contractante că Regulile Uniforme privind Garanțiile la Cerere se aplică a instrumentelor de garantare de sine stătătoare (autonome), cum este cazul scrisorilor de garanție bancară, iar nu și asigurărilor de garanții emise de societățile de asigurare. Societățile de asigurări sunt obligate să susțină un risc numai printrun contract de asigurare, compus din polița de asigurare și din condițiile generale și speciale aferente, în conformitate cu prevederile art. 2.200 alin. (2) din Codul civil. Pentru claritate, societățile de asigurare emit polițe de asigurare care au ca anexă instrumentul de garantare aferent, iar nu instrumente de garantare de sine stătătoare (autonome) cărora să le fie aplicabile Regulile Uniforme privind Garanțiile la Cerere. Pentru aceste motive, vă solicităm eliminarea mențiunii ”*se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internațională de Comerț*”, pentru a da 3 posibilitatea constituirii garanției de bună execuție și prin intermediul unei asigurări de garanții emise de o societatea de asigurare, iar nu doar prin intermediul instrumentului de garantare eliberat de o instituție de credit. Precizăm că menținerea în formular a acestei mențiuni ar contraveni principiului egalității de tratament și ar limita participarea operatorilor economici la această licitație.
Raspuns 4	A se vedea **Raspunsul 3** din prezenta Clarificare.
Intrebare 5	Deoarece in anexa la formularul de oferta la capitolul 3.1.4 sunt specificate lucrari de canalizare, va rugam sa ne puneti la dispozitie SF-ul pentru lucrarile de canalizatie.
Raspuns 5	Informații necesare în ceea ce priveste “canalizarea” se regăsesc în cadrul documentatiei încarcate în SEAP, respectiv în cadrul vol. “*Memoriu de prezentare DN 1A _ mediu*”, Vol. 1 “*Memoriu de Sinteza*” precum și în Vol.5 “*Lucrari de scurgerea a apelor*”. Autoritatea Contractantă a pus la dispoziția ofertanților toata documentatia relevanta în cadrul Documentelor Beneficiarului din Documentația de atribuire publicată în SEAP, aceste informatii fiind suficiente pentru ca ofertanții să își poată realiza o ofertă corectă, completă și competitivă, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.
Intrebare 6	Pentru facilitarea pregatirii ofertei va rugam sa puneti la dispozitie potentialilor ofertanti Formularele in format editabil.
Raspuns 6	Formatul PDF (Portable Document Format - Format documente portabile) este un format comun pentru partajarea versiunilor finale ale documentelor. Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor, Formularele in format PDF editabil, prin salvarea documentelor create prin editorul de texte Microsoft Word in format PDF. Aceasta forma ofera posibilitatea ofertantilor sa copieze informatiile in integralitatea lor si sa le foloseasca in intocmirea propriilor documente. In acest sens, nu exista nici un impediment in folosirea informatiilor puse la dispozitie ofertantilor de Autoritatea Contractanta, in vederea elaboararii unei oferte complete.
Intrebare 7	Va rugam sa acceptati decalarea termenului de depunere cu 30 de zile pentru intocmirea unei oferte competitive care sa corespunda cerintelor calitative si cantitative ale proiectului, tinand cont de complexitatea acestuia si faptul ca prezenta licitatie este proiectare cu executie. Mentionam ca decalarea este necesara in vederea intocmirii unei oferte complete tehnico-economice, avand in vedere faptul ca de la momentul publicarii licitatiei publice a fost cuprinsa si

<table>
<tr><td></td><td>perioada sarbatorilor pascale, iar obtinerea ofertelor de la furnizori necesita un timp suplimentar.</td></tr>
<tr><td>Raspuns 7</td><td>Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.</td></tr>
<tr><td>Intrebare 8</td><td>Vă rugăm să clarificați/confirmați că formula de ajustare specificată la clauza 48.3 din Acordul contractual se va aplica la fiecare solicitare de plată pentru lucrările executate.</td></tr>
<tr><td>Raspuns 8</td><td>Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca Formula de Ajustare prevazuta in cadrul Art. 5.1 - Sub-Clauza 48.2 din Acordul Contractual se aplica in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 48 Ajustarea Preturilor si Sub-Clauzei 50.1 Situatia de Lucrari din Conditiile Generale de Contract.
Astfel, prevederile lit. (b) din cadrul Sub-Clauzei 50.1 se aplica in mod corespunzator:

„50.1 Situatia de Lucrari
După Data de incepere, lunar, Antreprenorul va transmite Supervizorului, in patru exemplare, Situatia de Lucrari in care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se consideră Indreptatit, impreuna cu documentele justificative.
Situatia de Lucrari va cuprinde:
[...];
(b) sume de adaugat sau de scazut pentru ajustarea preturilor in conformitate cu prevederile clauzei 48 [Ajustarea preţurilor];
[...]”

Totodata, avand in vedere faptul ca durata contractului de executie a contractului este de 12 luni (care include 2 luni durata activitatii de proiectare si 10 luni durata executiei lucrarilor) in cadrul Art. 5.1 - Clauza 48 - Ajustarea Preturilor din Acordul Contractual Autoritate contractanta modifica prevederile coloanelor 1 si respectiv 2 din cadrul Clauzei 48, astfel, mentiunile cu privire la aplicarea sub-clauzei 48.3 si “aplicarea unei formule de ajustare a prețurilor, atunci când Durata de Execuție la semnarea contractului este mai mare cu 365 de zile” se vor referi la aplicarea <u>Sub-Clauzei 48.2 si respectiv la</u> “aplicarea unei formule de ajustare a prețurilor, atunci când Durata de Execuție la semnarea contractului este mai mica sau egala cu 365 de zile”, informatiile din coloana 3 privind: „Data anterioara cu 30 de zile fata de ultimul termen-limita de depunere a Ofertelor”; „Ajustarea Sumelor Provizionate / Rezervelor de Implementare.” si respectiv „formula de ajustare a preturilor” <u>ramanand nemodificate</u>:

<table>
<tr><td>48.2</td><td>Data de Referinta</td></tr>
<tr><td>48.2</td><td>Ajustarea Sumelor Provizionate / Rezervelor de Implementare.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		48.2	*Aplicarea unei formule de ajustare a prețurilor, atunci când Durata de Execuție la semnarea contractului este* ***mai mica sau egala*** *cu 365 de zile*	
		[...]	**[...]**	
Intrebare 9	Va rugam sa clarificati daca verificarea proiectului de verificatori atestati intra in sarcina ofertantilor sau in sarcina beneficiarului;			
Raspuns 9	In conformitate cu Sub-clauza 19.2 din *Condiţiile generale şi specifice şi acordul contractual pentru contractele de proiectare şl execuţie de lucrări* – Anexa 2 a *HG 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice*, **angajarea/contractarea de verificatori autorizati intra in sarcina viitorului Antreprenor.** Aceasta cerinta este precizata si in Cerintele Beneficiarului, la cap. 4.3. *Documentele Antreprenorului:* *„Verificarea independenta a Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv a Detaliilor de Executie si a Proiectului Pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire) in conformitate cu legislatia romaneasca in domeniul constructiilor - Legea 10/1995 privind calitatea in constructii (cu modificarile si completarile ulterioare) va fi realizata de catre verificatori autorizati. In acest sens* ***Antreprenorul va contracta in mod separat Verificatori atestati, va estima costurile cu verificarea proiectelor si le va include in propunerea sa financiara***.”			
Intrebare 10	Va rugam sa confirmati ca nu trebuie executate lucrari de descarcare arheologica			
Raspuns 10	Asa cum este mentionat si in Cerintele Beneficiarului, la cap. 12.35. *Investigatii arheologice:* *Obligațiile Antreprenorului sunt de a anunța Direcția Județeană de Cultură Ilfov cu privire la data la care va inița lucrările de execuție în teren (pentru obiectivul de infrastructură rutieră) și* ***de a efectua supravegherea arheologică a tuturor lucrărilor care presupun intervenții în sol pe parcursul întregii perioade de execuție a proiectului de infrastructură rutieră*** *folosind prestatori de specialitate conform Ordinului 2562/2010.* ***Costurile de realizare a supravegherii arheologice, cât și alte costuri, riscuri și responsabilități aferente investigațiilor arheologice din această etapă sunt incluse în suma prevăzută de către Antreprenor pentru această activitate.*** Prin urmare, numai în cazul în care se vor identifica vestigii arheologice, ca rezultat al supravegherii arheologice, **acestea vor fi cercetate în vederea**			

	obtinerii certificatului de descarcare de sarcină arheologică iar eventualele costuri vor fi suportate din Rezervele de implementare.
Intrebare 11	Va rugam sa clarificati ce trebuie cotat la cap. 3.1.5 *Orice alte utilitati necesare a fi realizate in cadrul contractului*.
Raspuns 11	Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea **activitatilor** cuprinse in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de lucrari. Prin urmare, la cap. 3.1.5 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari din care fac parte din subpunctul de mai sus. De asemenea, Autoritatea contractanta a introdus in Anexa 1 la formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. Sintagma *Orice alte activitati...*se refera doar la acele activitati neincluse in formular la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate cuantifica. Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului E - Graficului de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de numerar corespunzator implementarii contractului. Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici nationali si internationali cu experienta profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostite tehnice temeinice, în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu.
Intrebare 12	Va rugam sa clarificati ce trebuie cotat la cap. 3.3 Orice alte activitati necesare amenajarii terenului.
Raspuns 12	Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea **activitatilor** cuprinse in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de lucrari. Prin urmare, la cap. 3.3 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari din care fac parte din subpunctul de mai sus. De asemenea, Autoritatea contractanta a introdus in Anexa 1 la formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. Sintagma *Orice alte activitati...*se refera doar la acele activitati neincluse in formular la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate cuantifica.

	Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului E - Graficului de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de numerar corespunzator implementarii contractului. Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici nationali si internationali cu experienta profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostite tehnice temeinice, în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu.
Intrebare 13	Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor detalii de executie privind cap. 4.5 Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile, avand in vedere ca nu se regasesc in documentatie.
Raspuns 13	Referitor la Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile in cadrul Cerintelor Beneficiarului, la cap. 3.1.7. se mentioneaza: "*In cadrul proiectului, se vor amenaja accesele existente la proprietăți in vederea asigurării accesului proprietarilor de imobile la terenuri situate de o parte si de alta al sectorului de drum national DN IA.* *Avand in vedere ca prin realizarea sensului giratoriu la intersectia DN 1A cu Soseaua Chitila – Padure, se limiteaza virajul la stanga catre Bucuresti, se vor amenaja si 2 accese suplimentare, astfel incat locatarii din blocurile situate in aceasta zona sa poata ajunge la acest sensul giratoriu, fiind astfel asigurata si relatia catre Bucuresti.*" Astfel, informații necesare referitoare la amenajarea acceselor existente la proprietăți, amenajarea a 2 accese suplimentare, etc. se regăsesc în cadrul documentatiei încarcate în SEAP, respectiv în cadrul Vol. 2 „*Lucrari drumuri*" precum și în Vol. 6 "*Plan Siguranta Rutiera rev. 1*". Autoritatea Contractantă a pus la dispoziția ofertanților toata documentatia relevanta în cadrul Documentelor Beneficiarului din Documentația de atribuire publicată în SEAP, aceste informatii fiind suficiente pentru ca ofertanții să își poată realiza o ofertă corectă, completă și competitivă, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.
Intrebare 14	Va rugam sa clarificati ce trebuie cotat la cap. 5.4 *Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari.*
Raspuns 14	Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea **activitatilor** cuprinse in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de lucrari. Prin urmare, la cap. 5.4 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari din care fac parte din subpunctul de mai sus. De asemenea, Autoritatea contractanta a introdus in Anexa 1 la formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari.

	Sintagma *Orice alte activitati*...se refera doar la acele activitati neincluse in formular la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate cuantifica. Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului E - Graficului de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de numerar corespunzator implementarii contractului. Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici nationali si internationali cu experienta profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostite tehnice temeinice, în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu.
Intrebare 15	Va rugam sa clarificati ce trebuie cotat la cap. 6.4 *Orice alte lucrari necesare realizarii Intersectiilor cu drumuri clasificate.*
Raspuns 15	Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea **activitatilor** cuprinse in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de lucrari. Prin urmare, la cap. 6.4 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari din care fac parte din subpunctul de mai sus. De asemenea, Autoritatea contractanta a introdus in Anexa 1 la formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. Sintagma *Orice alte activitati*...se refera doar la acele activitati neincluse in formular la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate cuantifica. Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului E - Graficului de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de numerar corespunzator implementarii contractului. Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici nationali si internationali cu experienta profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostite tehnice temeinice, în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu.
Intrebare 16	Va rugam sa clarificati ce trebuie cotat la cap. 7.3 *Orice alte lucrari necesare realizarii pasajelor pietonale.*

Raspuns 16	Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea **activitatilor** cuprinse in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de lucrari. Prin urmare, la cap. 7.3 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari din care fac parte din subpunctul de mai sus. De asemenea, Autoritatea contractanta a introdus in Anexa 1 la formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. Sintagma *Orice alte activitati...*se refera doar la acele activitati neincluse in formular la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate cuantifica. Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului E - Graficului de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de numerar corespunzator implementarii contractului. Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici nationali si internationali cu experienta profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostite tehnice temeinice, în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu.
Intrebare 17	Va rugam sa modificati durata perioadei de proiectare, avand in vedere si clauza 8.4 din contract privind erorile din documentatie care trebuiesc prezentate in maxim 15 zile de la data de incepere; consideram ca nu va fi timp pentru a lamuri solutiile de adoptat pentru a fi aprobat PAC-ul; va rugam sa tineti cont ca trebuie verificate de catre verificatorii autorizati inainte de prezentare.
Raspuns 17	Prin Cerintele Beneficiarului - cap. 4.2.3, si prin Acordul Contractual, perioada pentru notificarea oricaror erori, greseli sau neconcordanţe in Cerintele Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de referinţă este de **15 de zile de la Data de incepere**, deci anterior finalizarii documentatiei de proiectare. In cadrul Documentatiei de Atribuire a fost publicat Studiul de Fezabilitate, precum si toata documentatia tehnica relevanta detinuta de Beneficiar pentru realizarea Proiectului, astfel incat orice operator economic are posibilitatea sa analizeze in detaliu, inca de la acest moment, toate aspectele de natura tehnica, si sa sesizeze, totodata, ca urmare a acestei analize si a vizitei in Santier, eventualele erori/ greseli/neconcorante inca din procesul de elaborare a ofertei si oricum anterior realizarii documentatiei de proiectare. Avand in vedere cele antementionate, un Antreprenor diligent va elabora o documentatie de proiectare corecta, din moment ce posibilitatea de notificare si corectare a erorilor este anterioara realizarii PAC/PTE. Atragem atentia asupra faptului ca PAC-ul va fi întocmit pe baza soluțiilor prevăzute în cadrul Studiului de Fezabilitate pus la dispoziția ofertanților și

	pentru care a fost emisa H.G. nr. 38/2023 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici. De asemenea, predarea PAC-ului si aprobarea acestuia de catre Supervizor si Beneficiar se va realiza **in termen de o luna de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare**, fiind un indicator al Punctului de referinta nr. 2. Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta referitoare la durata activitatii de proiectare.
Intrebare 18	**ACORD CONTRACTUAL** *„Art. 5.2. (19) În cazul în care Antreprenorul nu prelungește valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, Beneficiarul/Autoritatea Contractantă are dreptul:* *- să rezilieze Contractul, fără îndeplinirea niciunei formalități, nefiind necesară nicio notificare, înștiințare sau altă măsură în vederea înștiințării rezilierii Contractului pentru motivul menționat anterior, nefiind necesară, de asemenea, nicio încuviințare sau intervenție în fața vreunei instanțe judecătorești, arbitrale sau de altă natură;* *- să execute integral valoarea Garanției de Bună Execuție."* **Propunere de modificare:** Măsura rezilierii contractului fără nicio notificare/înștiințare naște loc unei incertidudini din partea Beneficiarului, având în vedere faptul că, din diverse motive, se poate întâmpla ca întârizerea prelungirii GBE să nu fie din culpa Antreprenorului, ci a băncii, iar rezilierea să intervină prin voința Beneficiarului, fără a exista o manifestare din partea lui. Considerăm că posibilitatea executării garanției ar fi o măsură suficientă, dar cu o notificare prealabilă, bineînțeles, cu acordarea unui termen de grație de 48 ore.
Raspuns 18	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in conformitate cu prevederile Art. 39 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, *„Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre contractant in scopul asigurarii Autoritatii Contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului de achizitie publica [...]"* Astfel, avand in vedere aceasta prevedere legala, Autoritatea Contractanta se afla in imposibilitatea de a da curs propunerii de modificare a Art. 5.2. alin. (19), in forma propusa de operatorul economic, intrucat, din solicitarea de clarificare adresata de acesta, rezulta faptul ca poate exista o perioada de intarziere in prelungirea valabilitatii garantiei de buna executie, nemaifiind astfel acoperita intreaga durata a contractului de achizitie publica, fapt care este interzis de legiuitor, conform prevederii legale mai sus citate. Totodata, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca un operator economic care actioneaza cu diligenta este in masura sa preintampine situatia descrisa de catre operatorul economic in solicitarea de clarificare. Autoritatea Contractanta precizeaza ca, in contextul obligativitatii urmaririi interesului national, prin indeplinirea obiectului contractului, introducerea in clauzele contractuale a prevederilor invocate de operatorul economic, are ca scop necesitatea asigurarii Autoritatii Contractante de realizarea obiectului contractului, fiind vorba de un obiectiv de interes national. Prin urmare, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.2. alin. (19) din Acordul Contractual.

<table>
<tr><td>Intrebare 19</td><td>ACORD CONTRACTUAL
Clauza 36.4. Valoarea penalitatilor de întârziere pentru fiecare zi de întârziere „150.000 Lei pentru fiecare zi de întârziere, care se scurge între finalul Duratei de Executie dupa cum poate fi prelungita în conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] si data efectiva de finalizare a lucrarilor mentionata în Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor aprobat de catre Beneficiar.”
Propunere de modificare: Cuantumul fix menționat, aplicabil pentru fiecare zi de întârziere, reprezintă aproximativ 1,5% din valoarea maximă estimată a contractului conform fișei de date, pe care îl considerăm excesiv în raport cu valoarea contractului, motiv pentru care vă solicităm aplicarea prevederilor art. 3 alin. (2^1) din ORDONANȚĂ nr. 13 din 24 august 2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, pe care o considerăm ca fiind de referință în raporturile dintre profesioniști.</td></tr>
<tr><td>Raspuns 19</td><td>Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca valoarea penalitatii inscrisa in cadrul Art. 5.1. - Subclauza 36.4. a fost stabilita initial la 150.000 lei pentru fiecare zi de intarziere, iar pentru corelarea cu Cerintele Beneficiarului punctul 12.40 si pentru respectarea prevederilor H.G. nr. 1/2018 unde, in cadrul Sub-clauzei 36.4 legiuitorul prevede posibilitatea ca autoritatile contractante sa stabileasca valoarea penalitatilor de intarziere, respectiv: „[...] Cu exceptia cazului în care este prevazuta o alta valoare în Acordul Contractual, valoarea penalitatilor de întarziere pentru fiecare zi de întarziere va fi egala cu Pretul Contractului (sau al Sectorului) la semnarea Contractului <u>împartit la Durata de Executie la semnarea Contractului exprimata în zile</u>. [...]”, Autoritatea Contractanta modifica prevederile sub-clauzei 36.4 din Acordul Contractual, dupa cum urmeaza:

<table>
<tr><td>36.4</td><td>Valoarea penalitatilor de întârziere pentru fiecare zi de întârziere</td><td><u>220.000</u> Lei pentru fiecare zi de întârziere, care se scurge între finalul Duratei de Executie dupa cum poate fi prelungita în conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] si data efectiva de finalizare a lucrarilor mentionata în Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor aprobat de catre Beneficiar.
Suma maxima a penalitatilor de întârziere va fi de 15% din Pretul Contractului la semnarea Contractului.
Daca Beneficiarul devine îndreptatit sa perceapa de la Antreprenor suma maxima a penalitatilor de întârziere, (15% din Pretul Contactului la semnarea Contractului) atunci Beneficiarul va fi îndreptatit si sa rezilieze contractul în conformitate cu prevederile Clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	Chiar si avand in vedere prevederea legiuitorului din actul normativ, precizam si faptul ca la stabilirea valorii de **220.000 lei** pentru fiecare zi de intarziere s-au avut in vedere prevederile mai sus citate, rezultate din impartirea valorii estimate a procedurii de achizitiei in cauza la durata contractului de 12 luni, exprimata in zile. Totodata, invederam faptul ca, potrivit doctrinei in materie, libertatea contractuala a persoanelor publice prezinta particularitati in raport cu libertatea contractuala a persoanelor private. In acest sens, precizam ca principala caracteristica a contractelor administrative (contractul de achizitie publica fiind asimilat, potrivit legii, actului administrativ) este tocmai inegalitatea de pozitie in care se gasesc partile contractante: administratia, in calitate de purtatoare a prerogativelor de putere publica si, in consecinta superioara particularului, poate stabili unele clauze contractuale si impune sanctiuni. Acest aspect rezulta din faptul ca aceste contracte incheiate de administratia publica au anumite caracteristici speciale impuse de interesul public care sta la fundamentul incheierii si executarii acestora, fiind considerate contracte publice. Astfel, autoritatea contractanta nu considera ca modificarea propusa de operatorul economic este in interesul public. Mai mult, prevederea penalitatii in discutie este motivata de garantiile necesare Autoritatii Contractante pentru realizarea cu celeritate a obiectivului de interes national. Suplimentar, avand in vedere ca penalitatile se afla in stransa legatura de culpa partilor si sunt aplicate numai in situatia in care Contractantul nu isi indeplineste obligatiile in termenele si conditiile contractuale, cuantumul acestora nu ar trebui sa reprezinte o ingrijorare pentru orice operator economic care urmareste indeplinirea contractului conform principiului bunei-credinte.
Intrebare 20	**ACORD CONTRACTUAL** Art. 5.3. lit. d) – f) privind constituirea în favoarea subantreprenorilor/ subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale de constructii prevazuti la lit. (a) si a oricaror alti subantreprenori/ subcontractanti ai Antreprenorului general un drept de ipoteca mobiliara asupra oricaror sume banesti datorate de catre C.N.A.I.R. S.A. Antreprenorului general în baza contractului de achizitie publica, în scopul garantarii platii de catre Antreprenorul general a oricaror obligatii de plata fata de subantreprenori/ subcontractanti, reprezentând contravaloarea prestatiilor acestora necesare pentru executarea sau în legatura cu obiectul contractului de achizitie publica; **Propunem eliminarea lit. d) – f)** având ca obiet modul de garantare a îndeplinirii obligațiilor între Antreprenorul General și posibili subantreprenori/furnizori, etc., considerând că acest aspect face obiectul negocierii între părți, rămânând la latitudinea acestora stabilirea modalităților de garantare a îndeplinirii obligațiilor.
Raspuns 20	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca prevederile Art. 5.3 lit. d), e) si f) din Acordul Contractual sunt preluate de catre Autoritatea Contractanta din Legea nr. 76/2014, *privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome*

	"Administraţia Naţională a Drumurilor din România". Prin acest act normativ, in cadrul art. 12^1 alin. (4), (5), (6), legiuitorul obliga Antreprenorul sa constituie, la încheierea unui contract de achizitie publica de lucrari cu C.N.A.I.R. S.A., o ipoteca mobiliara în favoarea subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale de constructie, respectiv: ***(4)*** *La încheierea de contracte de achiziţie publică de lucrări având ca obiect realizarea, reabilitarea, extinderea sau modernizarea de drumuri, precum şi la încheierea actelor adiţionale la acestea în conformitate cu prevederile alin. (2), antreprenorul general va constitui, în favoarea subcontractanţilor sau a furnizorilor de materiale de construcţii şi a oricăror alţi subcontractanţi ai antreprenorului general prevăzuţi la alin. (1), un drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti datorate de către C.N.A.D.N.R. antreprenorului general în baza contractului de achiziţie publică, în scopul garantării plăţii de către antreprenorul general a oricăror obligaţii de plată faţă de subcontractanţi reprezentând contravaloarea prestaţiilor acestora necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică.* ***(5)*** *În vederea înregistrării ipotecii mobiliare la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, orice terţ beneficiar al contractului de achiziţie publică prevăzut la alin. (4), în calitate de persoană interesată, are dreptul să solicite C.N.A.D.N.R. eliberarea, în termen de 3 zile de la solicitare, a unei copii certificate a contractului de achiziţie publică şi a actelor adiţionale relevante.* ***(6)*** *Clauzele contractului de achiziţie publică prin care se constituie ipoteca mobiliară, în condiţiile prevăzute la alin. (4) reprezintă, pentru terţul beneficiar, contract de ipotecă, în sensul prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi sunt titlu executoriu în ceea ce priveşte obligaţia de plată a sumelor datorate respectivului terţ beneficiar pentru prestaţiile asumate de către acesta, prin orice act, necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică în cauză.* Prin urmare, Autoritatea Contractanta este in imposibilitate de a elimina aceste prevederi contractuale impuse de legiutor si pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.3 lit. d) - f) din Acordul Contractual
Intrebare 21	**CONDITII SPECIALE** Clauza nr. 9: *„Acces pe Şantier Sub-clauza 9.2 - Accesul pe Şantier a altor persoane* *Antreprenorul va asigura acces corespunzător pe Şantier pe parcursul Duratei de Execuţie, numai cu aprobarea expresa a Supervizorului, pentru următoarele categorii:* *- orice persoana juridica,* *- orice furnizor de bunuri/materiale,* *- orice prestator de servicii,* *- orice subcontractant,* *- orice societate comerciala/persoana fizica care închiriază utilaje,* *- orice alta persoana conform Instrucţiunilor Supervizorului si acolo unde este cazul cu aprobarea Beneficiarului care realizează activităţi in si pe Şantier sau care executa lucrări si prestează servicii pentru realizarea Lucrărilor.* *Antreprenorul va asigura acces corespunzător pe Şantier pe parcursul Duratei de Execuţie pentru personalul din cadrul C.N.A.I.R. S.A. care va efectua vizite inopinate in Şantier in scopul efectuării de determinări/ prelevări de probe / fotografiere/ filmare sau care vor monitoriza îndeplinirea exigentelor minimale*

	privind domeniul disciplinei si calității in construcții conform legislației si Proiectului Tehnic de Execuție pentru lucrările executate." **Propunere de modificare:** Aprobarea expresă a Supervizorului pentru asigurarea accesului corespunzător pe Șantier a „*oricărei persoane juridice/ oricărei furnizor de bunuri sau materiale/ oricarei prestator de servicii/oricărui subcontractant/etc."* este o condiție care ar putea îngreuna avansarea lucrărilor în ritm natural. Precizăm că nu ne este clar care este termenul de răspuns al Supervizorului la solicitarea Antreprenorului sau care ar fi sancțiunea care ar interveni în cazul în care Supervizorul nu răspunde sau dacă respinge solicitarea Antreprenorului în mod abuziv. Rugăm clarificare. Propunerea noastră ar fi eliminarea acestui articol sau cel mult reconsiderarea în sensul că o notificare prealabilă din partea Antreprenorului ar fi suficientă.
Raspuns 21	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca citatul invocat de catre operatorul economic in solicitarea de clarificare **nu face parte din Conditiile Speciale** de Contract publicate de catre C.N.A.I.R. S.A., in calitate de Autoritate Contractanta, in cadrul documentatiei de atribuire aferenta Anuntului de participare CN1053404 publicat in 24.03.2023. In conformitate cu prevederile Sub-clauzei 9.2 din Conditiile Speciale de Contract: *„Antreprenorul va asigura acces corespunzător pe Şantier pe parcursul Duratei de Executie, pentru urmatoarele categorii:* - *orice furnizor de bunuri/materiale,* - *orice prestator de servicii,* - *orice subcontractant,* - *orice subcontractant al subcontractantului,* - *orice alta persoana conform Instructiunilor/Aprobarilor Supervizorului si acolo unde este cazul cu aprobarea Beneficiarului, care realizeaza activitati in si pe Santier sau care executa lucrari si presteaza servicii pentru realizarea Lucrarilor.* *Antreprenorul va asigura acces corespunzător pe Şantier pe parcursul Duratei de Executie a Lucrarilor pentru echipele din cadrul C.N.A.I.R. S.A. care vor efectua vizite inopinate in Santier in scopul efectuarii de determinari/ prelevari de probe/ fotografiere/ filmare sau care vor monitoriza indeplinirea exigentelor minimale privind domeniul disciplinei si calitatii in constructii conform legislatiei si Proiectului Tehnic de Executie pentru lucrarile executate."*
Intrebare 22	**CONDITII SPECIALE** Clauza 10, paragraful 2: *„Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul pentru* ~~***orice***~~ *întârziere* ***pentru care se dovedește a fi culpabil*** *in obținerea si/sau reactualizarea si/sau completarea acordurilor si avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism sau prin actul de reglementare in domeniul mediului."* **Propunere de modificare:** Cauzele întârzierilor în ceea ce privește obținerea/actualizarea acordurilor sau avizelor poate fi fără culpa Antreprenorului, motiv pentru care solicităm modificarea articolului în forma propusă, având în vedere faptul că Părțile răspund în măsura existenței unei eventuale culpe.
Raspuns 22	Intrucat relatia contractuala intre Autoritatea Contractanta/Beneficiar si Antreprenor este guvernata de principiul bunei credinte, se prezuma ca Antreprenorul nu va avea intarzieri in obtinerea si/sau reactualizarea si/sau completarea acordurilor si avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism sau prin actul de reglementare in domeniul mediului. Astfel, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul va aplica penalitati numai in situatia in care aceste

	intarzieri apar din cauza Antreprenorului. Pentru motivele mai sus mentionate, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Sub-clauzei 10.1. paragraful 2 din cadrul Clauzei 10 - *Autorizatii si Asistenta privind Legea*, din Conditiile Speciale de Contract.
Intrebare 23	**CONDITII GENERALE** **Definiția supervizorului** Art. 1.1. *„bbb) Supervizor - operator economic sau echipă din cadrul Beneficiarului, desemnat de către Beneficiar. Supervizorul are atribuţiile tehnice, financiare şi contractuale stabilite în Condiţiile Contractuale. Supervizorul este nominalizat în Acordul Contractual sau notificat Antreprenorului potrivit prevederilor clauzei 5 [Supervizorul şi reprezentantul Supervizorului]. Supervizorul are în echipa sa diriginţi de şantier autorizaţi, potrivit prevederilor Legii, şi orice alte persoane pentru îndeplinirea rolului său*;" **Intrebare:** Din motive de imparțialitate, solicităm să se ia în considerare următoarea modificare: *„Supervizor - operator economic sau echipă din cadrul Beneficiarului expert în domeniul Proiectului, desemnat de către Beneficiar. Supervizorul are atribuţiile tehnice, financiare…*"
Raspuns 23	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca nu este in masura sa modifice Clauza 1 - *Definitii*, sub-punctul 54 bbb) *Supervizor*, din Conditiile Generale de Contract aprobate prin H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere faptul ca **singurele clauze ce pot fi amendate** prin Conditiile Specifice **sunt** cele expres mentionate de legiuitor, in tabelul din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 1/2018, respectiv **clauzele 5.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 19.2, 24.1, 44.1, 45.4**. In acest sens, se vor avea in vedere prevederile sectiunii dedicate Conditiilor Specifice din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 1/2018, si anume: *"Beneficiarii sunt îndreptăţiţi să elaboreze Condiţii Speciale numai cu privire la subclauzele şi numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiţie Specială este nulă."*
Intrebare 24	**CONDITII GENERALE** **Termenul de răspuns pentru schimbarea unui Subcontractant** Art. 7.4. al doilea paragraf: Propunem sa aiba urmatorul continut: "*În termen de ~~30~~ 10 de zile de la primirea acestei solicitări, Beneficiarul va notifica decizia sa Antreprenorului, cu indicarea motivelor în cazul unui refuz. Dacă Beneficiarul nu îşi notifică decizia în termenul mai sus indicat, solicitarea este considerată aprobată la expirarea termenului. în termen de 5 zile de la aprobarea oricărui nou Subcontractant, Antreprenorul va transmite Beneficiarului un exemplar semnat al subcontractului aferent, care se va constitui anexă la Contract. Subcontractantul nu va începe executarea părţii sale din Contract înainte de transmiterea subcontractului către Beneficiar.*" **Explicatie:** Considerăm ca termenul de 30 zile pentru a acorda un răspuns este prea lung și poate contribui la tergiversarea indeplinirii obligatiilor Antreprenorului, astfel, propunem înlocuirea acestuia cu un termen de 10 zile, varianta pe care o consideram mult mai rezonabilă.
Raspuns 24	A se vedea **Raspunsul 23** din prezenta Clarificare.
Intrebare 25	**CONDITII GENERALE** **Studiul Cerințelor Beneficiarului** Art. 8.4. alin 1: Propunem sa aiba urmatorul continut: "*Dupa data de incepere, intrarea in posesia documentelor ce cuprind Cerintele Beneficiarului si primirea accesului in santier, Antreprenorul va studia cu atentie Cerintele Beneficiarului*

	(inclusiv criteriile de proiectare si calculele de proiectare, daca exista) si reperele topografice sau sistemele de referinta initiale prevazute in Contract sau comunicate de Supervizor, exercitand cel putin diligentele definite in Cerintele Beneficiarului. In termen de 90 de zile de la data intrarii in posesiea Cerintelor beneficiarului (cu exceptia cazului in care un alt termen este prevazut in Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greseala sau alta neconcordanta identificata in Cerintele Beneficiarului sau in aceste repere sau sisteme de referinta." **Explicatie:** Consideram oportuna completarea cu sintagma "*intrarea in posesia documentelor ce cuprind Cerintele Beneficiarului si primirea accesului in santier*", deoarece doar dupa indeplinirea acestor conditii Antreprenorul va putea sa studieze efectiv cerintele Beneficiarului si sa le coreleze cu situatia din teren.
Raspuns 25	A se vedea **Raspunsul 23** din prezenta Clarificare.
Intrebare 26	**CONDITII GENERALE** **Accesul pe șantier** Art. 9.1. Propunem să aibă următorul conținut: „*Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Şantier şi va pune Şantierul la dispoziţia Antreprenorului la termenele şi pentru sectoarele prevăzute în Condiţiile Speciale. Dacă nu sunt prevăzute asemenea termene şi sectoare în Condiţiile Speciale, Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Şantier şi va pune Şantierul la dispoziţia Antreprenorului în termen de 30 de zile de la ~~Data de Începere.~~ semnarea contractului, pe baza de Proces-Verbal de predare-primire incheiat intre parti, prin care se vor peciza reperele în sistemul de referinta planimetric (coordonatele STEREO 70), precum si pozitionarea eventualelor utilitati / instalatii (daca este cazul).*" **Explicatie**: Consideram ca este oportuna inlocuirea sintagmei "*de la data de incepere*" cu sintagma "*de la data semnarii contractului*", deoarece este foarte important ca pe durata de 30 de zile de studiere a Cerintelor beneficiarului, cuprinsa intre data semnarii contractului si data inceperii efective a lucrarilor, Antreprenorul sa aiba posibilitatea efectiva de acces in santier pentru studii si masuratori. De asemenea, consideram ca este necesar ca partile sa incheie si un proces-verbal cu aceasta ocazie. Mai mult, lucrarile nu pot fi incepute de Antreprenor daca ii este permis acesul in santier doar in termen de 30 de zile de la data de incepere. Consideram ca este vorba de o eroare.
Raspuns 26	Mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta a respectat prevederile sub-clauzei 9.1 din Conditiile Generale aprobate prin HG nr. 1/2018 asa cum Legiuitorul a dat posibilitatea Autoritatilor Contractante sa intervina prin Conditiile Speciale. Astfel s-a introdus termenul de maxim 3 luni de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare si nu de la Data Semnarii Contractului intrucat termenele si obligatiile contractuale in ceea ce priveste durata de executie pe care Antreprenorii trebuie sa le realizeze curg de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare, inclusiv indeplinirea Punctelor de Referinta stabilite prin Cerintele Beneficiarului la pct. 12.39. Totodata, mentionam faptul ca, termenul specificat la sub-clauza 9.1 din Conditiile Speciale reprezinta un termen maximal.
Intrebare 27	**CONDITII GENERALE** **Autorizații:** Art. 10.1. lit. b): Propunem sa aiba urmatorul continut: „*Antreprenorul va transmite toate înştiinţările, va plăti toate taxele, cote şi tarife, va pregăti toată documentaţia necesară şi va obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate cu Legile în vigoare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea*

	Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni (altele decât cele menţionate la punctele (a) şi (c) ale prezentei subclauze). Antreprenorul va obţine şi autorizaţiile aferente Lucrărilor Provizorii. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii culpabile a acestor obligaţii." **Explicatie:** Consideram ca este necesara completarea cu sintagma "*culpabile*" deoarece Antreprenorul nu poate fi tinut sa raspunda pentru un prejudiciu/un fapt pentru care el nu are nici o culpa. Trebuie ca aceasta culpa sa existe si sa fie dovedita, iar Antreprenorul sa aiba posibilitatea sa se apere.
Raspuns 27	Autoritatea Contractanta mentine prevederile sub-clauzei 10.1 din Conditiile Speciale intrucat paragraful corespunzator la care face referire solicitarea de clarificare si anume: *Antreprenorul va transmite toate înştiinţările, va plăti toate taxele, cote şi tarife, va pregăti toată documentaţia necesară şi va obţine toate autorizaţiile, avizele, acordurile, licenţele şi aprobările în conformitate cu Legile în vigoare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Antreprenorul va obţine şi autorizaţiile aferente Lucrărilor Provizorii.* a fost preluat in integralitate din cadrul Conditiilor Generale fara a i se aduce vreo modificare. Prin urmare, Autoritatea Contractanta nu a achiesat la modificarea acestui paragraf fata de cel prevazut in cadrul Conditiilor Generale aprobate prin HG nr. 1/2018. Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca, potrivit doctrinei in materie, libertatea contractuala a persoanelor publice prezinta particularitati in raport cu libertatea contractuala a persoanelor private. In acest sens, precizam ca principala caracteristica a contractelor administrative (contractul de achizitie publica fiind asimilat, potrivit legii, actului administrativ) este tocmai inegalitatea de pozitie in care se gasesc partile contractante: administratia, in calitate de purtatoare a prerogativelor de putere publica si, in consecinta superioara particularului, poate stabili unele clauze contractuale si impune sanctiuni. Acest aspect rezulta din faptul ca aceste contracte incheiate de administratia publica au anumite caracteristici speciale impuse de interesul public care sta la fundamentul incheierii si executarii acestora, fiind considerate contracte publice. Astfel, autoritatea contractanta nu considera ca modificarea propusa de operatorul economic este in interesul public.
Intrebare 28	**CONDITII GENERALE** **Asistență:** Art. 10.4. *„Beneficiarul va oferi asistenţă rezonabilă Antreprenorului, la cererea sa, pentru autorizaţii, acorduri sau aprobări necesare să fie obţinute de către Antreprenor potrivit prevederilor Legii*.” **Explicatie:** Propunem definirea sau inlocuirea sintagmei "*asistenta rezonabila*". Consideram ca o astfel de sintagma poate primi interpretari diferite din partea partilor. De aceea, pentru mai mai multa previzibilitate, transparenta si pentru buna derulare a relatiilor contractuale, consideram ca sintagma ar trebui fie eliminata, fie explicata in cuprinul articolului.
Raspuns 28	A se vedea **Raspunsul 23** din prezenta Clarificare.
Intrebare 29	**CONDITII GENERALE** **Respectarea ordinelor date de către Beneficiar:** Art. 12.4.: Propunem sa aiba urmatorul continut: *„Antreprenorul va respecta orice Ordin Administrativ transmis de către Supervizor, daca acesta respecta legea, contractul si celelalte documente contractuale. In cazul în care*

	Antreprenorul consideră că cerinţele unui Ordin Administrativ depăşesc autoritatea Supervizorului sau scopul Contractului, Antreprenorul va transmite o notificare motivată Supervizorului, în cazul în care Antreprenorul nu transmite notificarea în termen de 10 zile de la primirea Ordinului Administrativ, se va considera că Antreprenorul acceptă Ordinul Administrativ ca fiind emis în mod valabil. Supervizorul va răspunde notificării în termen de 10 zile şi poate confirma, modifica sau anula Ordinul Administrativ. în cazul în care Supervizorul nu răspunde în termen de 10 zile, se consideră că a confirmat Ordinul Administrativ. Transmiterea unei notificări de către Antreprenor nu va suspenda efectul Ordinului Administrativ. Antreprenorul are dreptul de a contesta decizia autorității de supraveghere în conformitate cu clauza 69". **Explicatie:** Consideram ca este necesara introducerea sintagmei "*daca acesta respecta legea, contractul si celelalte documente contractuale*", deoarece este important ca dispozitiile Beneficiarului sa respecte atat contractul si documentatia tehnica ce sta la baza contractului, cat si normele tehnice impuse prin legislatia in vigoare – in caz contrar, Antreprenorul neputand fi sanctionat pentru nerespectarea lor.
Raspuns 29	A se vedea **Raspunsul 23** din prezenta Clarificare.
Intrebare 30	**CONDITII GENERALE** **Acces la contabilitate/înregistrări/documentele ale Antreprenorului** Art. 12.11.: „*Antreprenorul va permite Beneficiarului să inspecteze şi să copieze, fără restricţii, contabilitatea sa, înregistrările şi alte documente privind procedura de depunere a Ofertei şi executarea Contractului şi să permită auditarea acestora de către experţi/auditori desemnaţi de către Beneficiar. Beneficiarul va fi îndreptăţit să producă şi să folosească orice astfel de conturi şi înregistrări şi alte documente ca evidenţă în caz de dispută.*" **Explicatie:** Propunem eliminarea integrala sau reformularea in modalitatea urmatoare: "*In cazul unei situații potential litigioase, Antreprenorul va permite auditarea de către experţi/auditori desemnaţi de către Beneficiar, a documentelor privind procedura de depunere a Ofertei şi executarea Contractului, iar Beneficiarul va fi indreptatit sa utilizeze rezultatul acestor auditari ca mijloc de proba pentru solutionarea diferendului survenit intre parti.*" Propunem eliminarea acestei clauze sau reformularea in modul de mai sus, deoarece modul in care este formulata in prezent poate da nastere la abuzuri din partea Beneficiarului, mai ales daca ne raportam la obligatiile de confidentialitate asumate de parti si la restrictiile privind circulatia datelor cu caracter personal impusa de G.D.P.R.
Raspuns 30	A se vedea **Raspunsul 23** din prezenta Clarificare.
Intrebare 31	**CONDITII GENERALE** **Personal** Art. 14.4.: Propunem sa aiba urmatorul continut: „*Orice înlocuire a personalului-cheie se va face cu personal cu calificare şi experienţă cel puţin echivalente cu cele (dacă există) stabilite în documentaţia de atribuire, cu consimţământul prealabil al Beneficiarului.*" **Explicatie:** Propunem eliminarea frazei "*În cazul în care un membru al personalului-cheie a fost evaluat în cadrul criteriului de atribuire, Antreprenorul va propune un înlocuitor care să obţină cel puţin acelaşi punctaj ca urmare a aplicării factorilor de atribuire*" deoarece punctajul poate fi atribuit subiectiv de catre Beneficiar, iar acest fapt ar putea conduce la aplicarea unor penalitati abusive de catre Beneficiar.

Raspuns 31	A se vedea Raspunsul 23 din prezenta Clarificare, precum si prevederile art. 5.5 din Acordul Contractual: *5.5. (1) Modificarea Contractului realizata atat conform Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale, cat si altor clauze din Conditiile Contractuale sau Acordul Contractual, nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.* precum si prevederile art. 5.9 din Acordul Contractual.
Intrebare 32	**CONDITII GENERALE** **1Garanția de Bună Execuție** Art. 15.3.: *„În cazul în care Garanţia de Bună Execuţie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. a), anterior emiterii unei pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, Beneficiarul va notifica pretenţia atât Antreprenorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al sumei pretinse. Beneficiarul nu va formula nicio pretenţie asupra Garanţiei de Bună Execuţie cu excepţia următoarelor cazuri şi în limita sumelor la care Beneficiarul este îndreptăţit potrivit prevederilor Contractului: (...)* *c) Propunem sa aiba urmatorul continut: "Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze, din culpa sa exclusiva, o nerespectare a obligaţiilor sale în termen de 30 de zile de la primirea notificării Beneficiarului privind nerespectarea obligaţiei respective; sau (...)* " **Explicatie:** Consideram ca este necesara completarea cu sintagma "*din culpa sa exclusiva*" deoarece Antreprenorul nu poate fi tinut sa raspunda pentru un prejudiciu/un fapt pentru care el nu are nici o culpa. Trebuie ca aceasta culpa sa existe si sa fie dovedita, iar Antreprenorul sa aiba posibilitatea sa se apere.
Raspuns 32	Mentionam faptul ca prevederile art. 15.3 din Conditiile Generale privind Garantia de Buna Executie au fost modificate in Acordul Contractual la art. 5.2 intrucat Legea achizitiilor publice nr. 98/2016 si a HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare sunt prioritare fata de prevederile HG nr. 1/2018 conform prevederilor art. 4 din preambulul HG nr. 1/2018. Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca, potrivit doctrinei in materie, libertatea contractuala a persoanelor publice prezinta particularitati in raport cu libertatea contractuala a persoanelor private. In acest sens, precizam ca principala caracteristica a contractelor administrative (contractul de achizitie publica fiind asimilat, potrivit legii, actului administrativ) este tocmai inegalitatea de pozitie in care se gasesc partile contractante: administratia, in calitate de purtatoare a prerogativelor de putere publica si, in consecinta superioara particularului, poate stabili unele clauze contractuale si impune sanctiuni. Acest aspect rezulta din faptul ca aceste contracte incheiate de administratia publica au anumite caracteristici speciale impuse de interesul public care sta la fundamentul incheierii si executarii acestora, fiind considerate contracte publice. Astfel, autoritatea contractanta nu considera ca modificarea propusa de operatorul economic este in interesul public.
Intrebare 33	**CONDITII GENERALE** **Raspunderea Antreprenorului fata de terț (1)** Art. 16. 1, lit. a) - *„Responsabilitatea pentru ~~calitatea~~ corectitudinea proiectului / calitatea proiectarii şi pentru daune aduse Lucrărilor ”* *Fără a afecta prevederile clauzei 59 [Utilizarea Lucrărilor înainte de Recepţia la Terminare], clauzei 61 [Perioada de Garanţie] şi clauzei 66 [Forţă majoră şi*

	denunţare unilaterală], Antreprenorul îşi va asuma (i) întreaga responsabilitate pentru calitatea proiectului, pe baza Cerinţelor Beneficiarului, (ii) întreaga responsabilitate pentru menţinerea integrităţii Lucrărilor şi (iii) <u>*riscul pierderii şi daunei, indiferent de cauză, până la aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor aşa cum se prevede la clauza 60 [Recepţia la Terminarea Lucrărilor]*</u>*.* (iii) riscul de daune directe, ~~indiferent de modul în care au fost cauzate de răspunderea Antreprenorului~~, până la aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor, așa cum este stabilit în clauza 60 [Recepția la Terminarea Lucrărilor]. **Explicatie:** In primul rand, este incorect sa se afirme ca un proiect are calitate. Aceasta are claritate, corectitudine. In schimb, se poate face referire despre calitatea proiectarii. In al doilea rand, nu este indiferent din ce motiv se cauzeaza daune.
Raspuns 33	A se vedea **Raspunsul 23** din prezenta Clarificare.
Intrebare 34	**CONDITII GENERALE** **Raspunderea Antreprenorului fata de terț (2)** Art. 16.1. lit. b) ,,*Răspunderea Antreprenorului faţă de Beneficiar* *În orice moment, Antreprenorul va fi responsabil şi va despăgubi Beneficiarul pentru orice daune aduse, pe durata executării Contractului, Beneficiarului de către Antreprenor sau Personalul său, inclusiv Subcontractanţii săi şi orice persoană pentru care Antreprenorul este responsabil.* *Compensaţia pentru daunele aduse Beneficiarului (altele decât cele aduse Lucrărilor) şi generate de răspunderea Antreprenorului va fi limitată la Preţul Contractului.* *Această limită nu se va aplica pentru compensaţie în caz de vătămare corporală, inclusiv deces, şi nici pentru daune de orice tip aduse Beneficiarului şi generate de frauda sau neglijenţa gravă a Antreprenorului sau Personalului său, inclusiv Subcontractanţilor săi şi oricărei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil. Cu excepția cazului în care există neglijență gravă sau conduită intenționată, responsabilitatea contractantului pentru daune indirecte și indirecte (cum ar fi orice pierdere indirectă, pierdere de profit, pierdere de producție, pierdere de contracte) este exclusă.”* **Explicatie:** Chiar daca vorbim de modelul de contract HG 1/2018, acesta poate fi abuziva, motiv pentru care solicitam completarea articolului, pentru a preintampina situatii care se solutioneaza de instanta de judecata.
Raspuns 34	A se vedea **Raspunsul 23** din prezenta Clarificare.
Intrebare 35	**CONDITII GENERALE** **Raspunderea Antreprenorului fata de terț (3)** Art. 16.1. lit. c) punctul 2) Propunem sa aiba urmatorul continut: "*pierderea sau dauna este un rezultat inevitabil al obligaţiilor Antreprenorului de a proiecta şi executa Lucrările şi de a remedia orice defecţiuni. Beneficiarul va aduce la cunoştinţa Antreprenorului reclamaţia oricărui terţ în cel mai scurt timp posibil din momentul în care Beneficiarul o ia la cunoştinţă.* *În cazul în care Beneficiarul alege să conteste reclamaţia sau Să se apere împotriva reclamaţiei, Antreprenorul va acoperi costurile rezonabile de contestare sau apărare suportate de Beneficiar şi Personalul său, cu conditia ca reclamatia sa-i fi fost adusa la cunostinta Antreprenorului inainte de depunerea oricarei contestatii si sa i se fi oferit dreptul la aparare atat inainte, cat si in timpul acelei proceduri.* (…)” **Explicatie:** Consideram ca este necesara completarea cu sintagma "*cu conditia ca reclamatia sa-i fi fost adusa la cunostinta Antreprenorului inainte de*

	depunerea oricarei contestatii si sa i se fi oferit dreptul la aparare atat inainte, cat si in timpul acelei proceduri" deoarece este foarte important sa existe transparenta si o buna comunicare si colaborare intre parti in gestionarea oricaror reclamatii. Antreprenorului trebuie sa i se ofere posibilitatea sa se apere atunci cand este cazul.
Raspuns 35	A se vedea **Raspunsul 23** din prezenta Clarificare.
Intrebare 36	**CONDITII GENERALE** **Asigurarea răspunderii cu privire la calitatea Lucrărilor** Art. 16.2. lit. b) punctul 5) – propunem sa fie eliminat integral: ~~*„Antreprenorul va încheia o asigurare pentru a acoperi întreaga sa răspundere cu privire la calitatea Lucrărilor, chiar şi după Recepţia Finală, conform Legii.”*~~ **Explicatie:** Consideram ca aceasta cerinta este excesiv de oneroasa si imposibil de indeplinit de catre Antreprenor, mai ales ca nu se prevede un termen limita pana cand ar trebui extinsa asigurarea cu privire la calitatea lucrarilor. Consideram ca aceasta asigurare ar trebui mentinuta, in mod rezonabil, cel tarziu pana momentul receptiei finale a lucrarilor.
Raspuns 36	A se vedea Raspunsul 23 din prezenta Clarificare. De asemenea, mentionam faptul ca izvorul juridic al acestei reglementari este cel legal si provine din prevederile HG nr. 1/2018 si ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii. Asigurarea incheiata va fi de tipul *„toate riscurile pentru lucrările de construcții - montaj*“. Această asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrărilor incluse în Contract, inclusiv daune generate de vicii sau erori de proiectare privind proiectul tehnic, materialele de construcție sau punerea în operă și pentru care Antreprenorul este responsabil conform Contractului și daune generate de evenimente naturale. Perioada minima pentru valabilitatea politei va fi cel putin pana la incheierea Procesului-verbal de Recepție Finală si emiterea de catre Supervizor a Certificatului Final de Plata, ulterior realizarii Receptiei Finale.
Intrebare 37	**CONDITII GENERALE** **Programul de execuție** Art. 17.1. Propunem urmatoarele: „*In termen de 30 zile de la data de Incepere, Anteprenorul va transmite supervizorului, spre analiza si acceptare, un Program de Executie al intregului contract, detaliat pentru fazele de proiectare, urmand ca, dupa depunerea spre avizare a proiectului tehnic sa fie detaliata si partea de executie a acestuia, alcatuit dintr-un grafic de esalonare calendaristica Gannt (pe suport hartie si in format electronic editabil) si un raport descriptiv. Acest prim Program de Executie, inclusiv metodologia de lucru si resursele, va fi elaborat pe baza programului de lucrari depus in Oferta de catre Antreprenor*.” **Explicatie:** Propunem completarea cu sintagma "*detaliat pentru fazele de proiectare, urmand ca, dupa depunerea spre avizare a proiectului tehnic sa fie detaliata si partea de executie a acestuia*", deoarece, in termenul de 30 de zile de la data de incepere, Antreprenorul nu va avea proiectul tehnic, astfel incat nu va putea furniza un program de lucru detaliat pentru partea de executie a lucrarilor, apropiat de realitate.
Raspuns 37	A se vedea **Raspunsul 23** din prezenta Clarificare. Mentionam ca, paragraful din art. 12.39 - Punctul de referinta nr. 2 din Cerintele Beneficiarului: ✓ *Programul de Executie detaliat al intregului contract (Graficul Gantt impreuna cu Raportul Descriptiv, metodologia de lucru si resursele) in care activitatile si resursele aferente executiei Lucrarilor vor fi*

	prezentate la un nivel de detaliu adaptat, precum si, daca este cazul, Programul de Executie completat si/sau corectat, este/sunt acceptate de catre Supervizor, devenind astfel Programul de Referinta. respecta prevederile din HG nr. 1/2018. Tototdata a se vedea si prevederile Punctului de referinta nr. 4 din Cerintele Beneficiarului
Intrebare 38	**CONDITII GENERALE** **Brevete, licențe și drepturi de proprietate intelectuală** Art. 32.1. „*Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul, Personalul Beneficiarului şi agenţii acestuia şi se va asigura că nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie, daună, pierdere şi cheltuială ca urmare a unei reclamaţii formulate de un terţ, inclusiv creatori şi intermediari, pentru orice nerespectare a unor drepturi de proprietate intelectuală, industrială sau de altă natură în baza folosirii de către Beneficiar în conformitate cu prevederile Contractului a unor brevete, licenţe, proiecte, modele sau mărci înregistrate, cu excepţia situaţiei în care o astfel de nerespectare rezultă din conformitatea cu Cerinţele Beneficiarului sau cu instrucţiunile Supervizorului*” **Explicatie:** Clauza se modifică după cum urmează: „*Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul, Personalul Beneficiarului şi agenţii acestuia şi se va asigura că nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie, daună, pierdere şi cheltuială ca urmare a unei reclamaţii formulate de un terţ, inclusiv creatori şi intermediari, pentru orice <u>încălcare</u> ~~nerespectare~~ a unor drepturi de proprietate intelectuală, industrială sau de altă natură în baza folosirii de către Beneficiar în conformitate cu prevederile Contractului a unor brevete, licenţe, proiecte, modele sau mărci înregistrate, <u>obiectul domeniului de aplicare al furnizării</u>, cu excepţia situaţiei în care o astfel de nerespectare rezultă din conformitatea cu Cerinţele Beneficiarului sau cu instrucţiunile Supervizorului*”
Raspuns 38	A se vedea **Raspunsul 23** din prezenta Clarificare.
Intrebare 39	**CONDITII GENERALE** **Suspendarea prin vointa Antreprenorului** Art. 38.1.: Propunem sa aiba urmatorul continut: "*Antreprenorul, la primirea unui Ordin Administrativ de suspendare temeinic justificat de catre Beneficiar, va suspenda execuţia Lucrărilor sau a unei părţi din acestea, pe perioada sau perioadele şi în modul specificate în notificare. Ordinul Administrativ va menţiona cauza suspendării, precum şi Partea responsabilă în conformitate cu prevederile Contractului. Suspendarea va intra în vigoare la data la care Antreprenorul primeşte Ordinul sau la o dată ulterioară dacă Ordinul prevede astfel. Dacă data reluării execuţiei nu este prevăzută în Ordinul Administrativ de suspendare, Supervizorul va emite un nou Ordin Administrativ de reluare a execuţiei imediat după ce, în opinia Supervizorului, cauza suspendării a dispărut sau a fost remediată în mod rezonabil. Antreprenorul va relua execuţia Lucrărilor la data reluării execuţiei (dacă este menţionată în Ordinul Administrativ de suspendare) sau în cel mai scurt timp rezonabil şi, cu excepţia cazului în care Părţile stabilesc altfel, în cel mult 10 zile de la primirea unui Ordin Administrativ de reluare a execuţiei. Aplicând prevederile subclauzei 10.1. Părţile se vor asigura că autorizaţia/autorizaţiile de construire este/sunt în continuare valabile*." **Explicatie:** Consideram ca este necesara completarea cu sintagma "*temeinic justificat de catre Beneficiar*" pentru a nu se utiliza aceasta posibilitatea in mod abuziv de catre Beneficiar.
Raspuns 39	A se vedea **Raspunsul 23** din prezenta Clarificare.

Intrebare 40	**CONDITII GENERALE** **Suspendarea prin notificarea Antreprenorului** Art. 38.2.: Propunem sa aiba urmatorul continut: "*Dacă Supervizorul nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute în subclauza 50.3 [Certificatul de Plată] sau dacă efectuarea unei plăţi datorate de către Beneficiar în conformitate cu prevederile Contractului este întârziată cu cel puţin ~~45~~ 15 zile faţă de termenul-limită potrivit prevederilor subclauzei 50.4 [Plata], Antreprenorul va notifica Beneficiarul şi va fi îndreptăţit, după un termen de 15 zile de la transmiterea notificării, să suspende execuţia Lucrărilor sau să reducă ritmul de execuţie, în conformitate cu cele prevăzute în notificare, până la data la care Antreprenorul va primi Certificatul de Plată sau plata, după caz, şi în conformitate cu cele precizate în înştiinţare.(...)*" **Explicatie:** Consideram ca termenele de asteptare de 45 de zile si de 30 de zile sunt destul de lungi si dezavantajoase pentru Antreprenor si propunem inlocuirea acestora cu cate un termen de 15 de zile, varianta pe care o consideram echitabila pentru ambele parti. Avand in vedere faptul ca, pentru orice plata, formalitatile de plata dureaza 90 de zile din momentul efectuarii lucrarilor, daca se adauga si termenul de gratie de 45 de zile si inca 30 de zile pentru notificare se ajunge la un termen de 165 de zile pana la incasarea unei plati de catre Antreprenor – ceea ce este foarte mult.
Raspuns 40	A se vedea **prevederile art. 5.6 din Acordul Contractual, alin. (2).**
Intrebare 41	**CONDITII GENERALE** **Plăți** Art. 44.4.: Propunem sa aiba urmatorul continut: „*Antreprenorul se obligă să plătească Beneficiarului orice sumă solicitată de Beneficiar în conformitate cu prevederile clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului] şi considerată prin acordul Părţilor, Decizia Supervizorului, sentinţă arbitrală sau altcumva în conformitate cu prevederile Legii şi ale Contractului ca fiind datorată. Orice astfel de sumă, dacă nu este dedusă din sumele plătibile de către Beneficiar Antreprenorului, va fi plătită de către Antreprenor în termen de 30 60 de zile de la transmiterea de către Beneficiar a unei facturi.*" **Explicatie:** Pentru motive de simetrie si echilibru intre obligatiile partilor si avand in vedere termenele de plata foarte lungi pentru Beneficiar, consideram oportuna inlocuirea termenului de plata de 30 de zile oferit Antreprenorului cu un termen de 60 de zile.
Raspuns 41	A se vedea **Raspunsul 23** din prezenta Clarificare.
Intrebare 42	**CONDITII GENERALE** **Sume reținute** Art. 47.2 (finalul primului alineat).: Va rugam sa ne clarificati cu privire la urmatorul aspect: in cuprinsul acestui articol se precizeaza ca "*în orice moment între aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor şi aprobarea Recepţiei Finale, cuantumul garanţiei pentru Sume Reţinute va fi mai mare sau egal cu soldul Sumelor Reţinute*", in timp ce in art. 47.1. se specifica faptul ca, "*50% din Sumele Reţinute vor fi integrate în primul Certificat de Plată după aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor şi plătite de către Beneficiar. Soldul Sumelor Reţinute va fi integrat în primul Certificat de Plată după aprobarea Recepţiei Finale şi plătit de către Beneficiar.*" Nu se contrazic cele doua articole?
Raspuns 42	A se vedea **Clarificarea din oficiu** din prezenta Clarificare.
Intrebare 43	**CONDITII GENERALE** **Plata finală**

	Art. 51.1. primul alineat: Propunem sa aiba urmatorul continut: "*În termen de 45 de zile de la aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va transmite Supervizorului, în patru exemplare, Situaţia finală de Lucrări, împreună cu documentele justificative. Situaţia finală de Lucrări va cuprinde.*" **Explicatie:** Consideram ca este vorba de o eroare materiala si propunem inlocuirea sintagmei "*Receptiei Finale*" cu sintagma "*Receptiei la Terminarea Lucrarilor*".
Raspuns 43	A se vedea **Raspunsul 23** din prezenta Clarificare.
Intrebare 44	**CONDITII GENERALE** **Plăți directe către Subcontractanți:** Art. 52.1. al patrulea paragraf: Propunem sa aiba urmatorul continut: ,,*În cazul în care se constată, prin amendarea sau modificarea de către Supervizor într-un Certificat de Plată a unor sume certificate anterior, necesitatea recuperării de la un Subcontractant a unei sume plătite direct de către Beneficiar către acel Subcontractant, şi dacă suma nu este dedusă din sumele plătibile de către Beneficiar Subcontractantului, va fi plătită de către Subcontractant în termen de 30 de zile de la transmiterea de către Beneficiar a unei facturi. In cazul în care Subcontractantul nu efectuează o astfel de plată în termenul stabilit, Beneficiarul va recupera suma respectivă de la Antreprenor, insa doar daca Beneficiarul poate dovedi o culpa a Antreprenorului in plata eronata a respectivei sume.*" **Explicatie:** Considerăm că articolul în forma inițială este formulată în mod incomplet și este oportună completarea cu sintagma "*insa doar daca Beneficiarul poate dovedi o culpa a Antreprenorului in plata eronata a respectivei sume*" deoarece Antreprenorul nu poate fi tinut sa raspunda pentru un prejudiciu/un fapt pentru care el nu are nici o culpa. Trebuie ca aceasta culpa sa existe si sa fie dovedita, iar Antreprenorul sa aiba posibilitatea sa se apere.
Raspuns 44	A se vedea **prevederile art. 5.6 din Acordul Contractual.** A se vedea si **Raspunsul 23** din prezenta Clarificare.
Intrebare 45	**CONDITII GENERALE** **Plăți întârziate** Art. 53.1. ultimul paragraf: Propunem sa aiba urmatorul continut: ,,*Dobânda va fi datorată pentru perioada dintre expirarea termenului de plată şi data la care contul Antreprenorului este creditat.*" **Explicatie:** Consideram ca este oportuna inlocuirea sintagmei "*data la care contul Beneficiarului este debitat*" cu sintagma "*data la care contul Antreprenorului este creditat*" deoarece Antreprenorul poate urmari doar creditarea propriului cont, nu si operatiunile efectuate in contul Beneficiarului.
Raspuns 45	A se vedea **Raspunsul 23** din prezenta Clarificare.
Intrebare 46	**CONDITII GENERALE** **Recepția** Art. 57.2.: Propunem sa aiba urmatorul continut: ,,*Dacă circumstanţele excepţionale sau meteorologice fac imposibile evaluarea stării Lucrărilor şi/sau testarea acestora în pregătirea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor sau a Recepţiei Finale, Supervizorul, după consultarea, în măsura posibilului, a Antreprenorului, va întocmi o declaraţie prin care se certifică imposibilitatea. Se vor efectua verificarea şi testarea în termen de maxim 30 de zile de la data la care această imposibilitate încetează. Antreprenorul nu va invoca aceste circumstanţe pentru a evita obligaţia prezentării Lucrărilor într-o stare corespunzătoare.*" **Explicatie:** Pentru buna derulare a contractului si pentru a evita orice tergiversare inutila, consideram ca este oportuna completarea cu sintagma "*maxim 30 de zile*",

	urmand ca verificarea si testarea lucrarilor sa poata fi facute oricand in interiorul acestui termen, fara a se astepta in mod neaparat implinirea/trecerea celor 30 de zile.
Raspuns 46	A se vedea **Raspunsul 23** din prezenta Clarificare.
Intrebare 47	**CONDITII GENERALE** **Recepția la terminarea lucrărilor** Art. 60.6. primul paragraf: Va rugam sa ne clarificati cu privire la acest articol: *„În termen de 5 zile după ce semnează procesul-verbal, Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu privire la hotărârea de admitere, suspendare sau respingere a recepţiei la terminare, cu o copie a procesului-verbal aferent semnat de Beneficiar.*" **Explicatie:** Consideram ca, dupa semnarea procesului-verbal de receptie, lucrarile nu mai pot fi respinse de catre Beneficiar; semnarea procesului-verbal inseamna in mod normal admiterea receptiei.
Raspuns 47	A se vedea **Raspunsul 23** din prezenta Clarificare.
Intrebare 48	**CONDITII GENERALE** **Perioada de Garantie:** Art. 61.2. al treilea paragraf: Propunem eliminarea integrală: „~~*În cazul în care Antreprenorul consideră că nu este responsabil, în conformitate cu prevederile subclauzei 61.1, de viciu sau deteriorare, Antreprenorul va remedia viciul sau deteriorarea în conformitate cu notificarea emisă dar va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului] la plata Costurilor suplimentare potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].*~~" **Explicatie:** Consideram ca, daca Antreprenorul nu este responsabil de un anumit viciu sau de o deteriorare nu ar trebui sa fie obligat sa remedieze respectivul viciu sau respectiva deteriorare, ci cel mult consultat/interogat in acest sens. Beneficiarul ar trebui sa fie liber sa efectueze respectivele lucrari de remediere cu orice alt tert in caz de refuz al Antreprenorului. Răspunderea este importantă, mai ales în cazul în care se întâmpină erori în proiectare sau execuție, însă dacă Executantul își îndeplinește obligațiile și efectuază lucrările conform ordinelor primite, considerăm că nu ar trebui să fie răspunzător și pasibil de plata refacerii greșelilor. Antreprenorul nu poate fi tinut sa raspunda pentru un prejudiciu/un fapt pentru care el nu are nici o culpa. Este nececsar ca această culpă sa existe si sa fie dovedita, iar Antreprenorul sa aiba posibilitatea sa se apere. Asumarea si răspunderea Executantului Ofertant este si va fi evidenta atata timp cat participa in acest proiect, insa se doreste ca cerintele si prevederile legale sa fie respectate si aplicate, si in mod evident toate aspectele de asumare si raspundere sa fie cu respectarea cerintelor legale cu implicarea in aval a responsabilitatilor si neaparat dupa determinarea corecta cantitatilor de lucrari real executate.
Raspuns 48	A se vedea **Raspunsul 23** din prezenta Clarificare.
Intrebare 49	**CONDITII GENERALE** **Rezilierea de către Beneficiar:** Art. 64.1. ultimul alineat: Propunem reformularea in felul urmator: *„În aceste situaţii, cu exceptia cazurilor in care Antreprenorul reuseste sa-si indeplineasca obligatiile in termenul acordat şi cu excepţia cazului în care Beneficiarul, în termen de 15 zile de la data primirii de către Antreprenor a notificării de reziliere, transmite Antreprenorului o notificare de revocare a notificării de reziliere, Contractul va înceta de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere, hotărâre judecătorească, sentinţă arbitrală sau orice alte formalităţi, în a 16-a*

	zi de la primirea de către Antreprenor a notificării de reziliere emisă de Beneficiar." **Explicatie:** Consideram oportuna eliminarea sintagmei "*oricare*" si completarea cu sintagma "*cu exceptia cazurilor in care Antreprenorul reuseste sa-si indeplineasca obligatiile in termenul acordat*" deoarece, conform paragrafului 1, Antreprenorul are la dispozitie 15 zile de la primirea notificarii de reziliere in care poate sa ia masurile necesare pentru remedierea situatiei, iar in astfel de cazuri, rezilierea nu va mai opera.
Raspuns 49	A se vedea **Raspunsul 23** din prezenta Clarificare.
Intrebare 50	**CONDITII GENERALE** **Termenul de certificare a valorii Lucrărilor în caz de reziliere de către Beneficiar:** Art. 64.8.: Propunem sa aiba urmatorul continut: „*Supervizorul, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 90 30 de zile după data rezilierii, va certifica valoarea Lucrărilor (inclusiv a Documentelor Antreprenorului produse) şi toate sumele pe care Supervizorul le Decide ca fiind datorate Antreprenorului la data rezilierii (inclusiv orice sold în legătură cu Costul Materialelor, Echipamentelor şi altor Bunuri achiziţionate, fabricate sau produse de Antreprenor şi aflate în proprietatea Beneficiarului, precum şi Costurile suplimentare revendicate de către Antreprenor în conformitate cu prevederile Contractului dacă este cazul)*." **Explicatie:** Consideram ca termenul 90 de zile pentru certificarea valorii lucrarilor este exagerat de lung si dezavantajos pentru Antreprenor si propunem inlocuirea acestuia cu un termen de 30 de zile, varianta pe care o consideram echitabila pentru ambele parti.
Raspuns 50	A se vedea **Raspunsul 23** din prezenta Clarificare.
Intrebare 51	**CONDITII GENERALE** **Termenul de întocmire a raportului privind Lucrările executate în caz de reziliere de către Beneficiar:** Art. 64.9.: Propunem sa aiba urmatorul continut: „*După reziliere, un raport privind Lucrările executate de Antreprenor (inclusiv Documentelor Antreprenorului produse) va fi întocmit de Supervizor în cel mai scurt timp posibil după inspectarea Lucrărilor şi inventarierea Lucrărilor Provizorii, Materialelor, Echipamentelor şi altor Bunuri, dar nu mai târziu de ~~90~~ 30 de zile după data rezilierii. Antreprenorul va fi somat să se prezinte la inspecţie şi inventar. Supervizorul va întocmi şi o declaraţie privind sumele datorate de Antreprenor Beneficiarului*." **Explicatie:** Consideram ca termenul 90 de zile pentru intocmirea raportului privind lucrarile executate de catre Supervizor este destul de lung si dezavantajos pentru Antreprenor si propunem inlocuirea acestuia cu un termen de 30 de zile, varianta pe care o consideram echitabila pentru ambele parti.
Raspuns 51	A se vedea **Raspunsul 23** din prezenta Clarificare.
Intrebare 52	**CONDITII GENERALE** **30. Termenul de plată în cazul rezilierii de către Antreprenor:** **Art. 65.1. lit. a):** Propunem sa aiba urmatorul continut: *„...dacă Antreprenorul nu primeşte, integral, o plată datorată, în termen de 1~~20~~ **60** de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 50.4 [Plata], respectiv la clauza 51.3 [Plata finală];"* **Explicatie:** Consideram ca termenul de asteptare de 120 de zile este destul de lung si dezavantajos pentru Antreprenor si propunem inlocuirea acestuia cu un termen de *60* de zile, varianta pe care o consideram echitabila pentru ambele parti.

Raspuns 52	A se vedea **Raspunsul 23** din prezenta Clarificare, precum si prevederile art. 5.6 alin. (2) din Acordul Contractual.
Intrebare 53	**CONDITII GENERALE** **Termenul de remediere in caz de reziliere de către Antreprenor:** **Art. 65.1. lit. b):** Propunem sa aiba urmatorul continut: "*Beneficiarul şi/sau Personalul său nu îşi îndeplinesc obligaţiile Contractuale, după două notificări transmise de către Antreprenor Beneficiarului privind această neîndeplinire, fiecare notificare având un termen de remediere de cel puţin ~~30~~ **15** de zile;*" **Explicatie:** Din motive de simetrie cu art. 64.1. din contract, consideram oportuna inlocuirea termenului de 30 de zile cu un termen de 15 zile, deoarece termenul de 30 de zile este destul de lung si dezavantajos pentru Antreprenor**.**
Raspuns 53	A se vedea **Raspunsul 23** din prezenta Clarificare.
Intrebare 54	**CONDITII GENERALE** **Denunțare unilaterală:** Art. 66.7.: Propunem eliminarea integrala sau reformularea in modalitatea urmatoare: *„Beneficiarul, în orice moment şi cu efect imediat, poate denunţa unilateral Contractul, printr-o notificare în acest sens transmisă Antreprenorului, cu conditia platii de daune-interese catre Antreprenor in valoare de 10% din valaorea contractului. Fără a afecta obligaţiile şi răspunderea Beneficiarului faţă de autorităţile publice din România, Beneficiarul nu va fi obligat să indice Antreprenorului motivele denunţării unilaterale. în cazul denunţării unilaterale, Beneficiarul nu va continua Lucrările fie prin forţe proprii, fie prin încheierea unui nou contract, pe o perioadă de 3 ani de la data denunţării unilaterale. în caz contrar, Antreprenorul va fi îndreptăţit să primească plăţi de la Beneficiar în conformitate cu prevederile subclauzei 65.3.*" **Explicatie:** Consideram oportuna completarea cu sintagma "*cu conditia platii de daune-interese catre Antreprenor in valoare de 10% din valoarea contractului*" pentru a da un caracter restrictiv si cu totul exceptional acestei posibilitati a Beneficiarului, pentru ca acesta sa nu uzeze in mod abuziv sau nejustificat de acesta optiune.
Raspuns 54	A se vedea **Raspunsul 23** din prezenta Clarificare.
Intrebare 55	**CONDITII GENERALE** **Denunțarea unilaterală** Art. 66.8. paragraful 2): Poate ramane doar in situatia in care este acceptara varianta propusa mai sus a art. 66.7. In caz contrar, propunem sa fie eliminat, mai ales ca se contrazice cu prevederea din art. 66.7. potrivit careia "*în cazul denunţării unilaterale, Beneficiarul nu va continua Lucrările fie prin forţe proprii, fie prin încheierea unui nou contract, pe o perioadă de 3 ani de la data denunţării unilaterale. în caz contrar, Antreprenorul va fi îndreptăţit să primească plăţi de la Beneficiar în conformitate cu prevederile subclauzei 65.3.*"
Raspuns 55	A se vedea **Raspunsul 23** din prezenta Clarificare.
Intrebare 56	**CONDITII GENERALE** **34. Limitarea raspunderii** Art. 68.4.: Propunem eliminarea lit b): "*Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel, in mod expres, in Conditiile Contractuale, Beneficiarul nu va avea nici o raspundere fata de Antreprenor pentru:* *(a) pierderea unui alt contract; sau* *~~(b) orice pierdere financiară a Antreprenorului (alta decât Costuri suplimentare."~~*

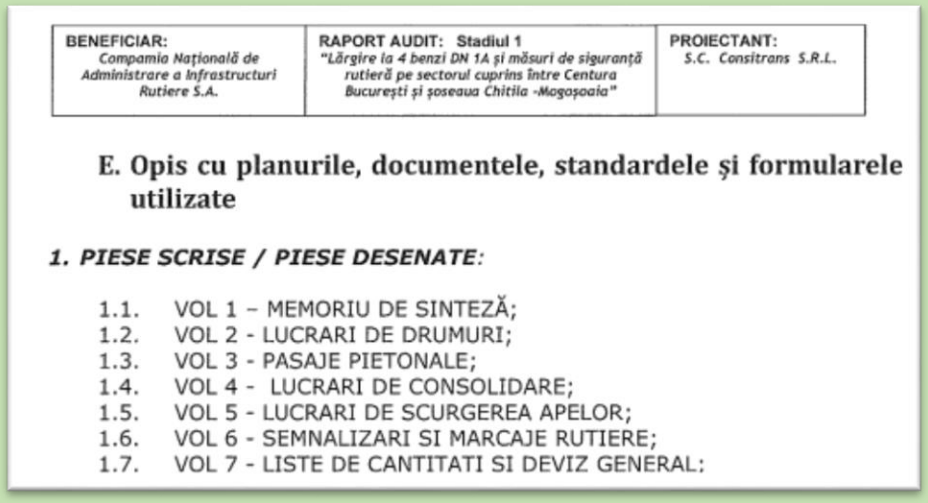
	Explicatie: Eliminarea se impune pe principiul echitabilitatii. Este abuziv să semnăm un acord în care Beneficiarul se sustrage de răspundere materială în cazul unor pierderi al Antreprenorului, mai ales dacă pierderea a fost cauzată de culpa Beneficiarului. In cel mai rau caz Beneficiarul nu va raspunde pentru prejudiciile indirecte si viitoare, dar Antreprenorul trebuie sa isi poata acoperi prejudiciile directe cauzate de Beneficiar.
Raspuns 56	A se vedea **Raspunsul 23** din prezenta Clarificare.
Intrebare 57	**CONDITII GENERALE** **Propunem introducerea unui art. 73 cu urmatorul continut:** "*73.1. Toate datele legate de derularea contractului sunt considerate a fi confidentiale si privesc exclusiv partile contractante. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea atat pe perioada valabilitatii contractului, cat si dupa incetarea sau rezilierea lui, pe o perioada nelimitata de timp.* *73.2. O parte contractanta va fi exonerată de răspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca este necesara dezvaluirea informatiilor unor terti, precum: instituţii financiar bancare, societati care presteaza servicii de audit in favoarea uneia dintre partile contractante, societati/brokeri de asigurari, autorităţi fiscale, ipoteza in care se prezuma existenta acordului scris al celeilalte parti.* *73.3. Părțile se obligă să respecte dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și să asigure protecția datelor cu caracter personal furnizate cu ocazia incheierii acestui contract. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate cu respectarea principiilor prevăzute la art. 5 din Regulament, fiind limitate la ceea ce este strict necesar în raport cu scopurile in care sunt prelucrate.* *Părțile acționează în calitate de operatori de date independenți cu ocazia încheierii prezentului contract și declară ca au intreprins măsurile tehnico-organizatorice necesare asigurării securității prelucrării datelor cu caracter personal.*"
Raspuns 57	Mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta nu are posibilitatea a modifica sau introduce articole noi in cadrul HG nr. 1/2018, aceasta atributie revenind Legiuitorului.
Intrebare 58	**CONDITII GENERALE** **Propunem introducerea unui art. 74 cu urmatorul continut:** "*Prin semnarea prezentului contract, Beneficiarul accepta listarea denumirii sale in portofoliul de clienti al Executantului (cu titlu de exemplu, dar fara a se limita: website, materiale publice sau care urmeaza a fi facute publice etc)*." Aceste modificări nu reprezintă schimbări substanțiale a Contractului de Achizitie si nici nu ar fi în dezavantajul Achizitorului, în acest sens vă rugam respectuos să luați în considerare clarificarile și solicitările noastre,
Raspuns 58	A se vedea **Raspunsul 57** din prezenta Clarificare.
Intrebare 59	In urma vizitei in teren si a analizei planselor din proiectul in faza SF, solicitam acceptarea schimbarii solutiei de realizare a consolidarilor in zona pasajului pe sub calea ferata. In SF e data solutie cu ecran de piloti cu diametru de 880mm. Realizarea acestora este aproape imposibila sau implica restrictionarea traficului in zona datorita faptului ca vor trebui realizate platforme de lucru pentru foreze. Precizam ca aceste modificari de solutie pe care le solicitam nu vor afecta

	termenul de executie si vor perturba traficul in zona mult mai putin decat varinta de realizare a pilotilor.
Raspuns 59	Autoritatea Contractanta **elimina** din cadrul **cap. 5.4. *Caracteristici imperative privind lucrarile de consolidare*** din Cerintele Beneficiarului paragrafele: *"Solutiile de consolidare prevazute in Documentatia tehnica pusa la dispozitie sunt solutii minimale, Antreprenorii pot adopta si alte solutii tehnice alternative cu precizarea tehnologiei de executie, respectarii Cerintelor Beneficiarului, legislatiei in vigoare si a reglementarilor tehnice in vigoare.* *In acest scop Beneficiarul precizeaza:* *a. solutiile tehnice altele decat cele prezentate prin Documentatia Tehnica nu trebuie sa conduca la un impact negativ mai mare asupra mediului sau necesitatea reobtinerii unor avize.* *b. solutiile tehnice altele decat cele prezentate prin Cerintele Beneficiarului si Documentatia Tehnica pusa la dispozitie pot conduce la reobtineri/revizuiri/completari/ notificari ulterioare la nivelul avizelor /acordurilor obtinute sau in curs de obtinere. Orice notificare/ modificare/ completare/ revizuire necesara ca urmare a solutiilor tehnice propuse, altele decat cele in baza carora s-au obtinut avizele /acordurile va fi solutionata de acesta in termenul contractual doar cu acordul ferm al Reprezentantului Beneficiarului.* *In cazul adoptarii oricaror alte solutii de consolidare, Antreprenorii vor prezenta o descriere detaliata a solutiei adoptate precizand minim: avantajele acesteia, durata de viata si lucrarile de intretinere necesare. Antreprenorii vor prezenta detaliat atat descrierea solutiei tehnice alternative, precizand minim: avantajele acesteia, durata de viata si lucrarile de intretinere necesare, cat si tehnologia de executie si utilajele/echipamentele utilizate, acestea din urma trebuind a fi specificate in clar si in formularele si lista de echipamente disponibile pentru realizarea contractului."* **si se inlocuiesc cu urmatoarea fraza:** *„Lucrarile de consolidare minime ce vor fi respectate sunt cele prevazute in cadrul Documentatiei Tehnice puse la dispozitie".* Totodata, mentionam ca, in vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, **nu sunt permise modificări privind tipul sau cantitatea lucrarilor de consolidare în raport cu ceea ce este prevăzut în Studiul de Fezabilitate din cadrul proiectului.** Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului.
Intrebare 60	Va rugam sa ne clarificati care dintre cele doua variante expuse in SF va fi cea aleasa pentru a fi ofertata. Ma refer la variantele de realizare a sistemului rutier care in varianta 1 se pastreaza cel existent, executandu-se frezare si inlocuire straturi de asfalt, iar in stanga si dreapta pe suprafetele de extindere executandu-se caseta noua, iar in varianta 2 eliminarea integrala a sistemului rutier vechi si inlocuire pe toata latimea partii carosabile cu sistem rutier nou.
Raspuns 60	Structura rutieră ofertata va fi cea prezentata la Varianta 1, asa cum a fost descrisa in Cerintele Beneficiatului, pct **3.1.5. *Structura rutiera proiectata*** si respectiv:

	Varianta 1 – Structura rutiera ranforsata pe existent si largire stanga/dreapta cu strucura rutiera noua a) Pentru ranforsarea structurii rutiere existente – frezare 18/20 cm straturi bituminoase existente + reparatii loca + 3 straturi bituminoase: - 4 cm strat de uzura din MAS 16 rul PMB 45/80; - 6 cm strat de legatura din BAD 22,4 leg PMB 45/80; - Geosintetic antifisură (R>50kN); - 9 cm strat de baza din AB 31,5 bază 50/70; - strat pentru preluare denivelări din AB 31,5; - structura rutieră existentă. b) Structura Rutieră Nouă - pentru zonele de casete necesare lărgirii drumului de la 2 benzi la 4 benz - 4 cm strat de uzura din MAS 16 rul PMB 45/80; - 6 cm strat de legatura din BAD 22,4 leg PMB 45/80; - 9 cm strat de baza din AB 31,5 bază 50/70; - 22 cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici; - 30 cm strat de fundatie din agregate naturale (Balast 0-63); - 20 cm strat de formă din materiale necoezive.
Intrebare 61	In urma vizitei in teren si analizei planselor, solicitam acceptarea schimbarii solutiei de realizare a culoarului pietonal sub drum in cadrul pasajului subteran cu o alta solutie pe care o vom propune in cadrul propunerii tehnice. Ne referim la inlocuirea elementelor prefabricate din beton armat cu o alta solutie, care consideram noi ca e realizabila intr-un timp echivalent cu cel necesar realizarii solutiei propuse prin SF, dar care din punct de vedere al fluentei traficului in zona in timpul executiei lucrarilor este mai avantajoasa
Raspuns 61	Autoritatea Contractanta mentine prevederile Cerintelor Beneficiarului puse la dispozitie. Se vor respecta cerintele pct. **5.2. *Caracteristici imperative privind proiectarea pasajelor pietonale*.** Studiul de Fezabilitate reprezintă Documentaţia tehnica la un nivel de exigenta cantitativa si calitativa minima acceptata de către Beneficiar. In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile **nu sunt permise modificari/ oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului.** Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.
Intrebare 62	**Pod Linia de centura** - Retelele de Telecomunicatii existente in zona pasajului Mogosoaia pe DNCB, in urma vizitei in teren am constatat ca sunt relocate/deviate in subteran pana in apropierea Cristim unde revin pe stalpi. In acest context va rugam sa ne clarificati daca se va realiza o alta interconectare pe zona nodului rutier sau se va conecta doar din zona revenirii pe stalp.
Raspuns 62	Conform proiectelor de specialitate puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, in zona nodului rutier rețelele de Telecomunicații se vor reloca in subteran prin canalizatia proiectata, iar conectarea se va realiza in caminul proiectat. Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.

Intrebare 63	**Pod CF -** Va rugam sa ne clarificati daca in zona traversarii DN1A pe sub pasajul de cale ferata se accepta pozarea tubulaturilor necesare retelelor de Telecomunicatii pe structura de beton a consolidarilor ce se vor realiza, avand in aval fata de pasaj cat si in amonte camerele pentru intrarea si iesirea in subteran, sau se va realiza retea subteran inclusiv in zona subtraversarii pasajului CF.
Raspuns 63	In zona traversării DN1A pe sub pasajul de cale ferata nu sunt pozate rețele de Telecomunicații, astfel **nu** se accepta pozarea tubulaturilor pe structura de beton a consolidărilor. In conformitate cu proiectele de utilitati puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, in zona traversării DN1A rețelele de Telecomunicații nu vor fi relocate. Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.
Intrebare 64	**Traseu -** Va rugam sa ne clarificati modul in care se vor realiza devierile si eventualele preluari de clienti ai ROMTELECOM, avand in vedere ca la o vizita in teren am identificat camine cat si cabluri specifice retelelor ROMTELECOM, iar in cadrul documentelor puse la dispozitie de catre autoritate nu am regasit aviz sau vreo referire la aceasta retea.
Raspuns 64	Solutiile referitoare la devierile rețelelor ROMTELECOM (actual ORANGE) se regasesc in cadrul Vol.10.4.1-ORANGE. Avizul ROMTELECOM, actualul Orange Romania Communication SA (denumit OROC), se regaseste in documentatia pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta respectiv Vol.11 - Avize si acorduri. Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.
Intrebare 65	**Traseu -** Va rugam sa ne clarificati cate foraje subterane pentru subtraversari de cabluri aferente retelelor de telecomunicatii vor fi necesare pe traseul lucrarii si eventual pozitia lor. De asemenea diametrul minimal al tubulaturii necesare in foraje.
Raspuns 65	Detaliile referitoare la numarul de forajele subterane pentru subtraversari de cabluri aferente rețelelor de telecomunicații precum si poziția acestora se regasesc in cadrul urmatoarelor volume/planse: - Vol.10.4.1 – ORANGE.pdf. Plansele: P-CST-00122-1-PRD1-SF-01-PS-001-R00 ÷ P-CST-00122-1-PRD1-SF-01-PS-007-R00 - Vol.10.4.2 - GTS - TELECOMpdf. Plansele: P-CST-00122-1-PRD1-SF-01-PS-001-R00 ÷ P-CST-00122-1-PRD1-SF-01-PS-007-R00 - Vol.10.4.3 - INES GROUP.pdf. Plansele: P-CST-00122-1-PRD1-SF-01-PS-001-R00 ÷ P-CST-00122-1-PRD1-SF-01-PS-007-R00 - Vol.10.4.4 - MEDIA SAT.pdf. Plansele: P-CST-00122-1-PRD1-SF-01-PS-001-R00 ÷ P-CST-00122-1-PRD1-SF-01-PS-007-R00 - Vol.10.4.5 – PRIMETELECOM.pdf. Plansele: P-CST-00122-1-PRD1-SF-01-PS-001-R00 ÷ P-CST-00122-1-PRD1-SF-01-PS-007-R00 - Vol.10.4.6 - RCS&RDS.pdf. Plansele: P-CST-00122-1-PRD1-SF-01-PS-001-R00 ÷ P-CST-00122-1-PRD1-SF-01-PS-007-R00

	- Vol.10.4.7 - VODAFONE ROMANIA.pdf. Plansele: P-CST-00122-1-PRD1-SF-01-PS-001-R00 ÷ P-CST-00122-1-PRD1-SF-01-PS-007-R00 Traseul retelelor de telecomunicatii se va realiza prin intermediul a 3 tuburi de protectie HDPE 110 mm, iar diametrul minimal al tubulaturii necesare in foraje se va stabili la faza de PTE functie de tehnologia de executie aleasa de catre Antreprenor definita prin caietele de sarcini de specialitate. Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.
Intrebare 66	**Traseu -** Va rugam sa ne clarificati daca in cadrul lucrarilor de relocare/ deviere trasee de telecomunicatii, instalarea cablurilor si conectarea bransamentelor intra in sarcina antreprenorului, sau acesta pune la dispozitie infrastructura, urmand ca fiecare operator se isi reloce in subteran cablurile si sa isi conecteze abonatii.
Raspuns 66	Pentru lucrările de relocare/ deviere trasee de telecomunicații, instalarea cablurilor si conectarea branșamentelor intra in sarcina Antreprenorului. Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.
Intrebare 67	Pentru retelele electrice este impusa subtraversarea drumului cu foraj dirijat, sau se poate realiza si in varianta sapatura deschisa?
Raspuns 67	Pentru retelele electrice subtraversarea se va realiza cu foraj dirijat in zona DN/DNCB, iar pentru restul zonelor cu sapatura deschisa. Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.
Intrebare 68	Se pastreaza retelele LES MT existente sau se inlocuiesc pe toata lungimea traseului supus extinderii?
Raspuns 68	Conform solutiei prevazute in cadrul Studiului de Fezabilitate, rețelele LES MT se inlocuiesc.
Intrebare 69	Supratraversarea podului CF realizata in configuratie LEA face parte din proiect?
Raspuns 69	Supratraversarea podului CF realizata in configuratie LEA nu face parte din proiect.
Intrebare 70	Va rugam sa confirmati ca spatiul necesar realizarii Organizarii de Santier va fi pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta. Pentru a respecta punctul V din Formularul Nr. 4 Propunerea Tehnica, va rugam sa ne puneti la dispozitie documente si date de identificare din care sa rezulte locatia pe care se va amenaja Organizarea de Santier.
Raspuns 70	Autoritatea Contractanta **nu** va pune la dispozitie suprafata de teren necesara organizarii de santier. Ofertantul va identifica locatia pentru organizarea de santier, va anexa schiţe, documente şi date din care să rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de utilizare a terenului afectat.

	Dorim sa mentionam faptul ca Organizarea de santier este in sarcina Antreprenorului iar pentru terenurile necesare organizarii de santier se vor aplica prevederile art. 12.9.4 lit a) din Cerintele Beneficiarului: *"In afara de cele ce urmeaza, Antreprenorul va limita operatiunile de constructie, in cadrul santierului, la:* a) *in cazul in care Antreprenorul solicita instalatii sau ocuparea temporara a terenului din vecinatatea santierului, in afara limitelor Santierului definite de aceste Cerinte ale Beneficiarului (pentru organizarea de santier, depozitare sau orice alt motiv), el va trebui sa stabileasca cu proprietarii de terenuri, ocupantii si autoritati locale, dupa caz, si pentru a da confirmarea scrisa Supervizorului cu privire la intelegere si la acordul proprietarului/ocupantului, iar Antreprenorul va fi responsabil pentru orice intarziere sau intreruperi care pot apare din cauza unor dificultati in obtinerea sau folosirea instalatiilor sau ocuparea temporara a terenurilor […]"*
Intrebare 71	In RAPORT AUDIT: Stadiul 1 ati mentionat urmatoarele piese scrise/ piese desenate:  BENEFICIAR: Compania Națională de Administrare a Infrastructuri Rutiere S.A. RAPORT AUDIT: Stadiul 1 "Lărgire la 4 benzi DN 1A și măsuri de siguranță rutieră pe sectorul cuprins între Centura București și șoseaua Chitila -Mogoșoaia" PROIECTANT: S.C. Consitrans S.R.L. **E. Opis cu planurile, documentele, standardele și formularele utilizate** ***1. PIESE SCRISE / PIESE DESENATE:*** 1.1. VOL 1 – MEMORIU DE SINTEZĂ; 1.2. VOL 2 - LUCRARI DE DRUMURI; 1.3. VOL 3 - PASAJE PIETONALE; 1.4. VOL 4 - LUCRARI DE CONSOLIDARE; 1.5. VOL 5 - LUCRARI DE SCURGEREA APELOR; 1.6. VOL 6 - SEMNALIZARI SI MARCAJE RUTIERE; 1.7. VOL 7 - LISTE DE CANTITATI SI DEVIZ GENERAL; Va rugam sa ne transmiteti VOL 7 - LISTE DE CANTITATI SI DEVIZ GENERAL, conform punct 1.7 din OPIS, deoarece acesta nu se regaseste in documentatia pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta CNAIR.
Raspuns 71	Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Devizul general estimativ elaborat la faza SF a stat la baza stabilirii valorii estimate a obiectivului, iar aceasta se regaseste in cadrul HG nr. 38/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici. De asemenea, in conformitate cu prevederile HG 907/2016 listele de cantitati se elaboreaza la faza PTE. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. A se vedea in acest sens si definitia de la **ANEXA Nr. 1: DEFINITII** din Cerintele Beneficiarului "***Lista de cantitati se refera la toate cantitatile stabilite***

	<u>prin Proiectul Tehnic de Executie (Detalii de Executie),</u> *aprobata de Supervizor si aprobata de Beneficiar, Clauza 18 [Structura detaliata a pretului] din Conditiile Generale ce vor fi folosite ca documente suport pentru Certificatele de Plata*.", precum si capitolele relevante din Cerintele Beneficiarului privind activitatile de proiectare din cadrul contractului. Totodata, atragem atentia ca ofertantii au obligatia sa isi elaboreze Propunerile Financiare in baza **Formularului nr. 7 "*Formular de Propunere Financiara*"** si a anexelor acestuia, respectiv Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 - PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII.
Intrebare 72	Va rugam sa ne comunicati daca perioada de 10 luni alocata executiei lucrarilor cuprinde si perioada de la 15.11.2023, pana la 14.03.2024.
Raspuns 72	Perioada de 10 luni de executie include si perioada de timp friguros si anume 15.11.2023 - 14.03.2024, in conditiile in care derularea executiei lucrarilor se suprapune si cu aceasta perioada. Pentru efectuarea lucrarilor de executie in perioada 15.11.2023 - 14.03.2024, se vor respecta prevederile reglementării tehnice *Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente*, indicativ C 16–84 (BC 6/1985). Conform C16–1984, punctul 1.6., perioada 15 noiembrie–15 martie este considerată „*perioadă convenţională de timp friguros*”: apare probabilitatea ca zilele friguroase să depăşească 90% din interval. Zi friguroasă se consideră ziua în care temperatura aerului exterior este inferioară valorii de 5º C şi nu există tendinţă de urcare. Categoriile de lucrări pentru care trebuie asigurate măsuri speciale pe timp friguros, menţionate în Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente, indicativ C 16–84, sunt: a) lucrări de pământ, b) fundaţii şi construcţii sub nivelul terenului, c) lucrări de beton, d) montarea prefabricatelor, e) lucrări de zidărie, f) învelitori şi tinichigerie, g) construcţii metalice, h) lucrări de finisaj, i) montare geamuri, j) izolaţii, k) protecţia anticorozivă în construcţii, l) lucrări de zidărie refractară, m) instalaţii interioare. Astfel, pentru lucrările derulate în această perioadă se vor lua măsuri în sensul: - elaborării Proiectului anual pentru organizarea lucrărilor pe timp friguros, conform Capitolului 3 din Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente”, indicativ C 16–84; - menţinerii unei evidenţe a lucrărilor executate în perioada de timp friguros, cuprinzând înregistrările specificate în Capitolul 5 din Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente”, indicativ C 16–84.

	Executanţii lucrărilor de construcţii trebuie să aibă întocmit şi să prezinte, la solicitarea inspectorilor în construcţii, proiectul de organizare a lucrărilor pe timp friguros, împreună cu măsurile ce condiţionează realizarea acestora. În cazul în care temperaturile scăzute nu vor permite continuarea lucrărilor, se vor avea în vedere, conform reglementărilor în vigoare, măsuri de oprire a activităţii la lucrările pentru care normele tehnice prevăd interzicerea execuţiei la temperaturi scăzute. Remintim ca, in conformitate cu cerintele Beneficiatului, pct. 4.13.8.5. Antreprenorul va intocmi documentatia pentru instituirea restrictiilor de circulatie si va obtine avizele si aprobarile conform prevederilor Normelor metodologice, privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinul comun M.I.-M.T. nr.1112/411, publicat in Monitorul Oficial nr. 397/25 august 2000.
Intrebare 73	In cadrul MEMORIULUI DE PREZENTARE, la pagina 48, ati prezentat urmatoarele: Principalele materii prime necesare realizarii proiectului sunt prezentate in tabelul urmator: **Nr. crt** / **Denumire material** / **UM** / **Cantitate estimata** **Lucrari de drum** **Terasamente** 1 Decapare si depozitare pamant vegetal mc 1000 2 Sapatura teren necorespunzator mc 145870 3 **Suprastructura** 1 Fundatie de balast mc 4500 2 Fundatie de balast stabilizat mc 2760 3 Strat de uzura MAS16(4 cm) bitum modificat mp 24300 4 Strat de legatura binder BAD22.4 (6 cm) bitum modificat t 3570 5 Strat de baza mixtura AB31.5 (9 cm) t 5350 **iratie** 1 Beton de ciment C16/20 mc 22 2 Fundatie de balast mc 60 3 Fundatie de nisip mc 10 **Trotuare** Beton de ciment C16/20 mc 1130 **Pasaj suprateran** 1 Beton C35/45 in piloti forati mc 62 2 Otel-beton BST500S in pilotii forati t 4.06 3 Sapatura mc 26 4 Beton simplu C8/10 mc 2 5 Beton armat bancheta cuzineti C35/45 mc 35 **Pasaj subteran** 1 Sapatura mc 2500 2 Beton de egalizare clasa C8/10 la cota finala de excavatie mc 52 3 Beton armat de clasa C30/37 turnat monolit in structura (radier, planseu, pereti caseta si parapeti) mc 680 4 Armatura tip BST500s in structura (radier, planseu pereti caseta si parapeti) t 77.6 Va rugam sa confirmati ca acestea sunt niste canitati estimate si nu cele pe care potentialii ofertanti le vor oferta in cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr.7, tinand cont ca acestea nu sunt cantitati reale de executat.
Raspuns 73	Cantitatile din tabelul mentionat la pag. 28 din cadrul Vol. MEMORIULUI DE PREZENTARE sunt cantitati **estimate** si nu cele pe care ofertanti le vor oferta in cadrul Formularului nr. 7 "Formular de Propunere Financiara" si a anexelor acestuia, respectiv Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 - PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII. A se vedea si **Raspunsul 71** din prezenta Clarificare.

Intrebare 74	In urma analizei documentatiei de atribuire, se constata ca potentialii ofertanti trebuie sa obtina si sa intocmeasca in termen de 2 luni documentatii necesare pentru: - Avize si autorizatii de la detinatorii de utilitati; - Avize si autorizatii de la autoritati locale si Ministerul Transporturilor; - Documentatii tehnice necesare pentru suprafetele de expropriere suplimentare; - Intocmirea documentaiilor necesare autorizatiilor de desfiintare/ construire; - Intocmirea proiectelor tehnice pentru protejarea/ relocarea retelelor de utilitati exisente in amplasament; - Intocmirea proiectelor tehnice pe toate specialitatiile. Prin urmare, va rugam sa puneti la dispozitia potentialilor ofertanti urmatoarele: - Coridorul de expropriere intabulat aferent Proiectului; - Suprafetele de expropriere suplimentare necesare realizarii lucrarilor de proiectare si executie; - Planul de situatie general al retelelor identificate in amplasament la data intocmirii Studiului de Fezabilitate.
Raspuns 74	Coridorul de expropriere se regaseste in cadrul Vol.13.1 - Sudiu topografic. Intocmirea documentației pentru obținerea terenului (achiziții suprafețe suplimentare)" intra in sarcina Antreprenorului, conform Cerintelor Beneficiarului, **pct. 5.1.15**. *Antreprenorul va fi responsabil de indeplinirea tuturor activitatilor prevazute in Anexa nr. 3 din prezentele Cerinte ale Beneficiarului, referitoare la suprafetele de teren suplimentare necesare executiei lucrarilor.* ***Se vor realiza exproprieri suplimentare, numai daca este cazul****, cu respectarea Cerintelor Beneficiarului si doar cu acordul expres al Beneficiarului. In situatia in care Antreprenorul va solicita, iar Beneficiarul va accepta efectuarea de exproprieri suplimentare pentru imobile aflate in afara coridorului de expropriere, pentru toata perioada de realizare a activitatilor prevazute in Anexa 3 la Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul nu va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie si/sau la plata unor Costuri suplimentare in conditiile in care intarzierile in realizarea exproprierilor suplimentare se datoreaza culpei Antreprenorului, sau exproprierile suplimentare devin necesare ca urmare a aplicarii Sub-clauzei 37.11 [Propunere de Modificare initiata de Antreprenor]*. Planul de situatie al retelelor identificate in amplasament la data intocmirii Studiului de Fezabilitate se regasesc in cadrul volumelor de specialitate pentru fiecare dintre utilitati. De asemenea, conform prevederilor HG 907/2016, planul retelelor de utilitati se realizeaza la faza PAC.
Intrebare 75	Solicităm să eliminați prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referință 17.6) relativ la aplicarea Antreprenorului a unor penalizări de 15.000 lei pe zi de întârziere în transmiterea programului de execuție sau a programului de execuție actualizat/revizuit/completat, în sensul diminuării acestor penalizări sau înlocuirii lor cu obligația antreprenorului la plata de daune interese în limita prejudiciului efectiv suferit de către Beneficiar din culpa antreprenorului și dovedit. Penalitățile menționate la punctul 5 din acordul contractual (referință 17.6) sunt excesive și nerezonabile în raport de practica în domeniu, respectiv în raport de

	art. 12 din Legea nr. 72/2013 și ale Capitolul IV, punctul 5 din Ordinul 543/2013 mai sus enunțate. Facem trimitere în acest sens la prevederile art. 1533 din Codul Civil, potrivit cărora: *Debitorul răspunde numai pentru prejudiciile pe care le-a prevăzut sau pe care putea să le prevadă ca urmare a neexecutării la momentul încheierii contractului, afară de cazul în care neexecutarea este intenţionată ori se datorează culpei grave a acestuia. Chiar şi în acest din urmă caz, daunele-interese nu cuprind decât ceea ce este consecinţa directă şi necesară a neexecutării obligaţiei*. Facem trimitere totodată, și la: - art. 12 din Legea nr. 72/2013 – practica sau clauza contractuală prin care se stabileşte în mod vădit inechitabil, în raport cu creditorul, termenul de plată, nivelul dobânzii pentru plata întârziată sau al daunelor-interese suplimentare este considerată abuzivă. - Capitolul IV, punctul 5 din Ordinul 543/2013 de adoptare a ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene (...) potrivit căruia: Se personalizează clauzele contractuale incluse în documentaţia de atribuire publicată în funcţie de complexitatea obiectului contractului de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit. Dacă sunt clauze nerezonabile, care nu sunt în acord cu practicile de piaţă, există riscul de a exclude operatorii economici serioşi. (...) Pentru evitarea acestor consecinţe, este recomandabil ca documentaţia de atribuire şi clauzele de execuţie să fie conforme cu standardele de piaţă în domeniu.
Raspuns 75	Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca prevederea penalitatii in discutie este motivata de garantiile necesare Autoritatii Contractante pentru realizarea cu celeritate a acestui obiectiv de investitie de importanta majora al carui obiectiv consta in *Proiectare si Executie Largire la 4 benzi DN1A si masuri de siguranta rutiera pentru sectorul cuprins intre Centura Bucuresti si intersectia cu soseaua Chitila-Mogosoaia*. Totodata, avand in vedere ca penalitatile se afla in stransa legatura de culpa partilor si sunt aplicate numai in situatia in care Contractantul nu isi indeplineste obligatiile in termenele si conditiile contractuale, cuantumul acestora nu ar trebui sa reprezinte o ingrijorare pentru orice operator economic care urmareste indeplinirea contractului conform principiului bunei-credinte. Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca, potrivit doctrinei in materie, libertatea contractuala a persoanelor publice prezinta particularitati in raport cu libertatea contractuala a persoanelor private. In acest sens, precizam ca principala caracteristica a contractelor administrative (contractul de achizitie publica fiind asimilat, potrivit legii, actului administrativ) este tocmai inegalitatea de pozitie in care se gasesc partile contractante: administratia, in calitate de purtatoare a prerogativelor de putere publica si, in consecinta superioara particularului, poate stabili unele clauze contractuale si impune sanctiuni. Acest aspect rezulta din faptul ca aceste contracte incheiate de administratia publica au anumite caracteristici speciale impuse de interesul public care sta la fundamentul incheierii si executarii acestora, fiind considerate contracte publice. Astfel, autoritatea contractanta nu considera ca modificarea propusa de operatorul economic este in interesul public.

	Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.1. - Sub-clauza 17.6 din Acordul Contractual.
Intrebare 76	Pentru motivele detaliate în cuprinsul clarificării nr. 1 de mai sus solicităm să eliminați prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referință 36.4) și să stabiliți penalități pentru situațiile reglementate de sub clauza 36.4 la un procent rezonabil. Propunem o penalitate de 0,001% pe zi de întârziere din valoarea obligațiilor neexecutate la termen/executate cu întârziere.
Raspuns 76	A se vedea Raspunsul nr. 19 din prezenta Clarificare.
Intrebare 77	Pentru motivele dezvoltate în cuprinsul clarificării nr. 1 de mai sus solicităm să eliminați prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referință 50.3, punctul 1) relativ la aplicarea Antreprenorului a unor penalizări de 15.000 lei/zi pentru nemobilizarea utilajelor/echipamentelor, în sensul diminuării acestor penalizări sau înlocuirii lor cu obligația antreprenorului la plata de daune interese în limita prejudiciului efectiv suferit de către Beneficiar din culpa antreprenorului și dovedit.
Raspuns 77	Autoritatea Contractanta se afla in imposibilitatea de a percepe penalitati mai mici decat cele prevazute in Acordul Contractual intrucat, raportat la valoarea contractului, aceasta penalizare ar deveni derizorie, nemaiavand finalitatea avuta in vedere de catre legiuitor. Totodata, invederam faptul ca, potrivit doctrinei in materie, libertatea contractuala a persoanelor publice prezinta particularitati in raport cu libertatea contractuala a persoanelor private. In acest sens, precizam ca principala caracteristica a contractelor administrative (contractul de achizitie publica fiind asimilat, potrivit legii, actului administrativ) este tocmai inegalitatea de pozitie in care se gasesc partile contractante: administratia, in calitate de purtatoare a prerogativelor de putere publica si, in consecinta superioara particularului, poate stabili unele clauze contractuale si impune sanctiuni. Acest aspect rezulta din faptul ca aceste contracte incheiate de administratia publica au anumite caracteristici speciale impuse de interesul public care sta la fundamentul incheierii si executarii acestora, fiind considerate contracte publice. Astfel, autoritatea contractanta nu considera ca modificarea propusa de operatorul economic este in interesul public. Mai mult, prevederea penalitatii in discutie este motivata de garantiile necesare Autoritatii Contractante pentru realizarea cu celeritate a obiectivului de interes national, acestea fiind aplicate numai in situatia in care Contractantul nu isi indeplineste obligatiile in termenele si conditiile contractuale. Mai mult decat atat, aceasta penalitate se va aplica pentru o inactiune a Antreprenorului si anume nemobilizarea utilajelor/ echipamentelor cu care acesta a castigat licitatia de achizitie publica. Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.1. - Sub-clauza 50.3 punctul 1.
Intrebare 78	Pentru motivele dezvoltate în cuprinsul clarificării nr. 1 de mai sus solicităm să eliminați prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referință 50.3, punctul 2) relativ la aplicarea Antreprenorului a unor penalizări de 5.000 lei/zi pentru nemobilizarea personalului, în sensul diminuării acestor penalizări sau înlocuirii lor cu obligația antreprenorului la plata de daune interese în limita prejudiciului efectiv suferit de către Beneficiar din culpa antreprenorului și dovedit.
Raspuns 78	A se vedea justificarea de la **Raspunsul 77** din prezenta Clarificare.

	Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.1. - Sub-clauza 50.3. pct. 2 din Acordul Contractual.
Intrebare 79	Pentru motivele dezvoltate în cuprinsul clarificării nr. 1 de mai sus solicităm să eliminați prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referință 50.3, punctul 3) relativ la aplicarea Antreprenorului a unor penalizări de 10.000 lei/zi pentru nerespectarea prevederilor subclauzei 27.2, în sensul diminuării acestor penalizări sau înlocuirii lor cu obligația antreprenorului la plata de daune interese în limita prejudiciului efectiv suferit de către Beneficiar din culpa antreprenorului și dovedit.
Raspuns 79	A se vedea justificarea de la **Raspunsul 77** din prezenta Clarificare. Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.1. - Sub-clauza 50.3. pct. 3 din Acordul Contractual.
Intrebare 80	Pentru motivele dezvoltate în cuprinsul clarificării nr. 1 de mai sus solicităm să eliminați prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referință 50.3, punctul 4) relativ la aplicarea Antreprenorului a unor penalizări de 10.000 lei/zi pentru nerespectarea prevederilor subclauzei 27.3, în sensul dimunării acestor penalizări sau înlocuirii lor cu obligația antreprenorului la plata de daune interese în limita prejudiciului efectiv suferit de către Beneficiar din culpa antreprenorului și dovedit.
Raspuns 80	A se vedea justificarea de la **Raspunsul 77** din prezenta Clarificare. Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.1. - Sub-clauza 50.3. pct. 4 din Acordul Contractual.
Intrebare 81	Pentru motivele detaliate în cuprinsul clarificării nr. 1 de mai sus solicităm să eliminați prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referință 50.3, punctul 5) relativ la aplicarea Antreprenorului a unor penalizări de 10.000 lei/eveniment pentru schimbarea personalului cheie al Antreprenorului + 1000 lei /zi de intarziere incepand cu a 31 – a zi de la data la care este necesara inlocuirea oricaruia dintre membrii personalului cheie și până la data comunicării aprobării de către Beneficiar a noului personal cheie, în sensul diminnării acestor penalizări sau înlocuirii lor cu obligația antreprenorului la plata de daune interese în limita prejudiciului efectiv suferit de către Beneficiar din culpa antreprenorului și dovedit.
Raspuns 81	A se vedea justificarea de la **Raspunsul 77** din prezenta Clarificare. Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.1. - Sub-clauza 50.3. pct. 5 din Acordul Contractual.
Intrebare 82	Pentru motivele detaliate în cuprinsul clarificării nr. 1 de mai sus solicităm să eliminați prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referință 50.3, punctele 6 si 7) și să stabiliți penalități pentru situațiile reglementate la un procent uzual. Propunem o penalitate de 0,01% pe zi de întârziere din valoarea garantiei de bună executie.
Raspuns 82	A se vedea justificarea de la **Raspunsul 77** din prezenta Clarificare. Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.1. - Sub-clauza 50.3. pct. 6 si 7 din Acordul Contractual.
Intrebare 83	Pentru motivele dezvoltate în cuprinsul clarificării nr. 1 de mai sus solicităm să eliminați prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referință 50.3, punctul 8) relativ la aplicarea Antreprenorului a unor penalizări de 5.000 lei/zi pentru netransmiterea propunerii de prețuri unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic de execuție, precum și nedefalcarea acestor prețuri unitare conform sub clauzei 18.1, în sensul diminuării acestor penalizări sau înlocuirii lor cu obligația antreprenorului la plata de daune interese în limita prejudiciului efectiv suferit de către Beneficiar din culpa antreprenorului și dovedit.

Raspuns 83	A se vedea justificarea de la **Raspunsul 77** din prezenta Clarificare. Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.1. - Sub-clauza 50.3. pct. 8 din Acordul Contractual.
Intrebare 84	La sub clauza 33.1 din condițiile generale solicităm să indicați intervalul de timp maxim dintre data ordinului administrativ de începere a lucrărilor și data de începere a lucrărilor.
Raspuns 84	Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca, in conformitate cu prevederile Clauzei 33 - Inceperea din H.G. nr. 1/2018, cu modificările si completările ulterioare, in cadrul contractului de proiectare si execuţie, legiuitorul a prevăzut emiterea a 2 Ordine, respectiv: Ordinul Administrativ de Incepere a Activitatii de Proiectare si Ordinul Administrativ de Incepere a Execuţiei Lucrărilor: „*33.1 In termen de 15 zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizând va emite Ordinul Administrativ de începere a Activităţii de Proiectare către Antreprenor cu notificarea Datei de începere a Activităţii de Proiectare.* *33.2 Supervizorul va trimite Antreprenorului Ordinul Administrativ de începere a Execuţiei Lucrărilor numai in condiţiile in care a fost finalizat Proiectul Tehnic de Execuţie si au fost obţinute Autorizaţiile de Construire. Supervizorul va stabili în cadrul Ordinului Administrativ de începere a Execuţiei Lucrărilor Data de începere a Lucrărilor, dată care nu va depăşi 30 de zile de Ia momentul transmiterii Ordinului Administrativ de începere a Execuţiei Lucrărilor. Ordinul Administrativ de Incepere a Execuţiei Lucrărilor poate fi emis şi pe Secţiuni/Sectoare.* *33.3 Antreprenorul va începe execuţia Lucrărilor la Data de începere a Lucrărilor şi va continua execuţia Lucrărilor cu promptitudine şi fără întârzieri.*" Aşadar, rezulta, in mod explicit din textul de lege faptul ca, in cadrul contractului de proiectare si execuţie, se emit 2 Ordine si nu unul singur. Cu privire la intervalul de timp dintre Data emiterii Ordinului Administrativ de începere a Lucrărilor si Data de Incepere a Lucrărilor, Autoritatea Contractanta precizeaza ca acest interval a fost stabilit de către legiuitor si anume de maxim 30 de zile, termenul fiind unul rezonabil, Autoritatea Contractanta asigurand toti operatorii economici interesati de participarea la aceasta procedura de achiziţie publica de faptul ca interesul acesteia este ca obiectivul de investitii sa se realizeze in cel mai scurt timp, astfel incat acesta sa devină funcţional si operabil.
Intrebare 85	Solicităm să eliminați prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referință clauza 49.3) relativ la impunerea unui procent pentru indirecte și profit de 5 % din sumele reale plătite. Potrivit art. 3.3.3. din ORDINUL Nr. 1568/15.10.2002 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări și obiecte de construcții pentru investiții realizate din fonduri publice”, indicativ P 91/1 – 02, cota de cheltuieli indirecte se stabilește de către fiecare unitate de execuție pe baza propriilor analize. Așadar, stabilirea nivelului cheltuielilor indirecte se determină pe baza propriilor analize ale operatorului economic, fiind deci atributul exclusiv al ofertantului, fără ca o terță parte să poată impune ofertarea unui anumit cuantum. În aceeași idee și stabilirea cotei de profit este proprie operatorului economic. Aceasta întrucât, prețul ofertat înglobează costuri care sunt determinate de către ofertant în funcție de resursele care vor fi alocate pentru execuția lucrărilor

	(materiale, resursele umane, echipamente etc.) și altor elemente specifice locației în care se execută lucrarea, iar autoritatea contractantă nu este în măsură să cunoască toate costurile pe care își fundamentează operatorul economic oferta financiară, sens în care nu este în măsură să impună vreo cotă pentru indirecte și profit. Pe cale de consecință, solicităm eliminarea oricărui prag procentual impus ofertanților pentru cheltuielile indirecte și profit și permiterea operatorilor economici să-și stabilească propriile procente. În acordul contractual urmează a fi indicată cotă de indirecte și profit ofertată de către operatorul economic declarat câștigător.
Raspuns 85	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca *Suma pentru cheltuieli indirecte si profit* a fost inscrisa la Art. 5.1. - Sub-clauza 49.3 in Acordul Contractual, in conformitate cu prevederile modelului de Acord Contractual aferent H.G. nr. 1 - Anexa nr. 2 - *Conditii Generale pentru contractele de proiectare executie de lucrari*. Astfel, Autoritatea Contractanta se afla in imposibilitatea de a elimina procentul de 5% prevazut in actul normativ de referinta. Totodata, invederam faptul ca, potrivit doctrinei in materie, libertatea contractuala a persoanelor publice prezinta particularitati in raport cu libertatea contractuala a persoanelor private. In acest sens, precizam ca principala caracteristica a contractelor administrative (contractul de achizitie publica fiind asimilat, potrivit legii, actului administrativ) este tocmai inegalitatea de pozitie in care se gasesc partile contractante: administratia, in calitate de purtatoare a prerogativelor de putere publica si, in consecinta superioara particularului, poate stabili unele clauze contractuale si impune sanctiuni. Acest aspect rezulta din faptul ca aceste contracte incheiate de administratia publica au anumite caracteristici speciale impuse de interesul public care sta la fundamentul incheierii si executarii acestora, fiind considerate contracte publice. Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.1. - Sub-clauza 49.3 din Acordul Contractual.
Intrebare 86	Solicităm eliminarea mențiunilor ”*care va fi apreciat de către acesta*”, mențiune care se găsește în cuprinsul prevederilor de la art. 5.2 din Acordul contractual (5.2 alin. 13, alin. 14) în legătură cu executarea garanției în limita prejudiciului creat. Mențiunea mai sus citată excede prevederilor art. 41 din HG 395/2016, pe care îl citǎm mai jos: *Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.* În considerarea prevederilor legale mai sus citate, se impune eliminarea mențiunii ”*care va fi apreciat de către acesta*”.
Raspuns 86	Autoritatea Contractanta precizeaza ca, in contextul obligativitatii urmaririi interesului national, prin indeplinirea obiectului contractului, introducerea in

	clauzele contractuale a prevederilor invocate de operatorul economic, are ca scop necesitatea asigurarii Autoritatii Contractante de realizarea cu celeritate a obiectivului de interes national. Autoritatea Contractanta reitereaza faptul ca prevederile clauzelor contractuale se afla in stransa legatura de culpa partilor. **Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.2., alin. (13) si alin. (14), din Acordul Contractual.**
Intrebare 87	Solicităm completarea art. 5.2 alin. 14, lit. b) din Acordul contractual după cum urmează: *Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligaţia de a emite pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat Beneficiarului/Autoritatii Contractante, şi care va fi apreciat de către acesta, în oricare dintre cazurile de mai jos:* *b) Antreprenorul nu plăteşte integral Beneficiarului/Autoritatii Contractante, în termen de 30 de zile, o sumă datorată, convenită de către Antreprenor sau Decisă de către Supervizor potrivit prevederilor Clauzei 69c [Decizia Supervizorului], exclusiv în cazul în care Decizia Supervizorului este finală și obligatorie pentru părți.* Completarea este justificată în condițiile în care Decizia Supervizorului poate fi contestată de oricare din părți și ulterior modificată, sens în care este abuzivă executarea garanției înainte ca Decizia Supervizorului să fie finală și obligatorie pentru părți. În caz contrar am fi în situația încălcării prevederilor condițiilor generale de contract și a prevederilor legale (constituționale) care permit accesul la justiție și dublul grad de jurisdicție.
Raspuns 87	Autoritatea Contractanta precizeaza ca, in contextul obligativitatii urmaririi interesului national, prin indeplinirea obiectului contractului, introducerea in clauzele contractuale a prevederilor invocate de operatorul economic, are ca scop necesitatea asigurarii Autoritatii Contractante de realizarea **cu celeritate** a obiectivului de interes national, Contractantul avand posibilitatea de a pune in aplicare prevederile Clauzei 70. *Dispute si arbitraj*, in situatia in care se considera vatamat intr-un drept al său.
Intrebare 88	Solicităm modificarea art. 5.4 alin. 1, subpunctul 13 din acordul contractual după cum urmează: *Prelungirea Duratei de Executie. Aceasa se realizeaza in baza mecanismului contractual prevazut la Clauza 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie] din Conditiile Generale fara a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in contract, în cazul în care prelungirea duratei este imputabilă Antreprenorului;* Completarea este justificată în condițiile în care Antreprenorul nu poate fi penalizat decât în situațiile în care prelungirea duratei de execuție a survenit din cauze imputabile acestuia
Raspuns 88	In conformitate cu prevederile Clauzei 35 *Prelungirea Duratei de Executie*, Sub-clauza 35.1. *„Antreprenorul va actiona in mod diligent pentru a preveni aparitia oricaror intarzieri si pentru a limita efectele intarzierilor aparute pe Santier. [...]”*. Autoritatea Contractanta precizeaza ca, prin inserarea acestei clauze contractuale de la 5.4. alin. (1) pct. 13), **doreste sa se asigure ca obiectul contractului este indeplinit in durata contractului, de catre Contractant**, precum si de faptul ca acesta intelege importanta obiectivului. Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.4, alin. (1), pct. 13), din Acordul Contractual.

Intrebare 89	Solicităm modificarea art. 5.5 alin. 2 din Acordul Contractual, astfel încât acesta să prevadă posibilitatea de modificare a contractului în toate ipotezele permise de art. 221 din Legea 98/2016. Aceasta întrucât, la art. 221 din legea 98/2016 sunt prevăzute mai multe situații de modificare, nu doar situația de la alin. 1 , lit. f) menționată în acordul contractual, sens în care clauza este limitativă și reduce în mod nejustificat posibilitatea de modificare a contractului, cu încălcarea prevederilor legale.
Raspuns 89	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca in tot continutul Acordului Contractual sunt invocate diferite situatii prevăzute la Art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările si completările ulterioare care se vor aplica prezentului contract de achiziţie publica. Cu titlu de exemplu, invocam Clauza 5.1. - sub-clauza 48.8; Clauza 5.4. alin. (1). De asemenea a se citi cu atentie prevederile clauzei 5.5 alin (2) din Acordul Contractual: "*Contractul poate fi modificat, fară organizarea unei noi proceduri de atribuire, si atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ condiţiile prevederilor art. 221 alin. (1) lit. f) din Lenea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare. In situatia prevăzută la art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, in cazul in care se efectueaza mai multe modificări succesive, valoarea modificărilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificărilor succesive realizate numai in baza lit. f) fara a se lua in calcul si modificările care nu conduc la majorarea Preţului Contractului si fara a se aduce atingere caracterului general al contractului.*" Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.5. alin. (2) din Acordul Contractual.
Intrebare 90	Pentru motivele prevăzute în cuprinsul clarificării nr. 14 de mai sus solicităm modificarea art. 5.5 alin. 5 din acordul contractual după cum urmează: *Clauzele de revizuire/modificările contractuale nu vor aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in Contract, în cazul în care acesta este în culpă.*
Raspuns 90	Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca penalitatile se afla in stransa legatura de culpa partilor si sunt aplicate numai in situatia in care Antreprenorul nu isi indeplineste obligatiile in termenele si conditiile contractuale. Mai mult decat atat, nici cuantumul acestora nu ar trebui sa reprezinte o ingrijorare pentru orice operator economic care urmareste indeplinirea contractului conform principiului bunei-credinte. Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.5., alin. (5) din Acordul Contractual.
Intrebare 91	Solicităm modificarea prevederilor art. 5.6, alin. 2 din acordul contractual în sensul precizării că termenul de plată curge de la data primirii certificatului de plată/certificatului final de plată de catre Beneficiar. Termenul de plată stabilit în acordul contractual încalcă prevederile sub clauzelor 50.4 și 51.3 din Condițiile generale, sens în care se impune modificarea lor. Vă reamintim că potrivit HG 1/2018 pot fi modificate din condiții speciale doar o parte din clauzele HG 1/2018, restul fiind obligatorii. Or, sub clauzele 50.4 și 51.3 nu se află printre clauzele ce pot fi amendate. Prin urmare, modificările din acordul contractual cu privire la momentul de la care curge termenul de plată sunt nelegale și încalcă prevederile HG 1/2018.
Raspuns 91	Autoritatea Contractanta precizeaza ca prevederile Sub-clauzei art. 5.6, alin. (2) respecta prevederile Conditiilor Generale din H.G. nr. 1/2018 - Anexa nr. 2. Tododata, a se vedea prevederile Art. 5.6 din Acordul Contractual, potrivit caruia:

	"5.6. (1) ***Sub-clauza 50.4 [Plata], Sub-clauza 51.3 [Plata finala],*** *Clauza 52 [Plati directe catre Subcontractanti], Clauza 53 [Plati intarziate], Clauza 54 [Plati catre terti]* ***din Condiţiile Generale se vor aplica potrivit prevederilor contractuale în măsura în care acestea sunt conforme cu prevederile Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contractele încheiate între profesionişti şi între aceştia şi Beneficiar cu modificări şi completări ulterioare. În situaţia în care există vreo contradicţie între prevederile Condiţiilor Contractuale şi Legea nr. 72/2013 cu modificări şi completări ulterioare, vor prevala dispoziţiile legale incidente."***
Intrebare 92	Solicităm eliminarea prevederilor art. 5.6, alin. (6) din acordul contractual cu privire la obligația de plată a sumelor stabilite de către organele abilitate de lege și includerea acestora în certificatul final de plată. Clauzele sunt abuzive și încalcă dreptul antreprenorului de a contesta legalitatea solicitărilor de bani. Măsurile stabilite de către organele de control sunt obligatorii pentru autoritatea contractantă, nu și pentru antreprenor. Antreprenorul are dreptul de a se opune solicitării autorității de a cere restituirea unor sume de bani în măsura în care consideră că plățile au fost făcute în mod legal. Clauzele din prezent încalcă dreptul la apărare reglementat de art. 24 din Constituția României și de art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Pe cale de consecință, se impune eliminarea clauzelor în discuție. De asemenea, clauzele sunt abuzive fiind afectate de o condiție pur potestativă. Antreprenorul nu poate cunoaște la momentul semnării contractului natura, temeinicia și nici întinderea eventualelor prejudicii/sume ce ar putea fi stabilite de organele de control/organele abilitate. Pe cale de consecință, nu-și poate asuma fără drept de opoziție plata unor sume de bani nedeterminate sau determinabile. Nu în ultimul rând, inclusiv autoritatea contractantă are dreptul de a se opune măsurilor dispuse de către organele abilitate și abia apoi poate să se îndrepte împotriva antreprenorului, acesta din urma având dreptul de a se apăra vizavi de sumele pretinse la plată de către achizitor. Pe cale de consecință, se impune eliminarea articolului în discuție sau modificarea acestuia în sensul că antreprenorul va datora sumele stabilite de către organele abilitate în măsura în care obligația de plată a acestora va fi stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
Raspuns 92	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca are obligatia recuperarii sumelor declarate necuvenite si/sau nelegale achitate Antreprenorului, in cazul in care, pe parcursul derularii contractului survine aceasta situatie. Autoritatea Contractanta reitereaza faptul ca sumele invocate in cadrul acestei clauze contractuale sunt eventuale sume declarate necuvenite si/sau nelegale si nu sumele la care Antreprenorul este indreptatit. Avand in vedere cele anterior mentionate, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.6. alin. (6) din Acordul Contractual.
Intrebare 93	Solicităm clarificarea prevederilor din condițiile speciale de la subclauza 5.1 – Sarcinile supervizorului, alin. (2), lit. i), în sensul indicării în concret a criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii de bunuri/materiale, prestatorii de servicii, subontractantii, persoanele care închiriază utilaje pentru a fi aprobată contractarea cu aceștia. De asemenea, solicităm să clarificați cine obține acordul prealabil al Beneficiarului și ce se întâmplă în situația în care Supervizorul și Beneficiarul nu

	se pun de acord cu privire la aprobarea terților în execuție (unul aprobă introducerea, iar celalalt refuză).
Raspuns 93	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca trebuie respectate prevederile Conditiilor Generale de Contract, din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 1/2018 *(spre exemplu Sub-clauza 7.4),* precum si prevederile Documentatiei de atribuire in ceea ce priveste furnizorii de bunuri/materiale, prestatorii de servicii, subcontractantii, persoanele care închiriază utilaje, cu urmarirea respectarii indeplinirii obiectului contractului. Autoritatea Contractanta considera suficient de explicita prevederea Sub-clauzei 5.1 din Conditiile Speciale pentru Contract prin care Supervizorul are responsabilitati cu privire la aprobarea furnizorilor de bunuri/materiale, prestatorilor de servicii, subcontractantilor activitatilor care sunt in legatura directa cu executia lucrarilor. Acordul prealabil al Beneficiarului va fi obtinut de catre Supervizor, cu conditia respectarii prevederilor mai sus mentionate.
Intrebare 94	Solicităm modificarea/eliminarea subclauzei 9.1 din condițiile speciale în sensul de a preciza că accesul pe șantier se va permite cel mai târziu la data de începere a lucrărilor. În lipsa accesului pe șantier antreprenorul nu poate începe lucrările, inclusiv lucrările de proiectare. Or, potrivit sub clauzei 33.2 din Condițiile generale Antreprenorul va începe execuția lucrărilor cât mai curând posibil după data de începere. De asemenea, potrivit acordului contractual durata de execuție este de 12 luni de la data de începere. În contextul în care santierul se predă în termen de maxim 3 luni de la data de începere înseamnă că Antreprenorul nu va putea lucra aproximativ 3 luni din cele 12 cât este durata de execuție, fapt ce nu poate fi primit. Ar însemna că în realitate durata de execuție este de 9 luni, nu de 12 luni, în condițiile în care accesul se permite în 3 luni de la data de începere.
Raspuns 94	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca prevederile Sub-clauzei 9.1 din Conditiile Speciale de Contract fac referire la **Accesul pe Santier** al Antreprenorului pentru **inceperea executiei efectiva a lucrarilor,** activitatea de proiectare fiind anterioara inceperii executiei lucrarilor si realizandu-se in conformitate cu Clauza 19 din Conditiile Generale de Contract coroborat cu prevederile Sub-Clauzei 19.2 din Conditiile Speciale de Contract. Prin urmare, termenul de **maxim** 3 luni in care se acorda Accesul pe Santier nu afecteaza activitatea de Proiectare, Sub-clauza 9.1 din Conditii Speciale reglementand accesul in santier al Antreprenorului pentru **executia de lucrari**. Astfel, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Sub-clauzei 9.1 din Conditiile Speciale de Contract. De asemenea a se vedea si prevederile Clauzei 33 - Inceperea din H.G. nr. 1/2018, cu modificările si completările ulterioare, unde Legiuitorul a prevăzut emiterea a 2 Ordine, respectiv: Ordinul Administrativ de Incepere a Activitatii de Proiectare si Ordinul Administrativ de Incepere a Execuţiei Lucrărilor. „*33.1 In termen de 15 zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul va emite Ordinul Administrativ de Incepere a Activităţii de Proiectare către Antreprenor cu notificarea Datei de Incepere a Activităţii de Proiectare.* *33.2 Supervizorul va trimite Antreprenorului Ordinul Administrativ de Incepere a Execuţiei Lucrărilor numai în condiţiile în care a fost finalizat Proiectul Tehnic de Execuţie si au fost obţinute Autorizaţiile de Construire. Supervizorul va stabili în cadrul Ordinului Administrativ de Incepere a Execuţiei Lucrărilor Data de Incepere a Lucrărilor, dată care nu va depăşi 30 de zile de la momentul transmiterii Ordinului Administrativ de Incepere a Execuţiei Lucrărilor. Ordinul*

	Administrativ de Incepere a Execuţiei Lucrărilor poate fi emis şi pe Secţiuni/Sectoare. *33.3 Antreprenorul va începe execuţia Lucrărilor la Data de Incepere a Lucrărilor şi va continua execuţia Lucrărilor cu promptitudine şi fără întârzieri*." Aşadar, rezulta, in mod explicit din textul de lege faptul ca, in cadrul contractului de proiectare si execuţie, se emit 2 Ordine si nu unul singur.
Intrebare 95	Solicităm completarea prevederilor de la subclauza 10.1, paragraful al doilea din Condițiile speciale după cum urmează: Daca este necesar, Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza si/sau completa in numele Beneficiarului toate avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism emis pentru "autorizatie de construire" si va fi responsabil pentru obtinerea si mentinerea in valabilitate a avizelor/acordurilor/certificatelor necesare pe parcursul derularii lucrarilor. În situația în care prelungirea acestor avize nu este imputabilă Antreprenorului, costurile aferente prelungirii valabilității vor fi suportate de către Beneficiar. Aceasta întrucât, pot exista întârzieri în procesul de aprobare și emitere a autorizației de construire care nu se datorează Antreprenorului, sens în care avizele ar putea expira și implicit ar trebui reînoite. Or, costurile aferente nu pot fi imputate antreprenorului, atâta timp cât necesitatea prelungirii avizelor nu este o consecință a acțiunilor antreprenorului.
Raspuns 95	Autoritatea Contractanta mentine ***prevederile celui de-al doilea paragraf al Sub-Clauzei 10.1 (Responsabilităţi privind Autorizaţiile de Construire)*** intrucat aceasta prevedere a fost stabilita in baza **Clauzei 10 - "Autorizaţii şi asistenţă privind Legea" - subclauza 10.1 litera b)** din Hotararea de Guvern nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: ***"****[…] (a) Beneficiarul a obţinut (sau va obţine) certificatul de urbanism şi actul de reglementare în domeniul mediului, împreună cu acordurile/avizele/autorizaţiile pentru Lucrările Permanente (şi orice alte aprobări) descrise în Cerinţele Beneficiarului ca fiind deja obţinute (sau în curs de obţinere) de către Beneficiar; Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate eşecului obţinerii acestor certificate şi aprobări.* Mai mult decat atat, in conformitate cu prevederile Clauzei 10 din Hotatarea de Guvern nr. 1/2018, pentru prevenirea intarzierilor in procesul obtinerii documentelor, al autorizatiilor si/sau acordurilor, Antreprenorul poate beneficia oricand de asistenta Autoritatii Contractante. A se vedea in acest sens prevederile Art. 10.3 si Art. 10.4 aferente Clauzei 10 *"Autorizaţii şi asistenţă privind Legea"* din Hotararea de Guvern nr. 1/2018: ***"10.3*** *Antreprenorul poate solicita asistenţa Beneficiarului în obţinerea documentelor Legii şi altor informaţii similare, care nu ar fi accesibile în mod facil şi care pot afecta Antreprenorul în îndeplinirea obligaţiilor ce li revin prin Contract.* ***10.4*** *Beneficiarul va oferi asistenţă rezonabilă Antreprenorului, la cererea sa, pentru autorizaţii, acorduri sau aprobări necesare si fie obţinute de către Antreprenor potrivit prevederilor Legii."* Totodata, elaboarea Proiectului pentru Autorizarea Executiei Lucrarilor si a Proiectului Tehnic de Executie sunt in sarcina Antreprenorului, acesta fiind responsabil cu stabilirea solutiilor tehnice finale, este normal ca acesta sa fie responsabil si de obtinerea/ reactualizarea/ completarea avizelor/ acordurilor/ certificatelor necesare pe parcursul derularii lucrarilor, in conformitate cu Proiectul Tehnic de Executie elaborat de catre Antreprenor.

	Astfel, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Sub-clauzei 10.1 din Conditiile Speciale de Contract
Intrebare 96	Solicităm completarea prevederilor de la subclauza 10.1, paragraful al patrulea din Condițiile speciale după cum urmează: Antreprenorul va fi responsabil cu realizarea/obtinerea tuturor studiilor de specialitate si intocmirea oricarei documentatii tehnice in vederea obtinerii de catre Beneficiar a Autorizatiei/Autorizatiilor de Construire sau a refacerii/revizuirii/ completarii/ reavizarii actului de reglementare in domeniul mediului, conform prevederilor legale in vigoare precum si ca urmare a solicitarilor venite din partea autoritatilor emitente. În cazul în care aceste refaceri/revizuiri/ completari/ reavizari se datorează unor cerințe suplimentare venite din partea Beneficiarului sau autorităților emitente costurile aferente vor fi suportate de Beneficiar. Aceasta întrucât, reprezintă o modificare ce nu a fost prinsă în oferta operatorului economic și nu se datorează culpei Antreprenorului.
Raspuns 96	A se vedea justificarea de la **Raspunsul 95** din prezenta Clarificare, referitoare la prevederile Sub-clauzelor 10.3 si 10.4 aferente Clauzei 10 - *"Autorizaţii şi asistenţă privind Legea"* din Hotatarea de Guvern nr. 1/2018. Antreprenorul este cel responsabil cu realizarea studiilor care stau la baza obtinerii Autorizatiei de Construire, iar in conditiile in care aceste institutii modifica, completeaza sau solicita rectificari ale documentatiilor realizate de catre Antreprenor, tot acesta are obligatia de a le rectifica/revizui. Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.1. - Sub-clauza 50.3, pct. 8, din Acordul Contractual.
Intrebare 97	Solicităm eliminarea prevederilor de la subclauza 10.1, paragrafele 5, 6, 7 și 8 din Condițiile speciale, având în vedere că potrivit legii 50/1991 obligația obținerii autorizației de construire/demolare este în sarcina Achizitorului. De asemenea, tot achizitorul este responsabil de acceptarea/asumarea modificarilor/ completarilor/ sustinerea documentatiei direct cu Emitentul Autorizatiei Clauza este excesivă și dispoporționată și încalcă prevederile legale incidente.
Raspuns 97	Autoritatea Contractanta precizeaza ca este necesar sa se aiba in vedere faptul ca, in Conditiile Speciale de Contract - Sub-clauza 10.1, s-a precizat ca atat Certificatul de Urbanism, cat si Acordul de Mediu au fost obtinute: *„Beneficiarul a obtinut actul de reglementare in domeniul mediului si a obtinut Certificatul de Urbanism. Acestea vor fi predate ulterior Antreprenorului"*. Mai mult decat atat, la aceeasi Sub-clauza, se face si precizarea ca: *„Daca este necesar, Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza si/sau completa in numele Beneficiarului toate avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism emis pentru "autorizatie de construire" si va fi responsabil pentru obtinerea si mentinerea in valabilitate a avizelor/acordurilor/certificatelor necesare pe parcursul derularii lucrarilor"*. Tinand cont ca acest contract este de tip proiectare si executie, Autorizatia de Construire se obtine pe baza documentatiei tehnice (PAC) elaborata de Antreprenor, care are si calitatea de Proiectant. Astfel, intra in responsabilitatea Antreprenorului sa elaboreze o documentatie de proiectare corecta si completa, sa realizeze toate studiile de specialitate si sa intocmeasca toate documentatiile tehnice, astfel incat Beneficiarul sa obtina Autorizatia de Construire, orice intarziere in indeplinirea acestor obligatii sau incalcare a acestor obligatii fiind normal a fi penalizata de catre Beneficiar, sens in care se va si citi prevederea contractuala *"Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva*

	consecinţelor datorate neîndeplinirii sarcinilor/ obligaţiilor stabilite in prezenta sub-clauza". Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Sub-clauzei 10.1. paragrafele 5, 6, 7 si 8 din cadrul Clauzei 10 din Conditiile Speciale de Contract, întrucât acestea sunt in conformitate cu prevederile actului normativ de referinţa, respectiv Hotatarea de Guvern nr. 1/2018 - Clauza 10 „*Autorizaţii şi asistenţa privind Legea",* motiv pentru care paragrafele antementionate nu incalca prevederile legale incidente.
Intrebare 98	Solicităm eliminarea prevederilor de la subclauza 10.1, paragraful al 9 – lea din Condițiile speciale cu privire la mentinerea valabilității autorizației de construire, având în vedere că această obligație este de asemenea în responsabilitatea achizitorului conform Legii 50/1991.
Raspuns 98	A se vedea **Raspunsul 97** din prezenta Clarificare, prevederea contractuala privind mentinerea valabilitatii autorizatiei de construire regasindu-se la Sub-clauza 10.1 **alin. (8)**. Astfel, Autoritatea contractanta mentine ***prevederile paragrafului 8 aferent Sub-Clauzei 10.1 (Responsabilităţi privind Autorizaţiile de Construire)*** din Conditiile Speciale, intrucat aceasta prevedere a fost stabilita in baza **Clauzei 10 - "Autorizaţii şi asistenţă privind Legea" – subclauza 10.1 litera c) din Hotararea de Guvern nr. 1/2018**, respectiv: ***"****[…]* ***(c)*** *Antreprenorul va întreprinde diligenţele necesare pentru ca Beneficiarul să obţină şi, după caz, să prelungească autorizaţia de construire necesară pentru Lucrările Permanente proiectate de către Antreprenor în conformitate cu prevederile Contractului. De asemenea, pentru aceste Lucrări, Antreprenorul va obţine, în numele Beneficiarului, toate aprobările şi avizele conexe necesare pentru a iniţia şi executa această parte de Lucrări."*
Intrebare 99	Solicităm clarificarea subclauza 19.2, alin. 2 din Condițiile speciale în sensul definirii noțiunii de devieri sau diferente față de Cerințele Beneficiarului, inclusiv prin prezentarea unor exemple.
Raspuns 99	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca aceste aspecte sunt reglementate in prevederile Sub-clauzei 37.11 din Conditiile Generale de Contract aprobate prin H.G. nr. 1/2018 cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la propunerile de modificare initiate de catre Antreprenor.
Intrebare 100	La subclauza 19.2, alin. 3 și 4 din condițiile speciale solicităm să precizați dacă perioada de verificare a proiectului (PAC, PTE și DE) de către verificatorii autorizați este inclusă în durata de proiectare sau este în afara acesteia.
Raspuns 100	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca perioada de verificare a proiectului (PAC, PTE și DE) este inclusa in perioada de proiectare. Antrepenorul trebuie sa realizeze programul de proiectare, astfel incat sa nu existe intarzieri in activitatea de proiectare.
Intrebare 101	Solicităm clarificarea subclauzei 24.1 alin. 2 din Condițiile speciale în sensul eliminării acestuia întrucât, în condițiile deschiderii șantierului și a tipurilor de lucrări prevăzute este aproape imposibil de asigurat condițiile de circulație la parametrii calitativi "cel putin la nivelul celor initiali", în condițiile în care lucrările se vor executa sub circulație restricțiile care vor fi impuse vor respecta planul de management al traficului care va fi elaborate de executant si aprobat de administratorul drumului si poliție. În cazul în care nu veți dori eliminarea clauzei solicităm acceptarea ca acești parametriu calitativi ce trebuie asigurați să fie în conformitate cu planul de management al traficului privind restricțiile de circulație care sunt obligatorii.

Raspuns 101	Autoritatea Contractanta apreciaza necesara respectarea de catre Antreprenor a acestei clauze contractuale, astfel incat Antreprenorul sa nu degradeze drumurile din incidenta de influenta a santierului, aceasta constituindu-se intr-o obligatie contractuala a Contractantului, astfel incat pastreaza nemodificate prevederile Sub-clauzei 24.1. alin. (2).
Intrebare 102	Referitor la ANEXA 1 la Formularul 7. -Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, avand in vedere ca prezenta procedura este de proiectare si executare, iar intocmirea listelor de cantitati se va face in etapa de proiectare, modalitatea de prezentare a ofertei, cel putin pentru partea de lucrari de drum este extrem de detaliata pentru aceasta etapa de ofertare (exemplu : relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si /sau cai de access public, Intersectia DN1A cu DNCB, Orice alte lucrari necesare realizarii intersectiilor cu drumuri clasificate, etc). Va rugam sa restrangeti categoriile de lucrari /sa adaptati acest formular la etapa de ofertare a unei proceduri de proiectare si executie sau sa ne transmiteti liste de cantitati detaliate la care sa se raporteze in mod egal toti ofertantii.
Raspuns 102	Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Devizul general estimativ elaborat la faza SF a stat la baza stabilirii valorii estimate a obiectivului, iar aceasta se regaseste in cadrul HG nr. 38/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici. De asemenea, in conformitate cu prevederile HG 907/2016 listele de cantitati se elaboreaza la faza PTE. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. A se vedea in acest sens si definitia de la **ANEXA Nr. 1: DEFINITII** din Cerintele Beneficiarului "***Lista de cantitati se refera la toate cantitatile stabilite prin Proiectul Tehnic de Executie (Detalii de Executie),*** *aprobata de Supervizor si aprobata de Beneficiar, Clauza 18 [Structura detaliata a pretului] din Conditiile Generale ce vor fi folosite ca documente suport pentru Certificatele de Plata*.", precum si capitolele relevante din Cerintele Beneficiarului privind activitatile de proiectare din cadrul contractului. Totodata, atragem atentia ca ofertantii au obligatia sa isi elaboreze Propunerile Financiare in baza **Formularului nr. 7 "*Formular de Propunere Financiara*"** si a anexelor acestuia, respectiv Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 - PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII.
Intrebare 103	Referitor la ANEXA 1 la Formularul 7, Va rugam sa precizati care sunt activitatile a fi cotate la punctul 3.3 Orice alte activitati necesare amenajarii terenului.
Raspuns 103	A se vedea **Raspunsul 12** din prezenta Clarificare.
Intrebare 104	Referitor la ANEXA 1 la Formularul 7, Va rugam sa precizati care sunt activitatile a fi cotate la punctul 2.7 Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala. Consideram ca aceste aspect pot fi evaluate doar in etapa de realizare a proiectului tehnic .
Raspuns 104	Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea **activitatilor** cuprinse in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de lucrari.

	Prin urmare, la cap. 2.7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari din care fac parte din subpunctul de mai sus. De asemenea, Autoritatea contractanta a introdus in Anexa 1 la formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. Sintagma *Orice alte activitati...*se refera doar la acele activitati neincluse in formular la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate cuantifica. Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului E - Graficului de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de numerar corespunzator implementarii contractului. Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici nationali si internationali cu experienta profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostite tehnice temeinice, în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu.
Intrebare 105	Referitor la formularul 4 Propunere tehnica, cap. I, alineat 10. Se solicita "*Durata activitatilor de proiectare si executie va fi exprimata in zile (nivelul de detaliu sa nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice)*". Va rugam sa precizati ca aceasta cerinta se refera la prezentarea la nivel de detaliu de maxim de luna calendaristica, avand in vedere ca lucrarile vor fi prezentate in ordine cronologica cu respectarea constrangerilor tehnologice inclusiv interdependentele intre activitati.
Raspuns 105	Modalitatea de exprimare a duratei activitatilor de proiectare si executie, respectiv in zile, precum si nivelul de detaliu a fost stabilita in conformitate cu prevederile Clauzei 17 din H.G.1/2018 - Subclauza 17.2 lit. d): "*Nivelul de detaliu al activitatilor va fi ales astfel incat durata acestora sa nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice*." Prin urmare, Autoritatea contractanta precizeaza aceasta cerinta vizeaza nivelul de detaliu pe care Ofertantii trebuie sa il respecte in vederea elaborarii Graficului de Esalonare Calendaristica Gantt. Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca, in confomitate cu prevederile Formularului nr. 4 – Propunerea tehnica, se accepta un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice **doar in cazuri exceptionale cum ar fi de exemplu**: - Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor; - Supravegherea arheologica; - Monitorizare factori de mediu; - Perioada de garantie a lucrarilor.
Intrebare 106	In sectiunea Formulare, Formular 4 Propunere Tehnica, cap.V Organizarea de santier, se solicita „ *Identificarea locatiei pentru organizarea de santier*.

	Ofertantul va anexa schiţe, documente şi date din care să rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de utilizare a terenului afectat". Va rugam sa acceptati ca in aceasta etapa sa transmitem doar o schita de principiu a organizarii de santier si nu o locatie anume. Locatia cu suprafetele si posibilitatea de utilizare va fi in sarcina ofertantului castigator cu atat mai mult cu cat aceasta locatie va trebui aprobata de supervizor.
Raspuns 106	Autoritatea Contractanta isi mentine solicitarea referitoare la identificarea locatiei pentru organizarea de santier, anexarea de schiţe, documente şi date din care să rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de utilizare a terenului afectat, inca de la faza de ofertare. Suprafata aferenta organizarii de santier **nu** a fost inclusa in coridorul de expropriere, prin urmare aceasta **nu** va fi pusa la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit. Astfel, Ofertantii trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a terenului afectat, iar obtinerea autorizatiei pentru Organizarea de santier este in sarcina Antreprenorului. A se vedea si **Raspunsul 70** din prezenta Clarificare.
Intrebare 107	In sectiunea Formulare, Formular 4 Propunere Tehnica, cap.V Organizarea de santier, alineat 2, se solicita: ‚Identificarea si prezentarea posibilelor surse de materiale principale (parapete, mixturi asfaltice, prefabricate, ciment, bitum, agregate, beton, fier-beton, materiale de umplutura pentru terasamente, etc.) pentru lucrările prevăzute în Cerinţele Beneficiarului;' Va rugam sa aveti in vedere ca aceasta procedura se refera la proiectare si executie, caietele de sarcini in care se precizeaza caracteristicile materialelor se vor realiza in etapa de proiectare , iar materialele de umplutura vor fi aprobate de supervizor. Va rugam sa renuntati la aceasta cerinta.
Raspuns 107	Va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta nu a solicitat indicarea cantitatilor pentru fiecare tip de material utilizat, acestea rezultand in urma finalizarii Proiectului Tehnic de Executie si elaborarii Listelor de cantitati de catre viitorul Antreprenor. Dupa cum este specificat si in cadrul cap. V din cadrul Formularului de propunere tehnica, Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor prezentarea posibilelor surse pentru **principalele materiale** care vor fi puse in opera in cadrul viitorului contract si care sunt cunoscute de orice operator economic care actioneaza cu diligenta. Astfel, in faza de ofertare, Autoritatea Contractanta nu a solicitat prin Documentatia de Atribuire documente referitoare la caracteriticile materialelor ce vor fi utilizate si nici autorizatii/autorizatii de mediu/autorizatii de exploatare valabile la momentul ofertarii intrucat in procesul de implementare (faza ulterioara semnarii contractului), Antreprenorul va trebui sa respecte prevederile contractuale si ale Cerintelor Beneficiarului in ceea ce priveste calitatea materialului procurat si conformitatea acestuia cu Proiectul Tehnic elaborat de Antreprenor, intrand in responsabilitatea Inginerului/Supervizorului verificarea existentei tuturor documentelor care certifica calitatea materialului adus in santier si pus in opera. Autoritatea Contractantă a pus la dispoziția ofertanților toata documentatia relevanta în cadrul Documentelor Beneficiarului din Documentația de atribuire

	publicată în SEAP, aceste informatii fiind suficiente pentru ca ofertanții să își poată realiza o ofertă corectă, completă și competitivă, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.
Intrebare 108	In Anexa nr. 4 la Formularul 7, formular de oferta se solicita prezentarea furnizorilor de materiale, inclusiv tipuri si cantitati, precum si valoarea acestora. Va rugam sa aveti in vedere ca aceasta procedura se refera la proiectare si executie, astfel cantitatile si tipurile de materiale vor fi stabilite in urma realizarii proiectului tehnic . Avand in vedere prevederile din documentul "CELE MAI FRECVENTE NECONFORMITĂȚI IDENTIFICATE ÎN CADRUL DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE AFERENTE CONTRACTELOR DE EXECUTIE DE LUCRARI STANDARD SI DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI ÎN ACTIVITATEA DE CONTROL EX ANTE, ÎNSCRISE IN AVIZELE CONFORM CONDIȚIONATE EMISE" emis de ANAP, pagina 88: Baza legală | Abaterea identificată | Masura de remediere dispusă Art.49, Art.50, Art.154, Art.172 alin.(3), din Legea nr.98/2016, Art.20 alin.(2), Art.20 alin.(3), Art.31 din HG nr.395/2016 | Autoritatea contractantă formulează la nivelul secțiunii IV.4.1 „Modul de prezentare al propunerii tehnice" cerințe, pentru faza de ofertare, care nu sunt relevante si disproporționate în raport de natura si complexitatea contractului. (proiectare+execuție) | Eliminați de la nivelul secțiunii IV.4.1 „Modul de prezentare al propunerii tehnice" din cadrul instrucțiunilor către ofertanți, următoarele: a) - cerința referitoare la obligativitatea prezentării, la faza de ofertare, a *„Declarației privind furnizorii și producătorii materialelor care trebuie puse în operă (betoane, tâmplărie, termo sistem, vopsea, obiecte sanitare, instalații electrice: tablouri de distribuție pentru instalații electrice și corpuri de iluminat)"*, aceasta fiind *nerelevantă* și *neadecvată* în raport de obiectul, natura și complexitatea contractului, ducând la încălcarea prevederilor art.172 alin.(2) din Legea nr.98/2016 coroborat cu prevederile art.31 alin.(1) lit. a) din HG nr.395/2016, neluând în considerare ca prezentul contract este *unul de proiectare și execuție*, unde potențialul ofertant depune *un concept general* ce are la baza *„cerințe de performanță* și indicatori de rezultat care devin puncte de referință pentru viitoarea soluție tehnică ce va fi descrisă la nivelul documentație tehnice elaborate la faza de proiect tehnic si de detaliu; b) informațiile de la nivelul pct.11 *sunt specifice cerințelor minime ale caietului de sarcini al achiziției/cerințele beneficiarului cu referire la definirea aspectelor minime ce asigură îndeplinirea condițiilor de conformitate* astfel încât să permită aplicabilitatea factorului de evaluare în cadrul criteriului de atribuire, conform prevederilor art.12 lit. a) din Instrucțiunea Președintelui ANAP nr.1/2017; c) informațiile referitoare la oferirea posibilității prezentării unei *„liste nelimitative a personalului cheie"*, având in vedere următoarele aspecte: 88 Va rugam sa eliminati cerinta privind prezentarea "Listei furnizorilor de materiale de constructie", luand in considerare lipsa de relevanta a acestor informatii in obiectul contractului in conformitate cu cele mentionate de ANAP. Mai mult decat atat, cerinta autoritatii contractante excede legislatiei in vigoare.
Raspuns 108	Sectiunea VII din cadrul Formularului nr. 4 – Formularul de Propunere Tehnica referitoare la *Lista furnizorilor de materiale* a fost introdusa in scopul unei evidente corespunzatoare pe parcursul implementarii contractului a furnizorilor pentru principalele materiale ce vor fi puse in opera, astfel incat sa existe un mecanism eficient de informare si de verificare a Beneficiarului cu privire la identitatea si nivelul de implicare al eventualilor furnizori si, totodata, sa se asigure respectarea prevederilor Legii nr. 76/2014, modificata prin O.U.G. 55/2016, prevederi care au fost transpuse in cadrul art. 5.3 din Acordul Contractual. Mai mult decat atat, prin nominalizarea furnizorilor pentru principalele materiale sau prin existenta acestora in cadrul contractului de executie lucrari, se asigura o modalitate de protectie a furnizorilor in caz de neplata a obligatiilor Antreprenorului fata de furnizori, prin instituirea unui drept de ipoteca mobiliara asupra sumelor datorate de CNAIR antreprenorului.

<table>
<tr><td></td><td>Autoritatea Contractanta modifica pct. VII. din cadrul Formularului nr. 4 – Propunerea Tehnica, dupa cum urmeaza:

VII. Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ”Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, modificata si completata prin OUG 55/2016

Se va completa o linie pentru fiecare furnizor de materiale de constructie.

<table>
<tr><td>Nr. crt.</td><td>Denumire furnizor materiale de constructie</td><td>Date de identificare furnizor:
➢ Sediul……;
➢ Telefon…..; fax……;
➢ Nr. de inregistrare la Registrul Comertului……;
➢ cod unic de inregistrare……;
➢ cont bancar……., banca la care este deschis……;
➢ numele</td><td><u>Tipuri de materiale de constructie furnizate in cadrul contractului</u></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Nota 1: Se vor completa cel putin furnizorii pentru urmatoarele materiale de constructie: parapete, mixturi asfaltice, prefabricate; ciment; bitum; agregate; beton; fier-beton, materiale de umplutura pentru terasamente, armaturi)</td></tr>
<tr><td>Intrebare 109</td><td>Va rugam sa ne transmiteti expertizele tehnice.</td></tr>
<tr><td>Raspuns 109</td><td>A se vedea Anexa 1 la prezenta Clarificare.</td></tr>
<tr><td>Intrebare 110</td><td>Va rugam sa precizati care este stadiul actual al exproprierilor.</td></tr>
<tr><td>Raspuns 110</td><td>Procedura pentru emiterea HG-ului privind exproprierile a fost demarata, iar Proiectul de Hotarare de Guvern de expropriere a fost intocmit, urmand circuitul de avizare.</td></tr>
<tr><td>Intrebare 111</td><td>Va rugam sa confirmati ca se va cota doar activitatea de supraveghere arheologica nu si descarcarea arheologica.</td></tr>
<tr><td>Raspuns 111</td><td>Asa cum este mentionat si in Cerintele Beneficiarului, cap. 12.35:
Obligațiile Antreprenorului sunt de a anunța Direcția Județeană de Cultură Ilfov cu privire la data la care va inița lucrările de execuție în teren (pentru obiectivul</td></tr>
</table>

	de infrastructură rutieră) și de a efectua supravegherea arheologică a tuturor lucrărilor care presupun intervenții în sol pe parcursul întregii perioade de execuție a proiectului de infrastructură rutieră folosind prestatori de specialitate conform Ordinului 2562/2010. *Costurile de realizare a supravegherii arheologice, cât și alte costuri, riscuri și responsabilități aferente investigațiilor arheologice din această etapă sunt incluse în suma prevăzută de către Antreprenor pentru această activitate.* Prin urmare, numai în cazul în care se vor identifica vestigii arheologice, ca rezultat al supravegherii arheologice, acestea vor fi cercetate în vederea obtinerii certificatului de descarcare de sarcină arheologică. Pe parcursul derularii contractului anumite situatii pot face obiectul utilizarii rezervelor de implementare si/sau utilizarii procedurii de modificare specificata in Contract si in Documentatia de Atribuire. Avand in vedere multitudinea situatiilor care pot aparea pe parcursul derularii contractului, atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzelor 35 [Prelungirea Duratei de Executie], 36 [Intarzieri], 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, prevederile articolului 5.4, 5.5 si respectiv 5.10 din Acordul Contractual, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice.
Intrebare 112	Avand in vedere urmatoarele: • Conform HG 395/2016 - garantia de participare la licitatie se poate constitui si prin polite de asigurare si este atributul Autoritatii de Supraveghere a Asigurarilor de a emite reglementari privind aceste asigurari; • Norma 32/2021 a ASF -ce contine prevederi privind politele de garantie (urmare falimentului CITY care a marcat piata garantiilor) , iar in acest context asiguratorii emit doar in formate proprii ale instrumentului/clauzei de garantare si nu accepta emiterea de garantii autonome (ce anuleaza conditiile de asigurare); • Formularul de instrument de garantare propus de o entitatea achizitoare se poate aplica doar in cazul SGB avand in vederea mentiunea : “Aceasta garantie este supusa legilor din Romania si se va conforma regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu Numarul 758 de catre Camera Internationala de Comert, cu exceptia celor mentionate mai sus”, NU SI IN CAZUL POLITELOR DE ASIGURARE emise de o societate de asigurari. • Referitor la termenul de plata a despagubirii mentionat in MODELUL DE FORMULAR pus la dispozitie, repectiv :”Plata se va face de catre noi in termenul de plata mentionat in cererea de plata si fara nicio alta formalitate suplimentara din partea CNAIR SA”- conform legislatiei mai sus mentionate ->oricarei polite de asigurare i se aplica conditii de asigurare care stipuleaza termenul maxim de plata a despagubirii ceea ce este o conditie de protectie a asiguratilor; • In piata de asigurari, unii asiguratori mentioneaza termenul de plata a despagubirilor pe instrumentul de garantare altii nu, dar toti il au prevazut in conditii; • Formularul de instrument de garantare pentru aceasta licitatie, nu se aplica nicidecum unei polite de asigurare ci doar unei SGB deoarece ca mentioneaza ...."se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu

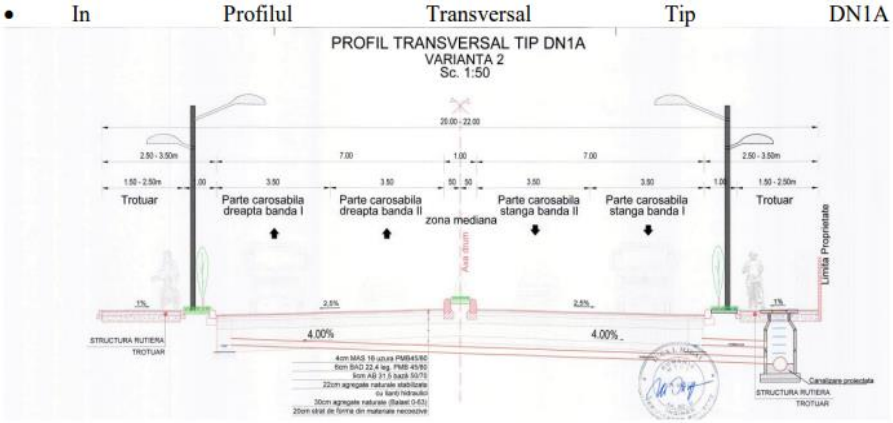
	numărul 758 de către Camera Internațională de Comerț" ceea ce echivaleza garantia cu una autonoma, neacceptata de Norma 32/2021 a ASF prin Articolul 2.(1)b), intrucat aceasta practic anuleaza conditiile de asigurare ale politei; • Precum si faptul ca in licitatiile publice, autoritatile contractante nu au temei legal sa impuna formulare de instrumente de garantare asiguratorilor ci trebuie acceptate politele cu instrumente emise pe formularele lor proprii, conform reglementarilor ASF. Avand in vedere toate cele mai sus prezentate, va rugam sa intelegeti ca impunerea unui model de instrument de garantare va duce la o restrangere artificiala a concurentei prin imposibilitatea obtinerii de catre ofertanti a politelor emise de societati de asigurari, acestia fiind obligati sa constituie garantia de participare doar prin viarment bancar sau Scrisoare de garantie bancare (care in cazul asocierilor este aproape imposibil de obtinut). Astfel, va rugam sa confirmati ca formularele puse la dispozitie in vederea constituirii garantiei de participare sunt doar modele, si ca in conformitate cu legislatia care reglementeaza acest domeniu, sunt acceptate politele cu instrumente emise pe formularele asiguratorilor acreditati, conform reglementarilor ASF.
Raspuns 112	A se vedea **Raspunsul 3** din prezenta Clarificare.
Intrebare 113	Va rugam sa mentionati ce anume intelege Autoritatea contractanta prin sintagma "la prima sa cerere" din cadrul modelului de Formular privind constituirea garantiei de participare, in raport cu legislatia in vigoare si perioada de verificare si aprobare interna in cadrul societatilor de asigurare.
Raspuns 113	Expresia "*la prima sa cerere*" este consacrata si provine din prevederile Noului Cod Civil, care la art. 2.321 alin. (1) si (2) stipuleaza ca: *Capitolul III Garanțiile autonome* *Articolul 2.321* *Scrisoarea de garanție* *(1) Scrisoarea de garanție este angajamentul irevocabil și necondiționat prin care o persoană, denumită emitent, se obligă, la solicitarea unei persoane denumite ordonator, în considerarea unui raport obligațional preexistent, dar independent de acesta, să plătească o sumă de bani unei terțe persoane, denumită beneficiar, în conformitate cu termenii angajamentului asumat.* *(2) Angajamentul astfel asumat **se execută la prima și simpla cerere a beneficiarului**, dacă prin textul scrisorii de garanție nu se prevede altfel.*
Intrebare 114	Avand in vedere situatia reala din teren, va rugam sa precizati daca se accepta schimbarea solutiei din SF, pentru realizarea consolidarilor in zona pasajului pe sub calea ferata. In SF e data solutie cu ecran de piloti cu diametru de 880mm. Realizarea ecran de piloti cu diametru de 880mm este aproape imposibila sau implica restrictionarea traficului in zona pentru realizarea platformelor de lucru pentru foreze.
Raspuns 114	A se vedea **Raspunsul 59** din prezenta Clarificare.
Intrebare 115	Va rugam sa ne clarificati care dintre cele doua variante expuse in SF pentru realizarea sistemului rutier va fi cea aleasa pentru a fi ofertata. Solutia 1 in care sistemul rutier se pastreaza cel existent, executandu-se frezare si inlocuire straturi

	de asfalt, iar in stanga si dreapta pe suprafetele de extindere executandu-se caseta noua, iar in varianta 2 eliminarea integrala a sistemului rutier vechi si inlocuire pe toata latimea partii carosabile cu sistem rutier nou.
Raspuns 115	A se vedea **Raspunsul 60** din prezenta Clarificare.
Intrebare 116	Va rugam sa precizati daca se accepta schimbarea solutiei de realizare a culoarului pietonal sub drum in cadrul pasajului subteran cu o alta solutie pe care o vom propune in cadrul propunerii tehnice. Ne referim la inlocuirea elementelor prefabricate din beton armat cu o alta solutie, care consideram noi ca e realizabila intr-un timp echivalent cu cel necesar realizarii solutiei propuse prin SF, dar care din punct de vedere al fluentei traficului in zona in timpul executiei lucrarilor este mai avantajoasa.
Raspuns 116	A se vedea **Raspunsul 61** din prezenta Clarificare.
Intrebare 117	Referitor la Pod Linia de centura Retelele de Telecomunicatii existente in zona pasajului Mogosoaia pe DNCB, in urma vizitei in teren am constatat ca sunt relocate/deviate in subteran pana in aproipierea Cristim unde revin pe stalpi. In acest context va rugam sa ne clarificati daca se va realiza o alta interconectare pe zona nodului rutier sau se va conecta doar din zona revenirii pe stalp.
Raspuns 117	A se vedea **Raspunsul 62** din prezenta Clarificare.
Intrebare 118	Referitor la Pod CF Va rugam sa ne clarificati daca in zona traversarii DN1A pe sub pasajul de cale ferata se accepta pozarea tubulaturilor necesare retelelor de Telecomunicatii pe structura de beton a consolidarilor ce se vor realiza, avand in aval fata de pasaj cat si in amonte camerete pentru intrarea si iesirea in subteran, sau se va realiza retea subteran inclusive in zona subtraversarii pasajului CF.
Raspuns 118	A se vedea **Raspunsul 63** din prezenta Clarificare.
Intrebare 119	Referitor la traseu Romtelecom Va rugam sa ne clarificati modul in care se vor realiza devierile si eventualele preluari de client ai ROMTELECOM, avand in vedere ca la o vizita in teren am identificat camine cat si cabluri specific retelelor ROMTELECOM, iar in cadrul documentelor puse la dispozitie de catre autoritate nu am regasit aviz sau vreo referire la aceasta retea.
Raspuns 119	A se vedea **Raspunsul 64** din prezenta Clarificare.
Intrebare 120	Va rugam sa ne clarificati cate foraje subterane pentru subtraversari de cabluri aferente retelelor de telecomunicatii vor fi necesare pe traseul lucrarii si eventual pozitia lor. De asemenea diametrul minimal al tubulaturii necesare in foraje.
Raspuns 120	A se vedea **Raspunsul 65** din prezenta Clarificare.
Intrebare 121	Va rugam sa ne clarificati daca in cadrul lucrarilor de relocare/ deviere trasee de telecomunicatii, instalarea cablurilor si conectarea bransamentelor intra in sarcina antreprenorului, sau acesta pune la dispozitie infrastructura, urmand ca fiecare operator se isi reloce in subteran cablurile si sa isi conecteze abonatii.
Raspuns 121	A se vedea **Raspunsul 66** din prezenta Clarificare.
Intrebare 122	Pentru retele de energie electrica : Este impusa subtraversarea drumului cu foraj dirijat pentru retelele electrice, sau se poate realiza si in varianta sapatura deschisa?
Raspuns 122	A se vedea **Raspunsul 67** din prezenta Clarificare.
Intrebare 123	Se pastreaza retelele LES MT existente sau se inlocuiesc pe toata lungimea traseului supus extinderii?
Raspuns 123	A se vedea **Raspunsul 68** din prezenta Clarificare.
Intrebare 124	Supratraversarea podului CF realizata in configuratie LEA face parte din proiect?

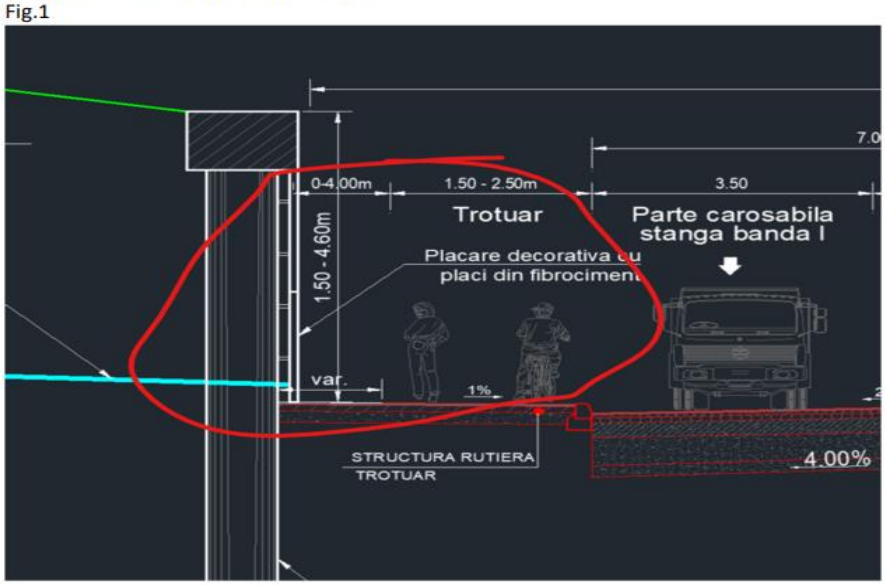
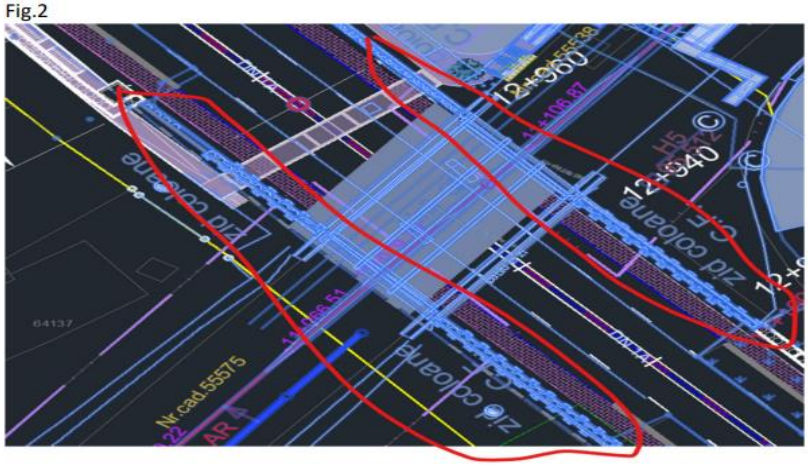
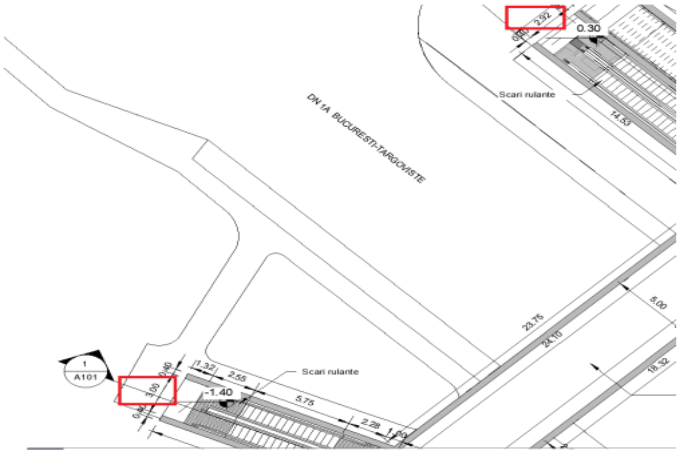
Raspuns 124	A se vedea **Raspunsul 69** din prezenta Clarificare.
Intrebare 125	Avand in vedere restrictiile posibile de circulatie (care vor fi aprobate de Inspectoratul de politie), va rugam sa precizati daca perioada de executie de 10 luni include si perioada de timp friguros.
Raspuns 125	A se vedea **Raspunsul 72** din prezenta Clarificare.
Intrebare 126	Avand in vedere complexitatea documentatiei si complexitatea solutiilor de analizat, va rugam sa decalati termenul de depunere al ofertei cu minim 20 de zile lucratoare.
Raspuns 126	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 127	Avand in vedere "ANEXA 3 - SUPRAFEŢE DE TEREN SUPLIMENTARE NECESARE EXECUŢIEI LUCRĂRILOR - A. DESCRIEREA SERVICIILOR privind intocmirea documentaţiei pentru obţinerea terenului (achizitii suprafete suplimentare)" si faptul ca aceste documentatii vor fi intocmite dar daca va fi cazul, la solicitarea autoritatii contractante, va rugam sa confirmati faptul ca la momentul depunerii ofertelor nu este necesara nominalizarea unui expert evaluator specializat.
Raspuns 127	La momentul depunerii ofertelor nu este necesara nominalizarea unui expert evaluator specializat. De asemenea, se vor respecta prevederile din Cerintele Beneficiarului, respectiv: "*5.1.17. Antreprenorul va fi responsabil de indeplinirea tuturor activitatilor prevazute in Anexa nr. 3 din prezentele Cerinte ale Beneficiarului, referitoare la suprafetele de teren suplimentare necesare executiei lucrarilor. Se vor realiza exproprieri suplimentare, numai daca este cazul, cu respectarea Cerintelor Beneficiarului si doar cu acordul expres al Beneficiarului. In situatia in care Antreprenorul va solicita, iar Beneficiarul va accepta efectuarea de exproprieri suplimentare pentru imobile aflate in afara coridorului de expropriere, pentru toata perioada de realizare a activitatilor prevazute in Anexa 3 la Cerintele Beneficiarului,* ***Antreprenorul nu va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie si/sau la plata unor Costuri suplimentare*** *in conditiile in care intarzierile in realizarea exproprierilor suplimentare se datoreaza culpei Antreprenorului,* ***sau exproprierile suplimentare devin necesare ca urmare a aplicarii Sub-clauzei 37.11 [Propunere de Modificare initiata de Antreprenor].*****"**
Intrebare 128	Raportandu-ne la gradul ridicat de complexitate-detaliere a propunerii tehnice si la intarzierile generate de imposibilitatea selectarii intr-un timp scurt a subcontr/furnizorilor, dar si la perioada Sarbatorilor Pascale, va rugam sa aveti in vedere ca intervalul de timp ramas pana la data-limita de depunere a ofertelor este insuficient pentru finalizarea procesului de elaborare a ofertelor, motiv pt care va solicitam sa procedati la decalarea datei-limita de depunere a ofertelor cu 20 de zile.
Raspuns 128	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 129	1. Avand in vedere ca in fisa de Date se specifica "*Ofertantii nu pot extinde Tabelul cu Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 nici prin includerea de noi activitati/ categorii de lucrari sau servicii, nici prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in acest tabel. Tabelul cu Preturile activitatilor/ categoriilor de*

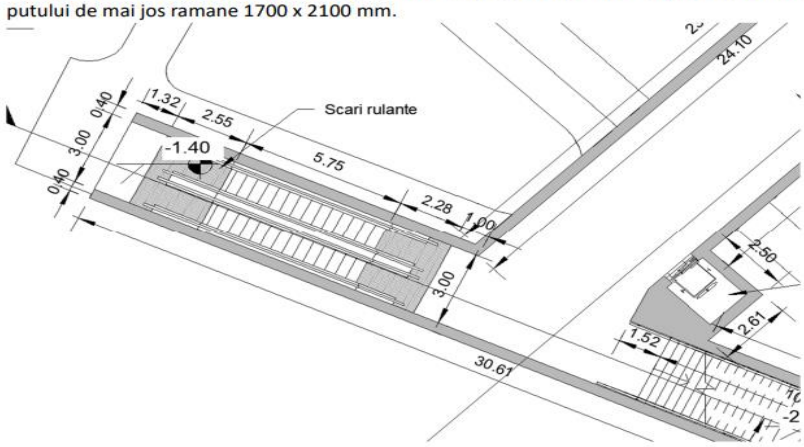
	lucrari sau servicii nu va fi modificat de ofertanti, ci va respecta intocmai structura din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7" iar: • In Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII la pozitia 2.4 Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apa si sol, zgomot) trebuie ofertata si biodivesitatea, • In Cerintele Beneficiarului la 3.1.15. Impactul asupra mediului se specifica: „ **3.1.15. Impactul asupra mediului** Proiectul ***Largire la 4 benzi DN1A si masuri de siguranta rutiera pentru sectorul cuprins intre Centura Bucuresti si intersectia cu soseaua Chitila-Mogosoaia*** nu intersecteaza si nu se afla in vecinatatea unei arii naturale protejate Natura 2000 sau a altor zone sensibile din punct de vedere al biodiversitatii. Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov a decis ca proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate. De asemenea, vor fi respectate conditiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protectiei mediului conform deciziei etapei de incadrare nr. 194/29.07.2022 • In Cerintele Beneficiarului se specifica la: „ 12.37.8.Antreprenorul se va asigura ca pe parcursul tuturor activitatilor aferente lucrarilor de constructie cat si in perioada de Notificare a defectelor se vor respecta masurile pentru prevenirea si reducerea impactului asupra mediului (inclusiv a biodiversitatii) avand si obligatia de a asigura personal de specialitate in vederea implementarii si monitorizarii masurilor stabilite prin-actele de reglementare in domeniul protectiei mediului. • In Memoriu de prezentare DN 1A _ mediu se specifica la: " **XIII. BIODIVERSITATE (ARII NATURALE PROTEJATE NATURA 2000)** Nu este cazul. Proiectul analizat nu intersecteaza si nu se afla in vecinatatea vreunei arii naturale protejate Natura 2000, sau a altor zone sensibile din punct de vedere al biodiversitatii. • In Memoriu de prezentare DN 1A _ mediu se specifica la: " ***4. Arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, international*** Proiectul analizat nu intersecteaza si nu se afla in vecinatatea vreunei arii naturale protejate Natura 2000, sau a altor zone sensibile din punct de vedere al biodiversitatii. ***5. Zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică*** Proiectul nu intersecteaza/traverseaza arii naturale protejate/situri Natura 2000. Va rugam clarificati daca se oferteaza Biodiversitatea sau nu la pozitia 2.4 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII" , daca nu , va rugam modificatati formularul si retransmiteti.
Raspuns 129	Se va realiza ofertarea biodiversitatii avand in vedere ca in cadrul documentatiei ce a stat la baza emiterii actului de reglementare privind protectia mediului sunt prevazute masuri pentru protectia biodiversitatii.

Intrebare 130	2. In Documentatia pusa la dispozitie, respectiv: • Cerintele beneficiarului se specifica:" *Pasajul pietonal suprateran* este amplasat in nordul podului de cale ferata CF 700. Acest pasaj va facilita tranzitul si traversarea in siguranta a DN1A (Soseaua Bucuresti-Targoviste). De asemenea, va fi amplasata o statie de transport in comun in vecinatatea pasajului, accesul calatorilor spre strazile adiacente va fi facut prin cele 2 lifturi si 2 scari fixe. Finisajele vor fi adecvate pentru tipul constructiei, acestea fiind antiderapante, antivandalism, de directionare si avertizare pentru nevazatori, placi de granit si placaj tip caramida aparenta, copertina de sticla securizata. Suprastructura pasajului este realizata din profile metalice si acoperita cu sticla securizata. Fundatiile vor fi realizate din beton armat sprijinite pe piloti. • In Vol.1_Memoriu de sinteza: Suprastructura pasajului este realizata din profile metalice si acoperita cu sticla securizata. Fundatiile vor fi realizate din beton armat sprijinite pe piloti. Deciziile constructive sunt luate avand in vedere buna functionare si utilizare a constructiei propuse, dar si pentru siguranta utilizatorilor. • In Memoriu de prezentare DN 1A mediu: **Pasajul suprateran** este amplasat in nordul podului de cale ferata CF 700. Acest pasaj va facilita tranzitul si traversarea in siguranta a DN 1A (Soseaua Bucuresti-Targoviste). Va fi amplasata deasemenea o statie de transport in comun in vecinatatea pasajului, accesul calatorilor spre strazile adiacente va fi facut prin cele 2 lifturi si 2 scari fixe. Finisajele vor fi adecvate pentru tipul constructiei, acestea fiind antiderapante, antivandalism, de directionare si avertizare pentru nevazatori, placi de granit si placaj tip caramida aparenta, copertina de sticla securizata. Structura pasajului este realizata din beton armat precum si beton prefabricat (grinzi prefabricate) iar copertina va fi realizata din structura metalica si acoperita cu sticla securizata. Deciziile constructive sunt luate avand in vedere buna functionare si utilizare a constructiei propuse, dar si pentru siguranta utilizatorilor. Va rugam clarificati care este structura pasajului suprateran, structura metalica sau structura realizata din beton armat precum si beton prefabricat (grinzi prefabricate)?
Raspuns 130	Suprastructura Pasajului pietonal este realizată din profile metalice, acoperita cu sticla securizata, conform detaliilor din plansa P-CST-00122-1-PRD1-SF-01-DG-001-R00 - Vol.3_Lucrari poduri si pasaje.

Intrebare 131	3. In Documentatia pusa la dispozitie, respectiv: • In Memoriu de prezentare DN 1A mediu: ➢ *Suprastructura drumului* Suprastructura drumului este partea din corpul drumului care cuprinde sistemul rutier si amenajarea acostamentelor. Sistemul rutier este ansamblul de straturi asezate pe patul drumului si care constituie structura de rezistenta a drumului. Straturile rutiere sunt alcatuite in principal din straturi de agregate nelegate cu liant sau slab legate cu lianti hidraulici care alcatuiesc straturile de fundatie si din straturi de mixturi asfaltice cu diverse roluri: de baza, de legatura si de rulare (uzura). Acostamentele se realizeaza in mod uzual din balast compactat. • In Profilul Transversal Tip DN1A  nu se specifica nimic de acostamente, va rugam clarificati daca acostamentele trebuiesc ofertate?
Raspuns 131	Conform plansei P-CST-00121-1-PRD1-SF-01-PTT-001-R00 din cadrul Vol.2_Lucrari drumuri, profilul transversal este de tip strada. Dintr-o eroare in cadrul "*Memoriului de prezentare DN 1A mediu"* se mentionează *"amenajarea acostamentelor"*.
Intrebare 132	4. In Documentatia pusa la dispozitie, respectiv: • **In Formularul nr. 4 - PROPUNEREA TEHNICA** **NOTA 1: SE VOR COMPLETA CEL PUTIN FURNIZORII PENTRU URMATOARELE MATERIALE DE CONSTRUCTIE: PARAPETE, MIXTURI ASFALTICE, PREFABRICATE; CIMENT; BITUM; AGREGATE; BETON; FIER-BETON, MATERIALE DE UMPLUTURA PENTRU TERASAMENTE, ARMATURI)** ➢ Identificarea si prezentarea posibilelor surse de materiale principale (bitum, agregate, materiale de umputura pentru terasamente, ciment, fier-beton, armaturi, beton, etc) pentru lucrările prevăzute în Cerintele Beneficiarului; Avand in vedere ca in documentatia pusa la dispozitie nu se regasesc parapeti, va rugam sa transmiteti care sunt principalele materiale pentru care trebuiesc specificati furnizorii si sursele.
Raspuns 132	Va rugam sa aveti in vedere ca, in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, cap. 4.14.7 *Dipozitive de protectie*: *„4.14.7.1. Pasajele pietonale vor fi prevazute cu balustrade, **parapete** si alte echipamente de siguranta, conform cerintelor Standardelor aplicabile."* A se vedea totodata si **Raspunsurile 107** si **108** din prezenta Clarificare.

	Prin urmare, Autoritatea contractanta mentine cerinta din Documentatia de atribuire.
Intrebare 133	Referitor la Anexa 1, 2, 3, 4 la Formularul nr. 7, va rugam sa confirmati ca aceste formulare pot fi semnate si stampilate doar de Ofertant (Unic sau Lider Asociere), fara a fi necesara semnatura si stampila operatorului economic care are alta calitate decat Ofertant Unic sau lider Asociere, respectiv ofertant asociat.
Raspuns 133	Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta prevazuta in Documentatia de atribuire. Pentru acele documentele care trebuie semnate de reprezentantul legal al societatii, Reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant are posibilitatea, printr-un act cu valoare juridica (cum ar fi cele emise de Notariate, Registrul Comertului sau institutii similare din alte tari, etc), in limita competentelor sale, sa delege unei alte persoane atributiile ce ii revin si sa ii confere toate drepturile legale prin care acesta sa poata semna in calitate de reprezentant legal.
Intrebare 134	**6.** In Documentatia pusa la dispozitie, respectiv in Vol.1_Memoriu de sinteza se specifica: ILUMINAT PUBLIC SOLUTIA PROIECTATA Pentru asigurarea unui sistem de iluminat eficient si in concordanta cu ultimele standarde si normative, se va realiza un nou sistem de iluminat. Instalatia de iluminat public care se va realiza, va fi amplasata pe portiunea de drum care va fi afectata de supralargire, conform temei de proiectare şi este prevazuta pentru a pune în evidenţă caracteristicile căii de circulaţie şi a traficului rutier, în scopul asigurării securităţii deplasarii autovehiculelor, a fluenţei traficului rutier şi a condiţiilor optime de vizibilitate şi confort vizual, în baza unor considerente luminotehnice, estetice şi economice. Este necesara realizarea unui sistem de iluminat adecvat noului drum. Supralargirea drumului national DN1A, necesita realizarea urmatoarelor instalatii electrice: • instalatii electrice de iluminat cu stalpi metalici din teava; • bransamentele de joasa tensiune in cablu de cupru protejat in tub PVC; • priza de pamant. • post de transformare; • instalatii electrice iluminat, prize si forta pasaj pietanal subteran si suprateran; • instalatii electrice iluminat, prize si forta statie pompare ape pluviale; • Instalatii electrice prize pentru alimentarea masinilor electrice. **Va rugam clarificati daca instalatiile electrice prize pentru alimentarea masinilor electrice, cat si prizele pentru incarcare auto se vor oferta. Va rugam sa transmiteti cantitate si unde se vor amplasa.**
Raspuns 134	Instalatiile electrice de prize pentru alimentarea masinilor electrice cat si prizele pentru incarcare auto, nu fac obiectul prezentului proiect.
Intrebare 135	Având în vedere complexitatea documentației, vă rugăm să binevoiți a decala termenul limită de depunere a ofertelor cu 30 de zile calendaristice
Raspuns 135	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.

Intrebare 136	1. Va rugam sa ne confirmati daca placarea cu fibrociment din fig.1 se va face doar pe lungimea zidului de coloane marcat mai jos in fig. 2 Fig.1  Fig.2 
Raspuns 136	Placarea cu fibrociment se va face pe zidul de sprijin nou care se va executa in continuarea zidului de sprijin existent.
Intrebare 137	2. Scarile rulante publice se fabrica cu latimea treptelor de 800 sau 1000 mm. Latimea comuna a cuvei celor 2 scari rulante pentru treapta de 800 trebuie sa fie de 2860 mm iar pentru 1000 mm 3260 mm. Se poate mari latimea cuvei la 3260 mm? sau se va micsora latimea treptei solicitata de la 900 la 800 mm ? 

Raspuns 137	Escalatoarele vor avea lățimea treptelor de 800mm, iar dimensiunile de gabarit ale cuvelor vor fi adaptate la specificațiile producătorului de echipamente ales. Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.
Intrebare 138	3. Va rugam sa ne transmiteti capacitatea /numarul de persoane pentru lifturi, si daca dimensiunea putului de mai jos ramane 1700 x 2100 mm. 
Raspuns 138	În această etapă de proiectare dimensiunile de gabarit ale puțurilor de lift se vor considera cele prevăzute în proiect. În aceste puțuri se pot monta lifturi cu capacitate maximă de 950kg (cca. 13 persoane). Dimensiunile finale ale puțurilor de lift se vor adapta specificațiilor prevăzute în fișele tehnice ale echipamentelor alese. Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.
Intrebare 139	Referitor la procedura **"*Proiectare si Executie Largire la 4 benzi DN1A si masuri de siguranta rutiera pentru sectorul cuprins intre Centura Bucuresti si intersectia cu soseaua Chitila-Mogosoaia*"**, nr. anunt SEAP CN1053404, cu termen de depunere **11.05.2023**, va solicitam prelungirea acestui termen cu 20 (douazeci) de zile. Facem aceasta solicitare datorita complexitatii si volumului mare al documentatiei de atribuire aferent procedurii, care necesita sa fie analizat, in vederea intocmirii unei oferte cat mai apropiate de realitate. Amintim, totodata ca aceasta perioada a fost scurtata de Sarbatorile Pascale care ne-a obligat sa acordam zilele libere legale personalului angajat.
Raspuns 139	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 140	Avand in vedere volumul mare de lucru si complexitatea proiectului, Sarbatorile Pascale si minivacanta de 1 mai, va rugam sa decalati cu 20 zile lucratoare data depunerii ofertei, pentru a elabora o oferta corecta si competenta. Va multumim!
Raspuns 140	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 141	*Avand in vedere prevederile din fisa de date cap.* IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare, : "*Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata in Lei, valorile fiind exprimate cu maxim doua zecimale. La elaborarea Propunerii*

	Financiare, ofertantii se vor raporta la valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.1.5, respectiv la valoarea de 85.508.831,00 Lei fara TVA." cat si Anexa nr.1 la Formularul 7 de propunere Financiara , **Formular care nu contine Sumele provizionate,** va rugam sa precizati in mod clar daca valoarea estimata de *85.508.831,00 Lei fara TVA, contine si sumele provizionate asa cum sunt acestea prezentate in Anexa 2 la Formularul 7, Formular de oferta* .
Raspuns 141	Autoritatea contractanta precizeaza ca in valoarea estimata a procedurii de achizitie publica, 85.508.831,00 Lei fara TVA, sunt incluse si sumele provizionate reprezentand rezerve de implementare in valoare totala de 5.591.713 Lei fara TVA.
Intrebare 142	Datorita volumului mare al documentatiei ce necesita a fi analizata (proiect la nivel de SF), a volumului mare de documentatie necesara a fi pregatita in vederea participarii la prezenta procedura de achizitie precum si in contextul Sarbatorilor Pascale, a perioadei de 1 mai, deci a zilelor libere legale ce au dus atat la dificultati in obtinerea ofertelor de la furnizorii de materiale cat si in pregatirea documentatiei de ofertare, va solicitam sa fiti de acord **cu prelungirea termenului de depunere** a ofertei cu cel putin 15 zile, pentru a ne permite astfel sa raspundem cerintelor dvs.
Raspuns 142	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 143	Va rugam sa ne transmiteti planurile de situatie anexe ale avizelor pentru retele de utilitati cum ar fi : Anexa Apa Nova, E distributie, CNCFR, 9/4/3675/26.09.2022, etc.
Raspuns 143	A se vedea **Anexa 2** la prezenta Clarificare - planurile de situatie ale avizelor pentru retele de utilitati.
Intrebare 144	Avand in vedere faptul ca nu ati raspuns in termenul stabilit prin Fisa de date la solicitarile de clarificari, va rugam sa luati in considerare prelungirea termenului de depunere cu 15 zile ulterior transmiterii raspunsurilor dumneavoastra .
Raspuns 144	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 145	**Referitor la Anexa 1 la Formularul nr.7, la punctul 2.7 se solicita sa cotam evaluam „** Orice alte activitati aferente protecției mediului si aducerii la starea inițiala **„ in conditiile in care la punctul 2.2 se va cota : „**Lucrari/Amenajari pentru protecția mediului si aducere ia starea inițiala **„.** **Dupa cum se poate observa definirea activitatilor este aceeasi.** **In plus la Nota 1 este prevazut : „**Toate activitatile/ categoriile de lucrări sau servicii vor fi prețuite, fara excepție. In cazul in care o activîtate/categorie de lucrări sau servicii nu este prețuita (este lasala fara preț) sau este prețuita cu "zero", poate conduce la respingerea ofertei depuse." Iar la nota 5: „Ulterior semnării contractului, Antreprenorul nu va fi indeptatit sa solicite o creștere a preturilor stabilite in tabelul de mai sus invocând motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai multa munca sau a costat mai mult decât anticipat initial, iar Beneficiarul nu va fi indreptatit sa solicite o diminuare a preturilor stabilite in tabelul de mai sus invocând motive opuse celor anterior menționate." **Avand in vedere ca prezenta procedura este de proiectare si executie, proiectul , inclusiv listele de cantitati definitive vor fi intocmite ulterior depunerii ofertei, va rugam sa restrangeti activitatile, sau sa precizati in mod clar ce anume se va cota la punctul 2.2 si ce anume se va cota la punctul 2.7.**

Raspuns 145	A se vedea **Raspunsul 104** din prezenta Clarificare.
Intrebare 146	**Referitor la Anexa 1 la Formularul nr.7, la punctul 3.1.5 se solicita „***Orice alte utilitati necesare a fi realizate in cadrul contractului".* **In caietul de sarcini /Cerintele Beneficiarului la punctul 4.18.1.3 este precizat***:* Costurile cu Relocarea/ devierea/ protejarea/ mutarea utilităților identificate sau descoperite pe durata Contractului, altele decât cele specificate in Cerințele Beneficiarului si care sunt strict necesare pentru implementarea Contractului pot face obiectul utilizării Rezervelor de Implementare in condițiile reglementate de art. 5.10 din Acordul Contractual **Avand in vedere ca prezenta procedura este de proiectare si executie, proiectul, inclusiv listele de cantitati definitive vor fi intocmite ulterior depunerii ofertei, iar in acest moment oferta se face in baza cdatelor furnizate de Beneficiar, va rugam sa restrangeti activitatile, sau sa precizati in mod clar ce anume se va cota la punctul 3.1.5 .**
Raspuns 146	A se vedea **Raspunsul 11** din prezenta Clarificare.
Intrebare 147	**Referitor la Anexa 1 la Formularul nr.7, la punctul 3.3 se solicita : „**Orice alte activitati necesare amenajării terenului" **Va rugam precizati ce activitati se vor cota la acest punct sau sa renuntati la acest punct.**
Raspuns 147	A se vedea **Raspunsul 12** din prezenta Clarificare.
Intrebare 148	**Referitor la Anexa 1 la Formularul nr.7, la punctul 5.4 se solicita : „**Orice alte lucrări necesare siguranței circulației, inclusiv amenajari" **Avand in vedere ca toate lucrarile necesare sigurantei circulatiei sunt deja incluse in activitatile de la punctele 5.1; 5.2; 5.3; iar aceasta procedura este una de proiectare si executie va rugam sa restrangeti activitatile care se vor cota sau sa precizati in mod clar ce anume lucrari se vor cota la punctul 5.5.**
Raspuns 148	A se vedea **Raspunsul 14** din prezenta Clarificare.
Intrebare 149	**Referitor la Anexa 1 la Formularul nr.7, la punctul 9.3 se solicita sa cotam „**Materiale de presa**".** **Va rugam sa definiti exact care vor fi materialele de presa care vor fi cotate la acest punct .** **In plus va rugam sa corelati si explicitati prevederile documentatiei de atribuire in raport cu cerintele din documentatie.**
Raspuns 149	Cotarea materialelor de presa se va face cu respectarea art 12.18. Planul de Actiune pentru Promovarea Contractului din cerintele Beneficiarului.
Intrebare 150	**Referitor la Anexa 1 la Formularul nr.7, la punctul 6.4 se solicita sa cotam : „*Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari"* Avand in vedere ca prezenta procedura este de proiectare si executie, proiectul , inclusiv listele de cantitati definitive vor fi intocmite ulterior depunerii ofertei, iar in acest moment oferta se face in baza cdatelor furnizate de Beneficiar, va rugam sa restrangeti activitatile, sau sa precizati in mod clar ce anume se va cota la punctul 6.4 .**
Raspuns 150	A se vedea **Raspunsul 15** din prezenta Clarificare.
Clarificare 1 din OFICIU	**ACORD CONTRACTUAL** **1.** In vederea corelarii prevederilor documentatiei de atribuire cu noile modificari legislative aduse HG nr. 1/2018, Autoritate contractanta modifica prevederile **Art. 5.1 Sub-Clauza 47.1** din Acordul Contractual, dupa cum urmeaza: **CLAUZA 47 - Sume Retinute**

	47.1	Valoarea procentuala a Sumelor Retinute din fiecare Certificat de Plata pâna la atingerea limitei Sumelor Retinute	5% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din Sub-clauza 50.1 [Situatia de Lucrari]	
	47.1	Limita Sumelor Retinute	5% din Pretul Contractului la semnarea Contractului	
